


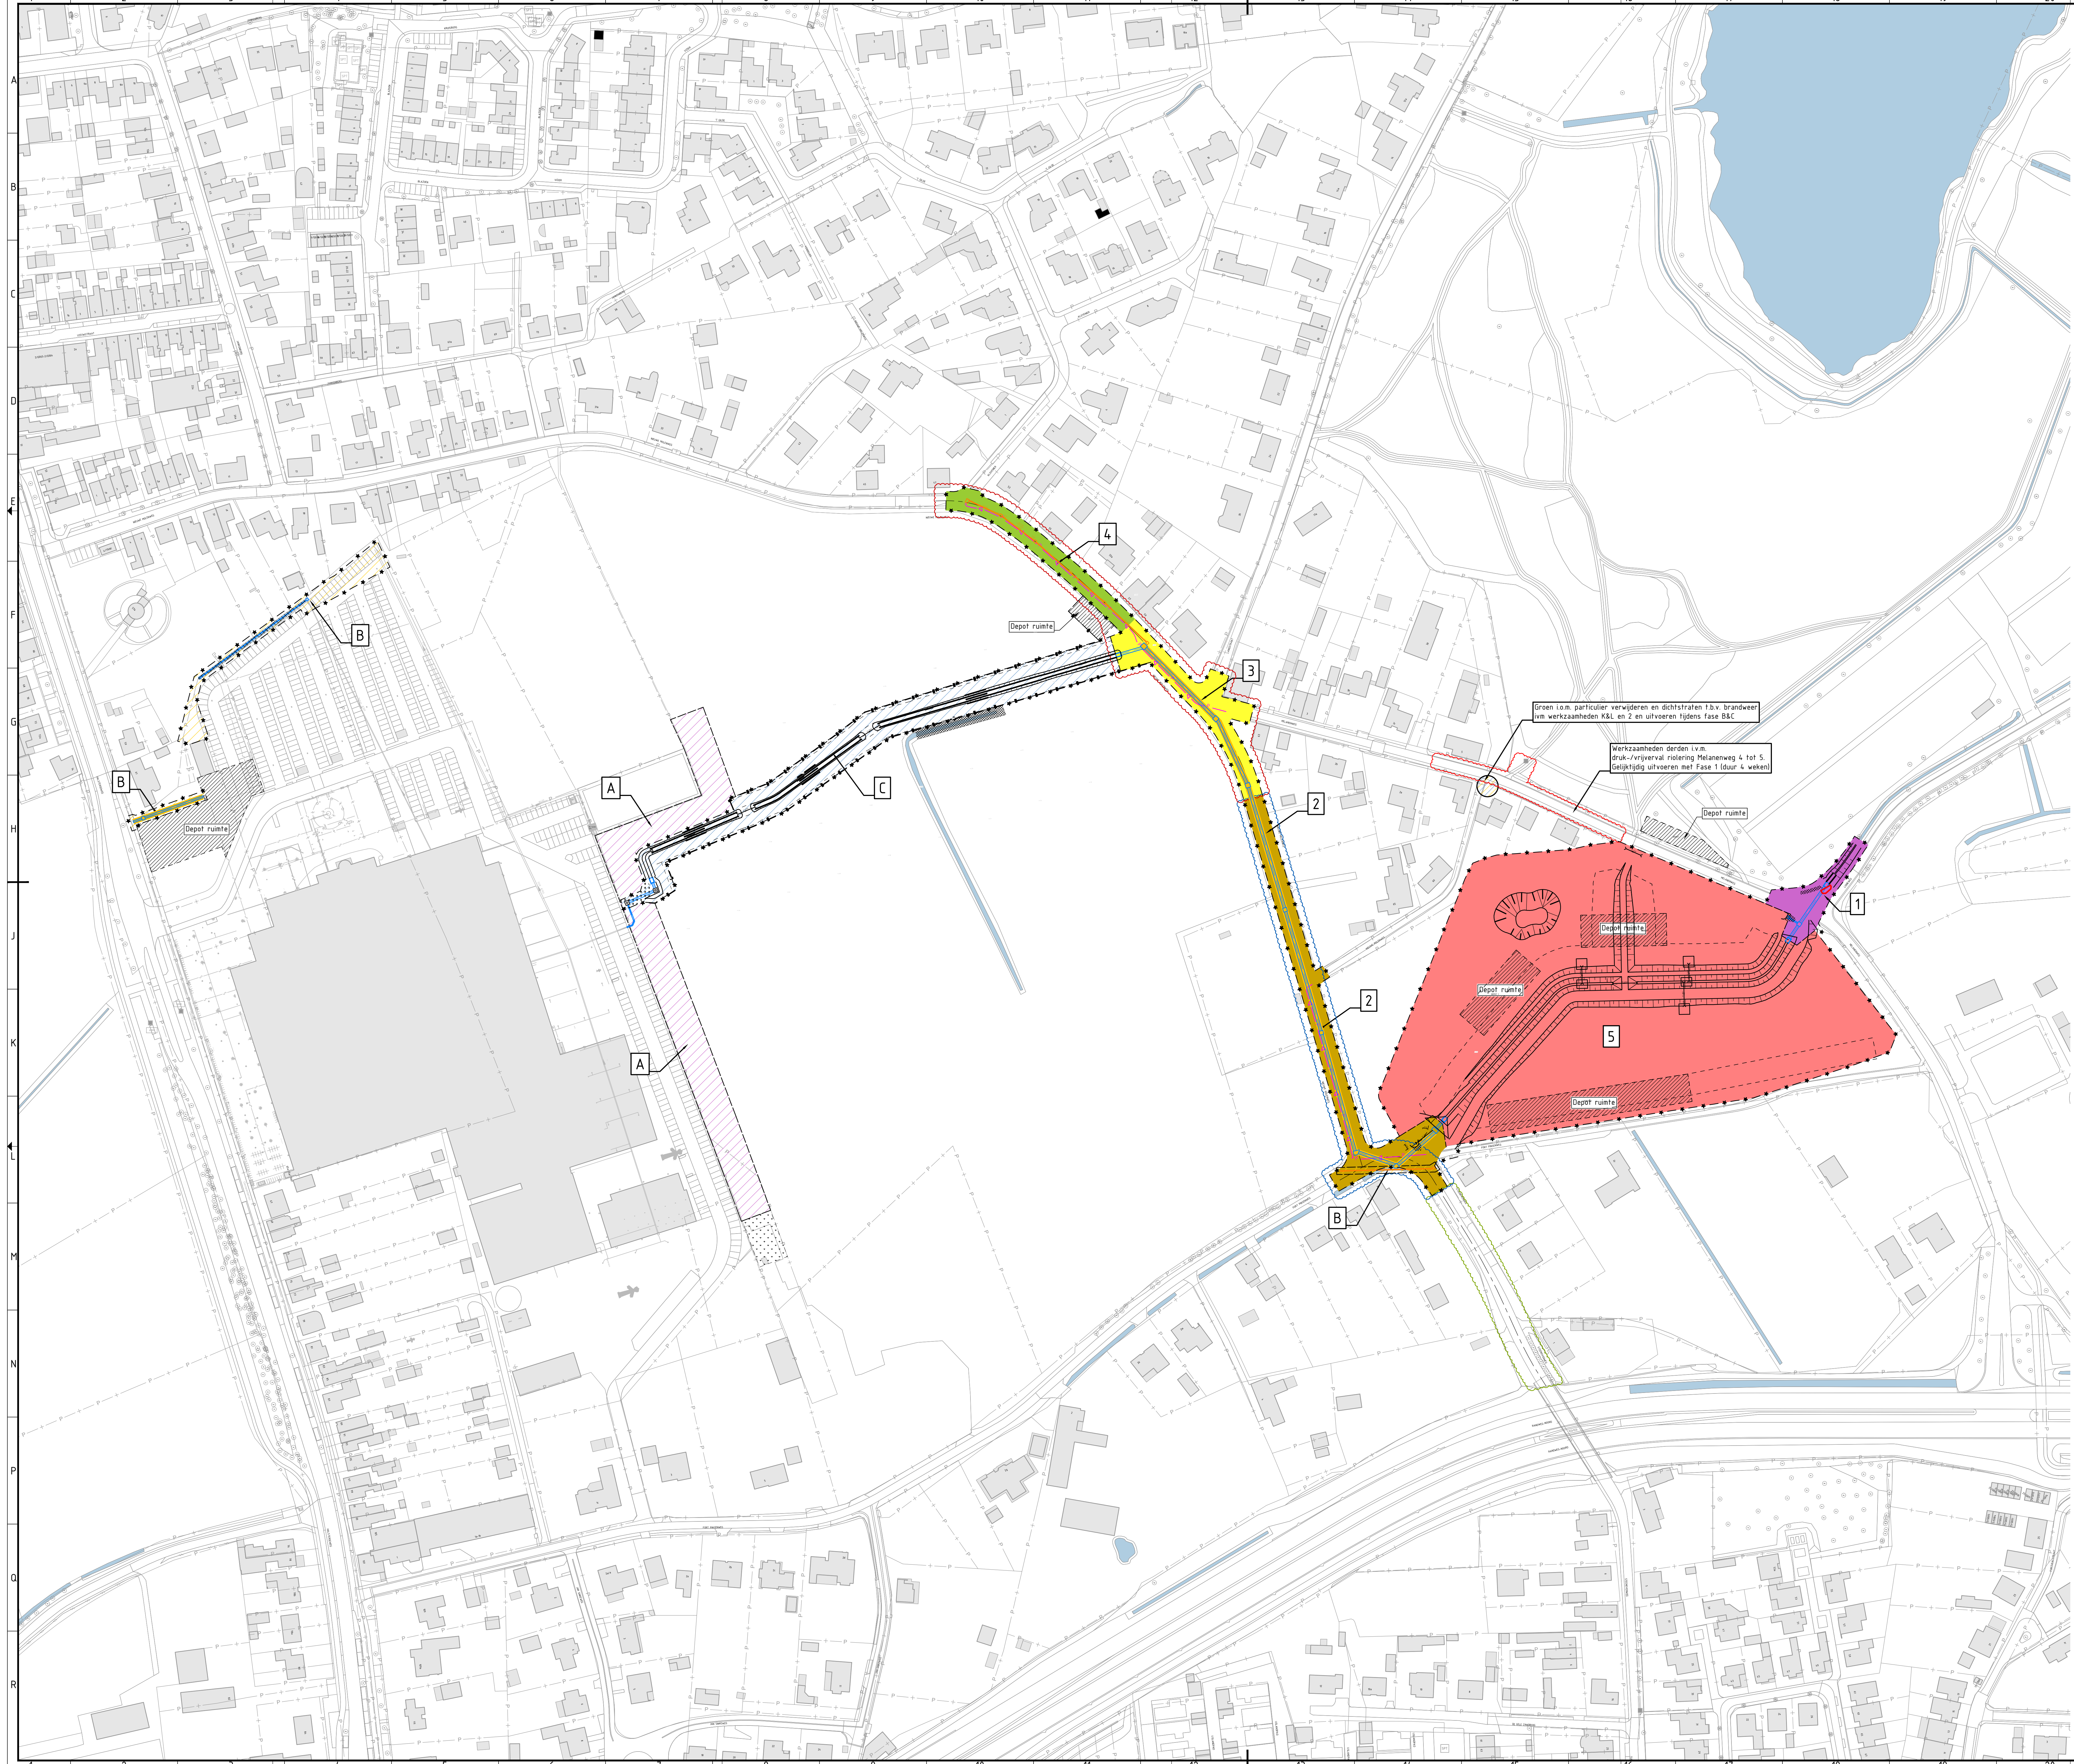

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande kadastrale grens
- Bestaande bebouwing
- Bestaand oppervlaktewater

Fasering werkzaamheden rondom Intratuin:

- A Realisatie 2025, januari-februari (door derden)
- B Realisatie 2025, vanaf 11 augustus 2025-19 september 2025 Leveranties beton OG week 34-2025
- C Realisatie 2025, vanaf 11 augustus 2025-31 oktober 2025 Leveranties beton OG week 34-2025

Fasering K&L werkzaamheden:

- 1 Fase 1: realisatie 2025, september-oktober/november
- 2 Fase 2: realisatie 2025, oktober/november-kerst 2025
- 3 Fase 3: realisatie 2026, januari-maart

Fasering riolering en waterberging:

Benodigde verkeersmaatregelen mogen niet conflicteren met de verkeersmaatregelen van de K&L werkzaamheden die dan van kracht zijn. Dit geldt voor 2, 3, 4 en 5.

- 1 Realisatie 2026, vanaf april 2026 mogelijk maar niet tegelijkertijd met K&L werkzaamheden
- 2 Realisatie 2026, april-december
- 3 Realisatie 2026, april-december
- 4 Realisatie 2026, april-december
- 5 Grondwerk voorbereidingen : 2026, februari-december
Grondwerk definitief afronden : 2026, maart-december

OPMERKINGEN:

- Boven ligging: NUT
- Ruiten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Diameter in mm, tenzij anders aangegeven
- Ligging kabels en leidingen ten opzichte van de ligging van de graven van parkeerplaatsen

7.0	Openingen NUT verwerk	NWB	JNDV	JNDV	04-07-2025
8.0	Openingen bestek verwerk	NWB	JNDV	JNDV	11-08-2025
9.0	Fasering K&L werkzaamheden (opgevoegd)	NWB	JNDV	JNDV	09-03-2025
4.0	Openingen bestek verwerk	NWB	JNDV	JNDV	24-01-2025
10	Eveneens afgevoerd	NWB	JNDV	JNDV	08-11-2024
Verwerk	overstapen	gepland	gepland	afgevoerd	afgevoerd

Gemeente Bergen op Zoom

project
Halsterseweg-Ligne
en riolering Nieuwe Molenweg
omschrijving
Faseringsplan



documentnaam	documentversie
Definitief	7.0
projectnummer / versienummer	BI1684-RHD-XX-HA-DR-C-200301

formaat A0 schaal 1:1000 blad BQ blad 1 van 1
