



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

Verkeersmaatregelen Langbroekerdijk

Informatieavond over uitvoering
woensdag 16 april 2025

Programma

- 20.00: Welkom & voorstelronde
- 20.05: Terugblik, toelichting op de maatregelen
- 20.10: Planning en uitvoeringswijze
- 20.25: Bereikbaarheid tijdens realisatie
welke omleiding is er.
- 20.35: Communicatie via de bouwapp
- 20.50: Vragen en opmerkingen
- 21.30: Einde avond

Voorstelronde

Direct betrokkenen

- Bewoners en belangstellenden

Aannemer Gebr. Van Kessel

- Frank Kistemaker *Uitvoerder*
- Martijn de Lange *Projectleider*

Medewerkers gemeente Utrechtse Heuvelrug

- Marc Petersen *Directievoerder*
- Joris Jansen *Projectleider*

Doel van deze avond


- U informeren over:
 - Welke maatregelen het zijn geworden (na 26 augustus 2024)
 - Welke hinder u tijdens de aanleg daarvan heeft
 - Hoe andere weggebruikers geïnformeerd worden
 - Hoe u aan actuele informatie kunt komen
 - Ontheffing aanwonenden voor de wegafsluiting
- Ophalen van informatie
 - bereikbaarheid wensen zoals melkwagen, veevoeder transport, vuilnis, thuiszorg enzovoort
- Beantwoorden van uw vragen

Wat gaan we maken

Verkeersmaatregelen 2024: Langbroekerdijk te Driebergen-Rijsenburg

inclusief aanpassingen (in blauw) naar aanleiding van informatieavond 26 augustus 2024

inclusief aanpassingen (in rood) naar aanleiding van commentaar belanghebbenden november 2024

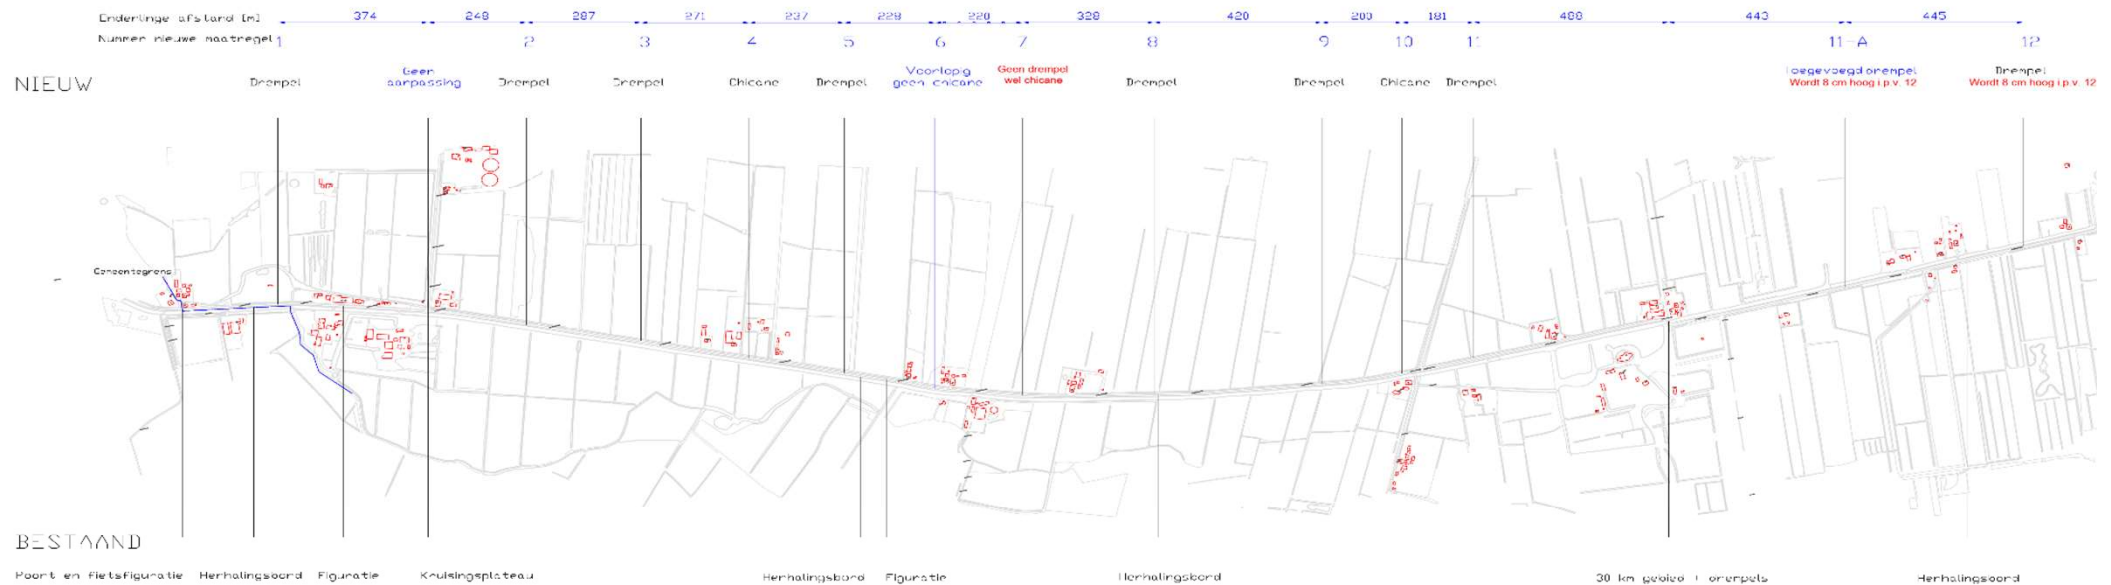

Wat gaan we maken


9 verkeersdrempels

- Twee van 8 cm hoog en 60 km/u
- Zeven van 12 cm hoog en 60 km/u



Weg wordt opgebroken, er komt een nieuwe fundering.

Doorsnede B-B

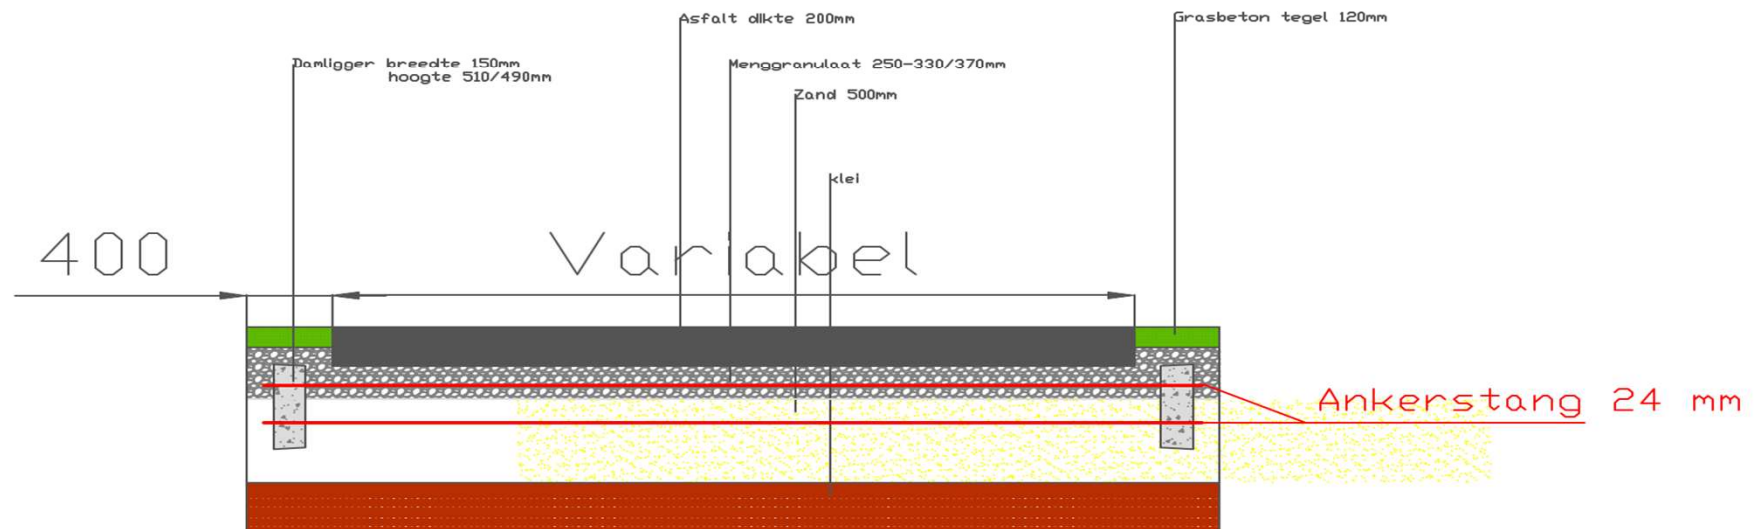

Wat gaan we maken

3 chicanes

= twee obstakels waardoor je een slinger moet maken of moet wachten bij een tegenligger.



Planning en werkwijze

- *Beginnen aan de kant van Odiijk*
- *Waar gewerkt wordt kunnen er overdag geen voertuigen door.*

Per drempel

- 1^e dag: de weg opbreken, kabels en leidingen opzoeken. Fundering/zand verwijderen. Sleuf voor damliggers graven. Aanbrengen rijplaten voor (nacht)verkeer van **aanwonenden en bestemmingsverkeer.**
- 2^e dag: rijplaten verwijderen, damliggers + ankers aanbrengen en nieuwe fundering aanbrengen.
- Opvolgende dagen tot asfalt wordt aangebracht rijdt het bestemmingsverkeer over een puinbaan. U krijgt als aanwonenden ontheffingskaart(en).
- Maximum snelheid: minder dan 10 km/u.

Planning


				m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v
1	Project: Langebroekstraat	26 dagen?	maa 19-5-25	Project: Langebroekstraat																		
2	Vorbereiding	1 dag	maa 19-5-25	Vorbereiding																		
3	Inrichten werkterrein	1 dag	maa 19-5-25	19-5  Inrichten werkterrein																		
4	Asfaltonderzoek incl. uitslagen gereed	0 dagen	maa 19-5-25	19-5  Asfaltonderzoek incl. uitslagen gereed																		
5	Werkzaamheden	26 dagen?	maa 19-5-25	Werkzaamheden																		
6	Zagen slooplijn asfalt 9 locaties	0,5 dagen	maa 19-5-25	19-5  Zagen slooplijn asfalt 9 locaties																		
7	Frezen schoon 9 locaties	1 dag	maa 19-5-25	19-5  Frezen schoon 9 locaties																		
8	Plaatsen afzetting berm (schildjes) 9 locaties	1 dag	maa 19-5-25	19-5  Plaatsen afzetting berm (schildjes) 9 locaties																		
9	Transport + uitventen liggers	1 dag?	maa 19-5-25	19-5  Transport + uitventen liggers																		
10	Leverantie en uitventen graskeien	1 dag?	din 17-6-25																			
11	Drempel 1	24 dagen?	din 20-5-25	Drempel 1																		
12	Uitbreken asfaltverharding	0,25 dagen	din 20-5-25	20-5  Uitbreken asfaltverharding																		
13	Verwijderen bestaande fundering	0,25 dagen	din 20-5-25	20-5  Verwijderen bestaande fundering																		
14	Graven proefsleuven + sloof t.b.v. liggers	0,5 dagen	din 20-5-25	20-5  Graven proefsleuven + sloof t.b.v. liggers																		
15	Toegankelijk maken via rijplaten	0,1 dagen	din 20-5-25	20-5  Toegankelijk maken via rijplaten																		
16	Plaatsen en koppelen liggers	0,5 dagen	woe 21-5-25	21-5  Plaatsen en koppelen liggers																		
17	Aanbrengen puinfundering	0,5 dagen	woe 21-5-25	21-5  Aanbrengen puinfundering																		
18	Aanbrengen graskeien en aanwerken bermen	4 dagen	woe 18-6-25																			
19	Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt	1 dag	din 24-6-25																			
20	Aanbrengen deklaag	1 dag?	woe 25-6-25																			
21	Drempel 2	22 dagen?	don 22-5-25	Drempel 2																		

Bereikbaarheid

- Daar waar gewerkt wordt is de weg afgesloten voor voertuigen en fietsers. Is op één locatie, die op de dag kan wijzigen!
- Kijk op de bouwapp waar er gewerkt wordt.
- Informeer uw bezoek.
- Passeren werklocatie wandelaars is mogelijk maar liever niet.
- Buiten werktijd van ca. 18.00 – 06.30 kan bestemmingsverkeer, ook vrachtverkeer erdoor Diepladers niet. Over rijplaten en/of puinbaan. Ontheffingspas!
- Hulpdiensten zijn geïnformeerd (hebben de bouwapp)

Omleidingsroutes

Wordt nog aangepast. Zie website + bouwapp.

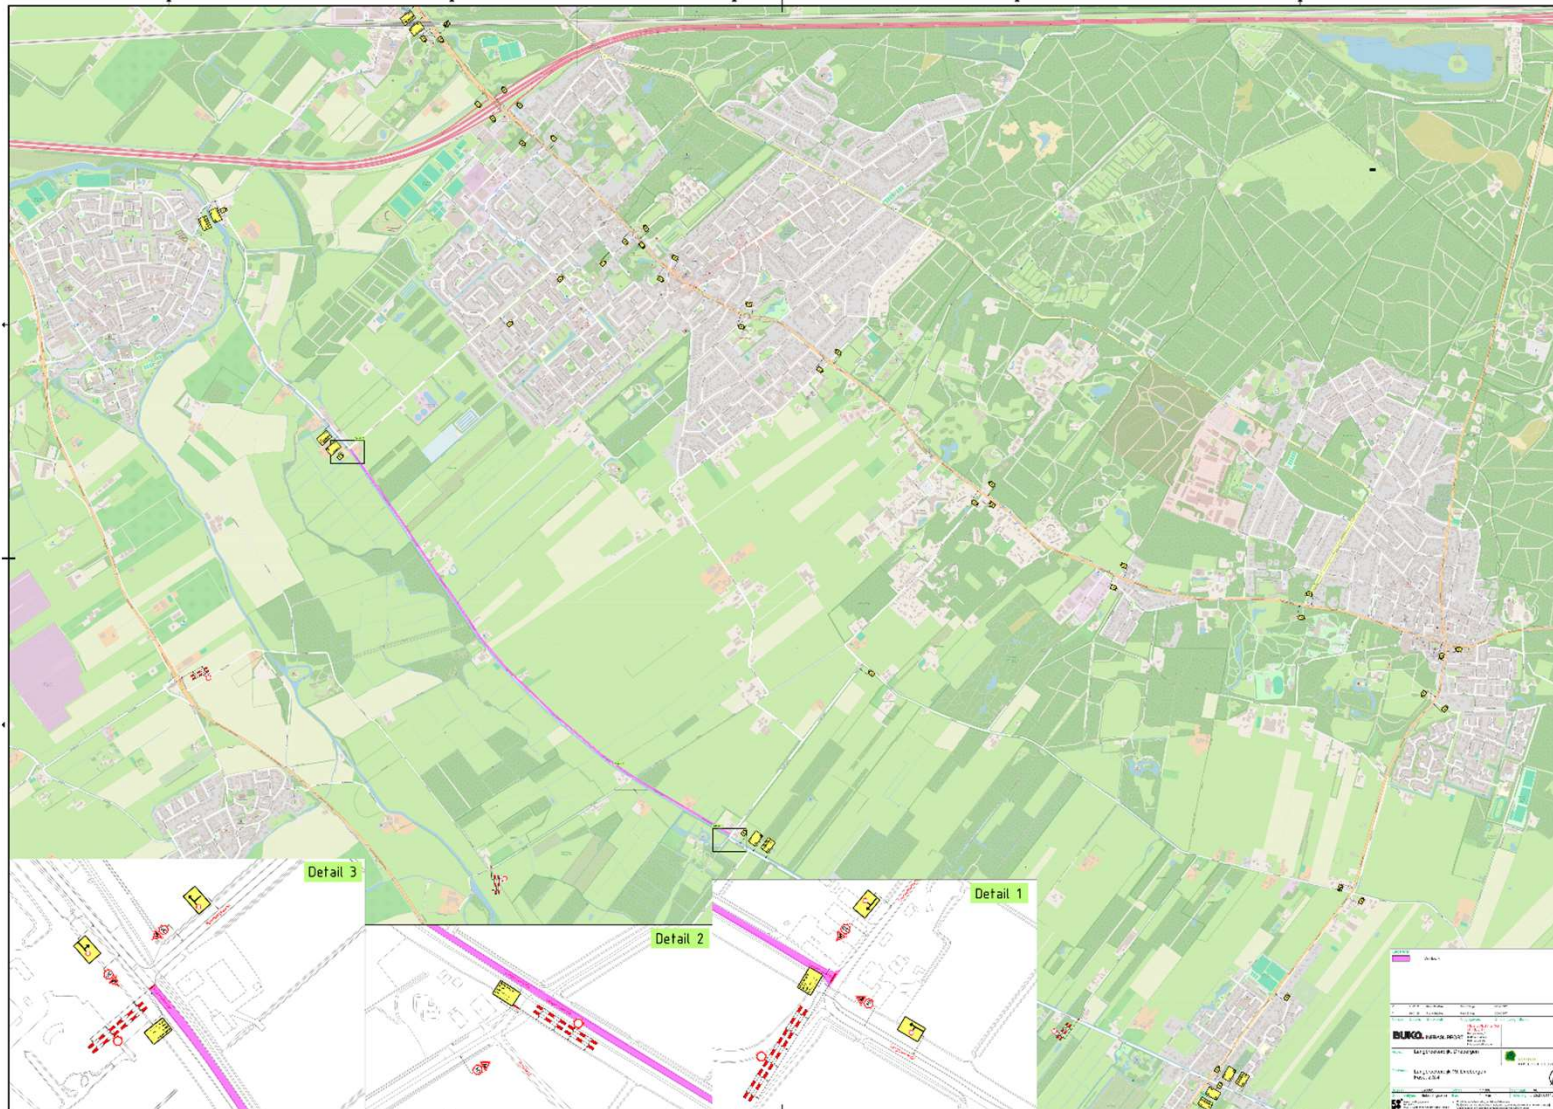

Communicatie

Van aannemer → bewoners

- via de bouwapp !

Van bewoners → aannemer alleen tijdens werkuren

- telefoon of e-mail (bekendmaking wordt door aannemer verzorgt)

Van bewoners → gemeente

- marc.petersen@heuvelrug.nl
- joris.jansen@heuvelrug.nl

Meer algemene informatie:

www.heuvelrug.nl/verkeerskundigemaatregelen2024

Communicatie – de bouwapp

- Scan de QR-code
- Download de bouwapp
- Zoeken op Langbroekerdijk
- Meld je aan.

U kunt zich op ieder moment afmelden. (= Ontvolgen)



Vragen/Suggesties/Opmerkingen?

Tot slot

Hartelijk bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid!



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG
