



Datum
3 november 2022

Contactpersoon
M. van den Berg

Registratienummer
22.0932410/ 14831-MKD-1895

Telefoonnummer
06-50226257

Onderwerp
Stand van zaken bouw Gemaal
Monnickendam

Geachte heer, mevrouw,

Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort (CGM) bouwt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gemaal Monnickendam. Na de geslaagde Dag van de Bouw op 18 juni is het weer tijd om meer informatie over het project te verstrekken. Met deze brief willen wij u als omwonende informeren wat er de afgelopen periode is gebouwd en de planning presenteren tot en met voorjaar van 2023.

Dag van de Bouw en werkzaamheden

Tijdens de Dag van de Bouw konden de bezoekers op 8 meter diepte (laagste punt) over de betonen vloer van het gemaal lopen (zie foto 1 tot en met 3). Er was een route die startte aan de instroomzijde (Purmer Ee) via de plek waar de pompen komen, waarvan er al één geplaatst was, en verder onder de N247 door naar de aparte bouwkuip van de uitstroomzijde (Markergat). In juli zijn alle drie de pompen geplaatst en is de bekisting en de stalen wapening van de muren van het gemaal aan de instroomzijde gebouwd. Verder is er een start gemaakt met de wanden in het gedeelte dat onder de weg ligt en aan de uitstroomzijde (zie foto 4 t/m 6)

Na de zomervakantie, ongeveer eind augustus, is het beton van de eerste wanden (hoogte 4,20 meter) aan de instroomzijde en de eerste wanden onder het deel van de weg (lengte 33,50 meter) gestort en is een deel van de vispassage (diameter 1,00 meter) aangelegd (buis rechtsonder foto 8). En er is verder gewerkt aan de hoge wanden (hoogte 5,40 meter) van de uitstroomzijde (zie foto 7 en 9).

In september zijn ook de wanden rondom de pompen aan de instroomzijde gebouwd. Ook worden de houten trompetstukken (overgang van rond bij pomp naar vierkant bij het wegdeel) geplaatst. Hiermee is de verbinding gemaakt van de pompen naar de maalgangen onder de weg. Ondertussen zijn de bekistingen gebruikt voor het storten van beton van de wanden aan de uitstroomzijde alweer weggehaald. En wordt de verbinding naar het wegdeel aangepakt (zie foto 10 t/m 13).



Datum
3 november 2022

Begin oktober zijn diverse wanden aan de instroomzijde klaar. De verbinding van de buis naar de pomp heeft een betonnen vloer en er is gestart met de wanden en de stalen wapening van de dakdelen waar de buis en pomp (trompetstuk) samenkomen. Onder het wegdeel zijn bijna alle wanden klaar en wordt de vispassage verder aan de instroomzijde verlengd. Ook de tussenwanden aan de uitstroomzijde staan er nu (zie foto 14 t/m 16).

Eind oktober is het betonnen dek die over de buizen (maalgangen) van het gemaal komt te liggen gestort. Dit dek is een extra versteviging over de buizen van het gemaal onder de provinciale weg N247. De vispassage is verlengd, voorzien van betonhulling en er is alweer zand overheen aangebracht (zie foto 17 t/m 19).

Vervolgplanning tot en met medio voorjaar 2023

Tot de Kerst worden de bovenkanten van de dekken aan de uitstroom en -instroomzijde verder aangelegd. In januari 2023 starten we met de bouw van het bedieningsgebouw en dan verschijnt het gemaal ineens boven de grond uit. De bouw van het bedieningsgebouw duurt tot ongeveer maart 2023. In deze periode worden ook de schuiven en kleppen voor de bediening van het gemaal aangebracht.

Weekendafsluiting N247 voor verwijderen brugdelen

Voor de doorstroming van het verkeer op de N247 tijdens de bouw van het gemaal hebben we bij de start van het project brugdelen geplaatst. Om de brugdelen weer weg te halen en de weg te asfalteren is er in maart 2023 een weekendafsluiting nodig om de N247 in zijn oude staat te herstellen. Na het asfalteren van de weg pakken we daarna zo snel mogelijk de beide fietspaden aan, zodat de fietsomleiding niet meer nodig is. Over de exacte data en tijdstippen komen we in één van de volgende brieven terug.

Bewonersbijeenkomst medio december

We spelen met de gedachte om een mogelijkheid te creëren dat u als omwonende tijdens de ruwbouwfase nogmaals door het project kunt heenlopen. We kijken of vrijdagmiddag 16 december en zaterdag 17 december mogelijke data zijn voor een laatste rondleiding in de bouwkuip. Meer informatie hierover volgt deze maand.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op de website: www.hhnk.nl/gemaal-monnickendam. Heeft u vragen over, neem dan contact met mij op via het onderstaande telefoonnummer of emailadres.

Met vriendelijke groet,

Martin van den Berg
Combinatie Gemaal Monnickendam
mvdberg@avecodebondt.nl
T: 06 5022 6257

Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend



Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".



Datum
3 november 2022



Foto 1: jun '22 vloer instroomzijde



Foto 2: jun '22 vloer weggedeelte

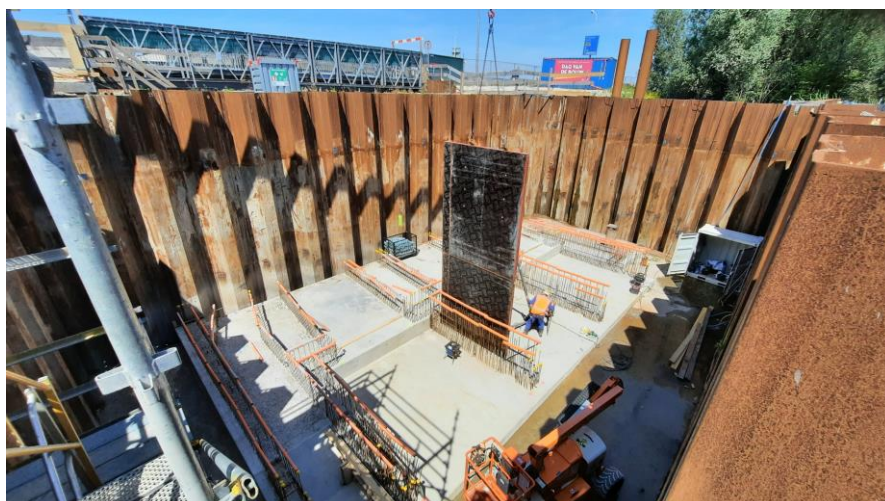


Foto 3: jun '22 vloer uitstroomzijde



Datum
3 november 2022

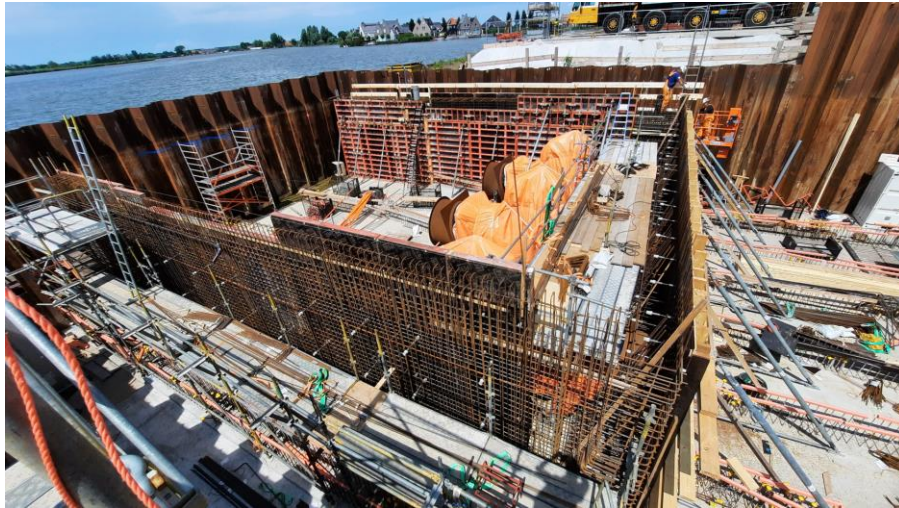


Foto 4: jul '22 wapening wanden instroomzijde

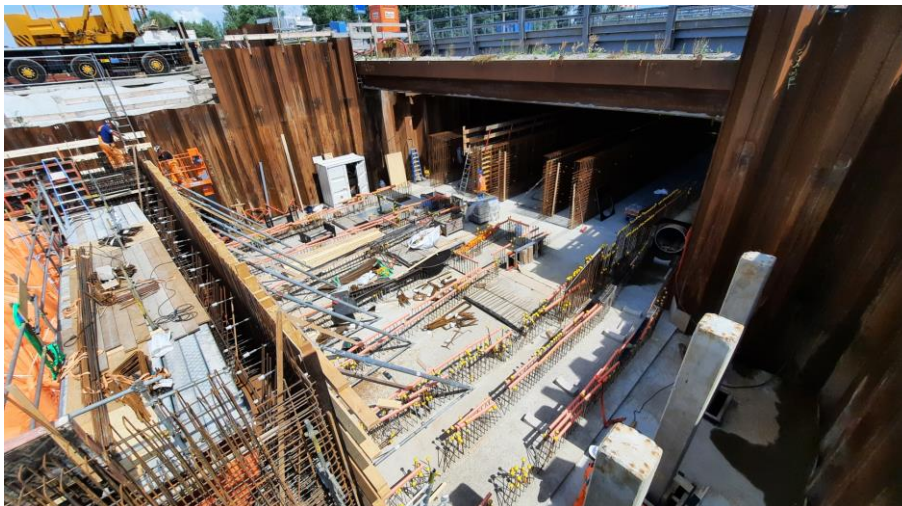


Foto 5: jul '22 wapening wanden weggedeelte



Foto 6: jul '22 wapening wanden uitstroomzijde

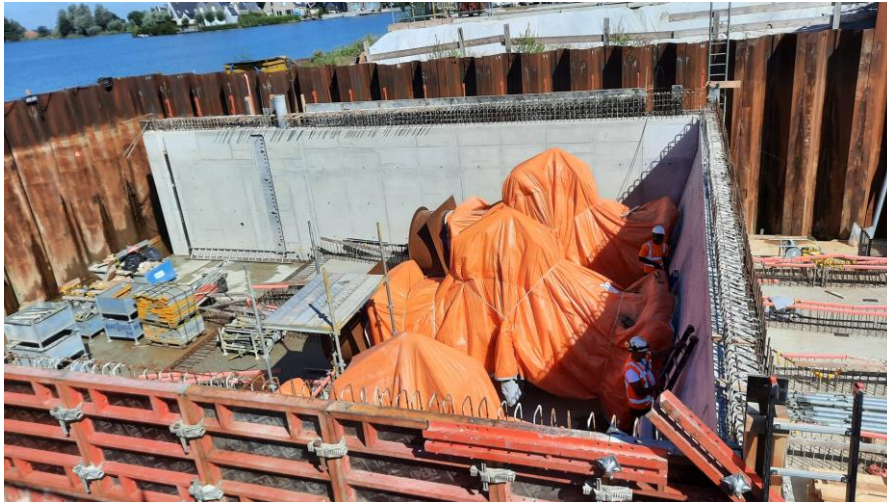


Foto 7: aug '22 gestorte wanden instroom



Foto 8: aug '22 eerste gestorte wanden wegdeel



Foto 9: aug '22 opbouw wapening wanden uitstroom



Datum
3 november 2022



Foto 10: sep '22 wanden rondom pompen

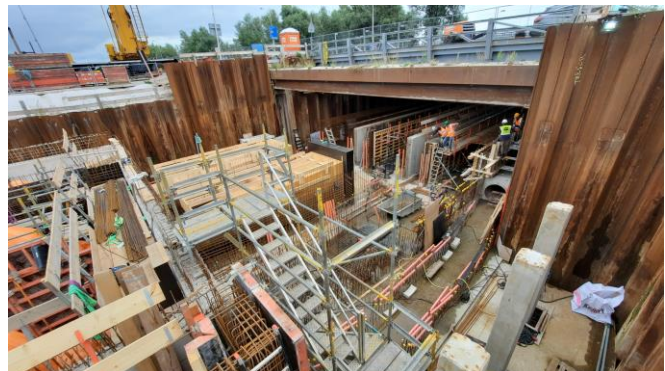


Foto 11 en 12: sep '22 houten trompetstukken worden ingehesen en geplaatst



Foto 13: sep '22 wanden uitstroom gestort



Datum
3 november 2022



Foto 14: begin okt '22 wanden instroomzijde gestort



Foto 15: begin okt '22 wapening rondom trompetstukken



Foto 16: begin okt '22 tussenwanden naar wegdeel geplaatst



Datum
3 november 2022



Foto 17: eind okt '22 kleine trompetstukken bij de instroom zijn geplaatst

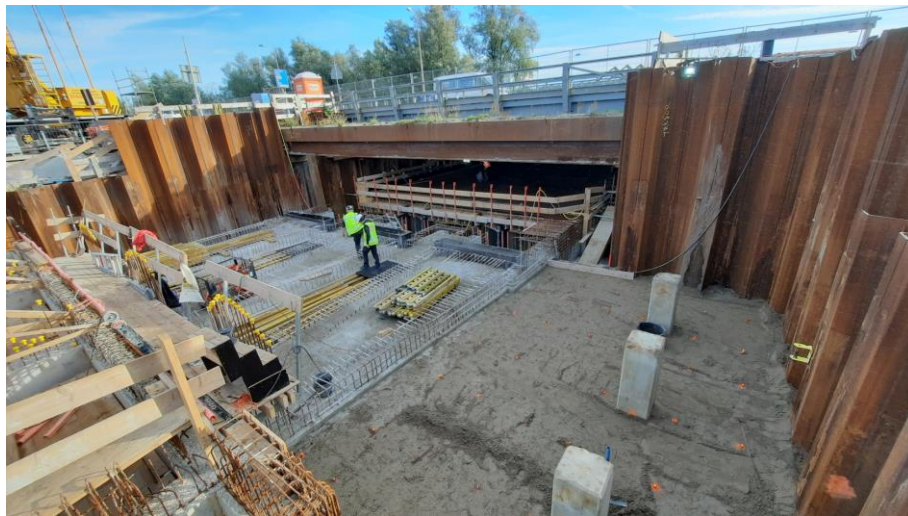


Foto 18: eind okt '22 trompetstukken tussen pomp en maalgang zijn omhuld met beton en ook is gestart met grondwerk bovenop restant vispassage.



Foto 19: eind okt '22 wapening vloerdelen naar wegdeel is aangebracht
