



**ProRail**



**Nieuw viaduct Heumensebaan**

# Agenda

- Terugblik bijeenkomst 21-8-2025
- Periode tussen 21-8-2025 en 10-3-2026
- Toelichting definitief wegontwerp
- Uitvoeringsplanning
- Omleidingsroutes
- Communicatie
- Overige werkzaamheden gemeente Mook & Middelaar
- Vragen?

# Terugblik bijeenkomst 21-8-2025

- Toelichting definitief ontwerp
  - Dimensies
  - Materiaalkeuzes
- Schetsontwerp verkeerssituatie
- Ontwerpproces



Nieuw viaduct Heumensebaan

# Periode tussen 21-8-2025 en 10-3-2026

- Onderaannemer gecontracteerd: Den Ouden
- Definitief ontwerp van brug nader uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp
- Wegontwerp uitgewerkt van schets naar uitvoeringsontwerp
- Uitvoeringsplanning opgesteld
- Omleidingsroutes vastgesteld en uitgewerkt
- Start productie van bruggen in fabriek...



**ProRail**



Dek van de fietsbrug

*de*Maaslijn



**ProRail**



Vooranzicht fietsbrug

*de*Maaslijn<sup>o</sup>



Zijaanzicht fietsbrug

**ProRail**



*deMaaslijn*<sup>o</sup>



**ProRail**




Dek van de autobrug



# Toelichting definitief wegontwerp


- Aanpassing wegdek van kruispunt Lindenlaan tot kruispunt Jachtslot
- Verkeersstromen zo veel als mogelijk gescheiden
  - Extra benadrukken middels gebruik van gekleurde verharding (zwart & rood)
- Verplaatsing van grens bebouwde kom
  - Eerder snelheid naar 30km/h
- Dubbel fietspad doorgetrokken tot voorbij t-splitsingen met Jachtslot
- Input vanuit bewonerssessie met directe omwonenden
  - Oversteek naar bos aan oostzijde
  - Extra “Verboden te fietsen” bord op Lindenlaan

# Definitief wegontwerp

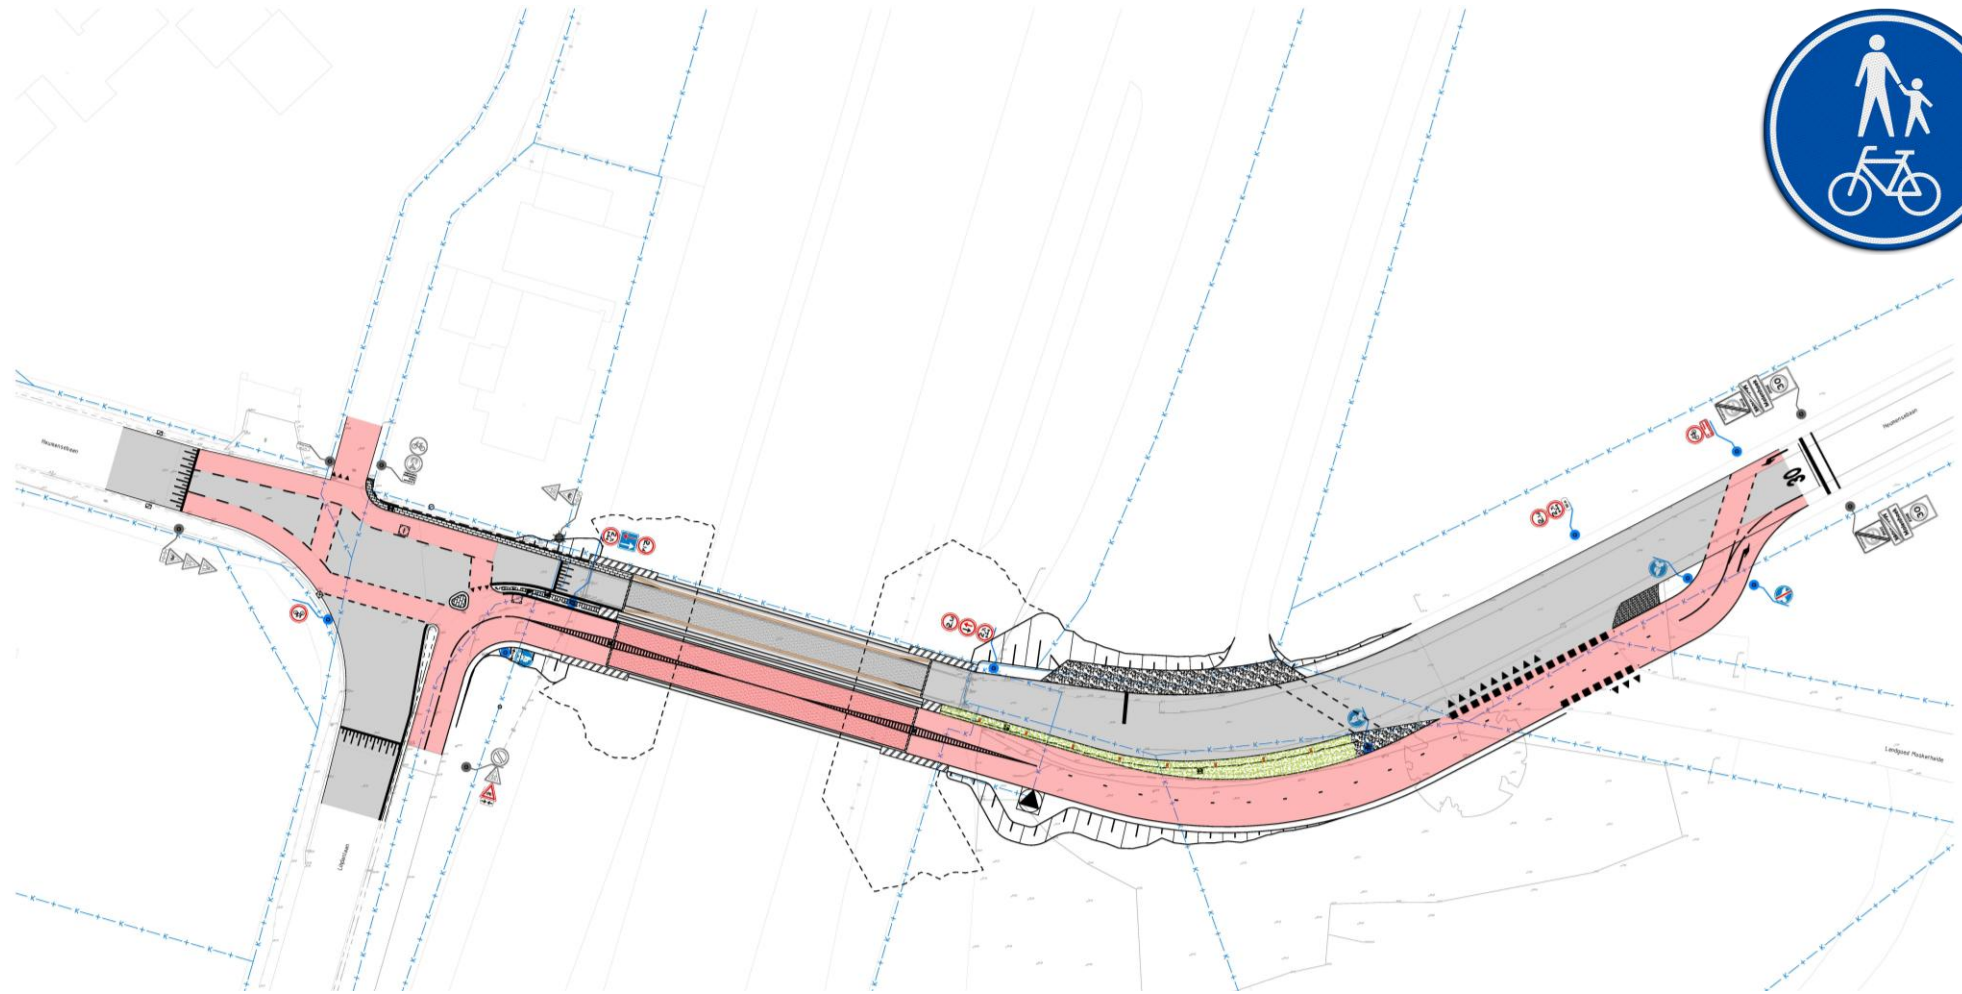


Nieuwe situatie

# Definitief wegontwerp

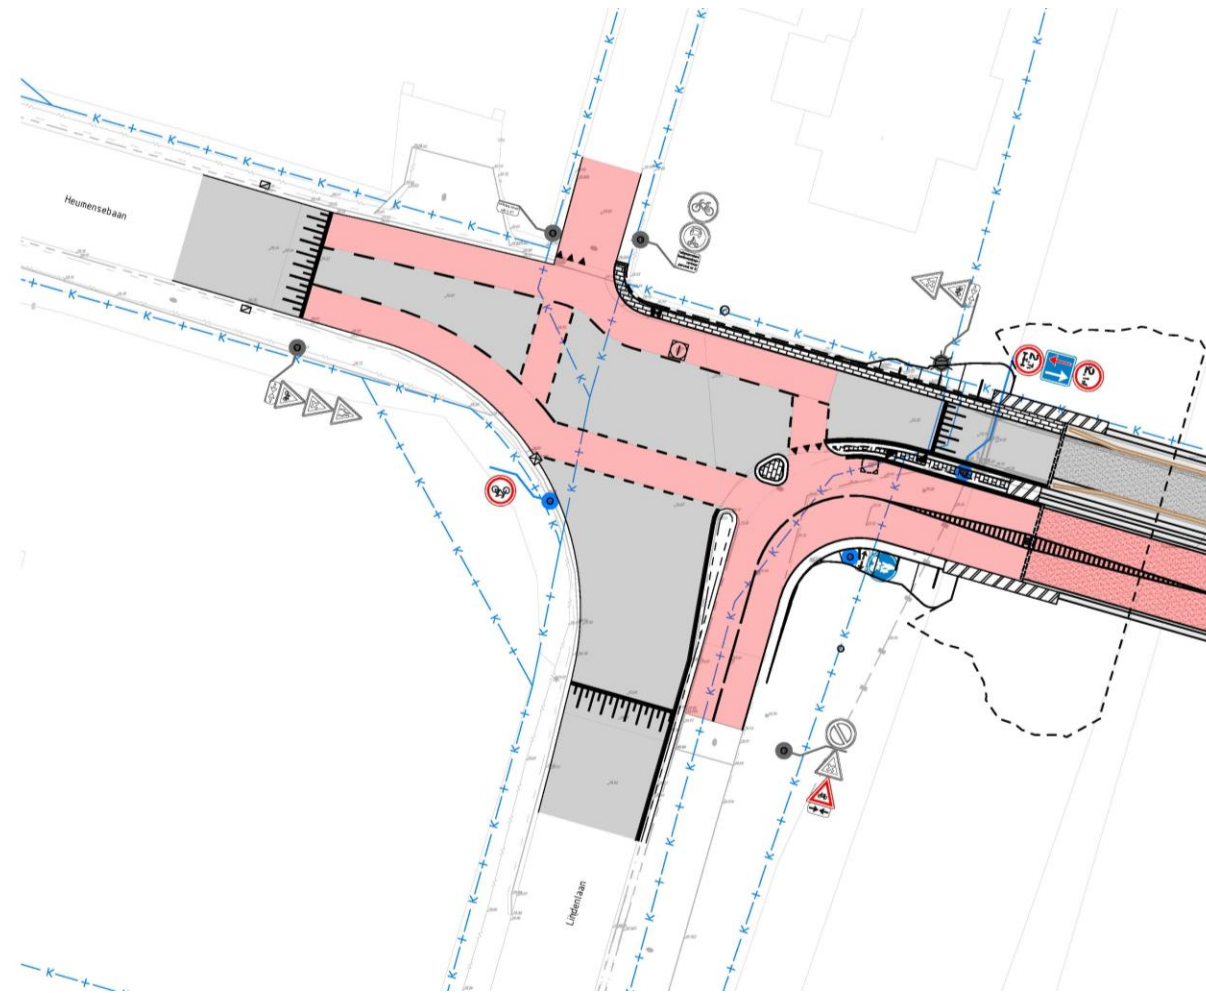

Nieuwe situatie westzijde

# Definitief wegontwerp

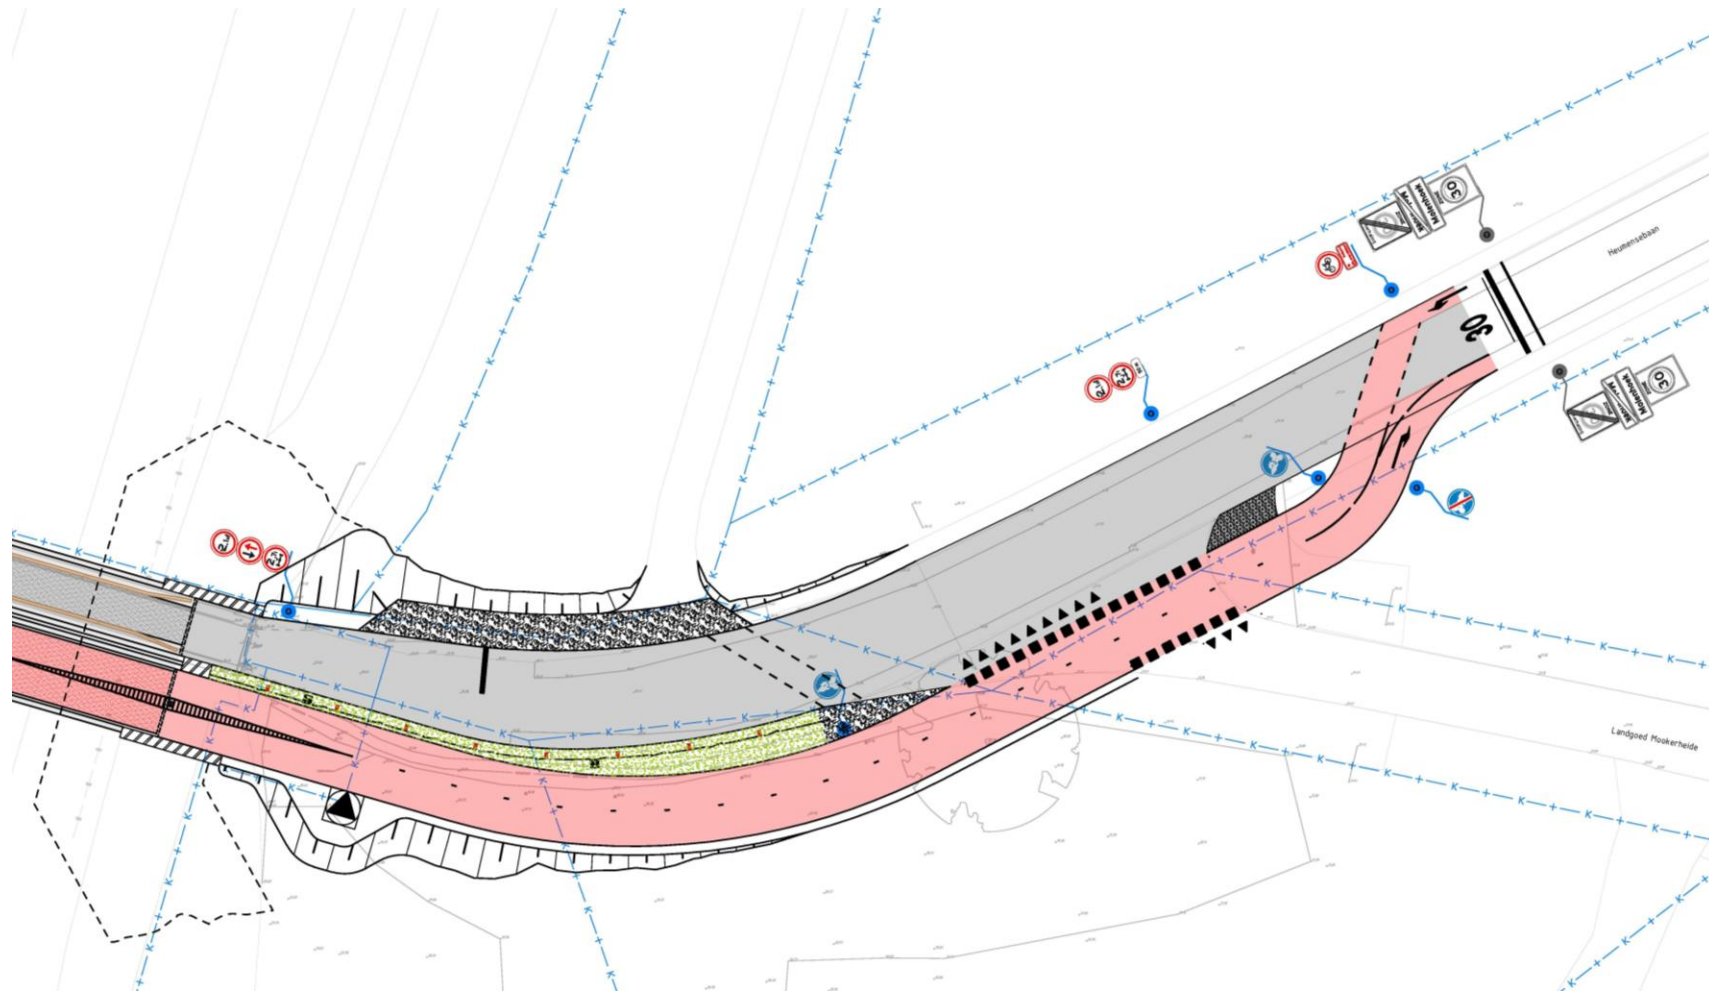

Nieuwe situatie oostzijde

# Uitvoeringsplanning

- **Zaterdag 21 maart t/m zondag 22 maart**
  - Weekend buitendienststelling
  - Voorbereidende werkzaamheden (indien nodig)
  - Opschonen werkterrein
  - Verleggen van kabels & leidingen

# Uitvoeringsplanning


- **Medio april t/m donderdag 30 april**
  - Dagwerk
  - Inrichten werkterrein
- **Donderdag 30 april 22:00**
  - Afsluiting Heumensebaan
- **Vrijdag 1 mei**
  - Voorbereidende werkzaamheden voor buitendienststelling
  - Opbreken asfalt en uitvoeren bodemonderzoek

# Uitvoeringsplanning

- **Zaterdag 2 mei t/m zondag 10 mei**
  - 9-daagse buitendienststelling (dag en nacht)
  - Slopen bestaande brug
  - Grondwerk rondom de nieuwe landhoofden
  - Aanbrengen nieuwe keerwanden onderaan beide taluds
  - Realiseren betonnen werkvloeren voor nieuwe landhoofden

# Uitvoeringsplanning


- **Maandag 11 mei t/m vrijdag 12 juni**
  - Dagwerk
  - Realisatie landhoofden, betonwerkzaamheden
  - Aanvullen grond achter landhoofden
- **Zaterdag 13 juni t/m zondag 14 juni**
  - Weekend buitendienststelling (dag en nacht)
  - Aanbrengen groutankers

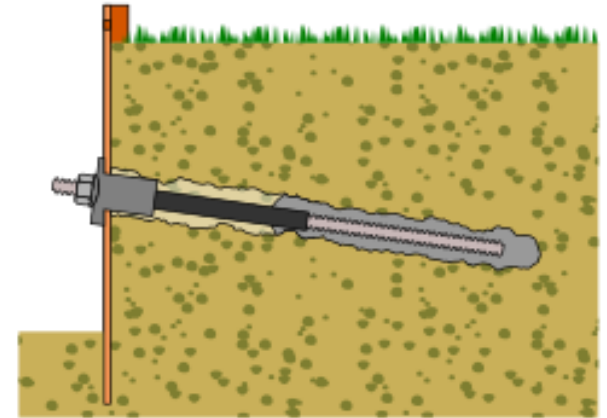

Schematische weergave van een groutanker

# Uitvoeringsplanning

- **Maandag 15 juni t/m donderdag 25 juni**
  - Dagwerk
  - Aanbrengen metselwerk vleugelwanden
  - Aanbrengen metselwerk tot onderzijde brug
  - Plaatsen prefab elementen
  - Oplegblokken plaatsen
- **Vrijdag 26 juni**
  - Opbouwen telekraan

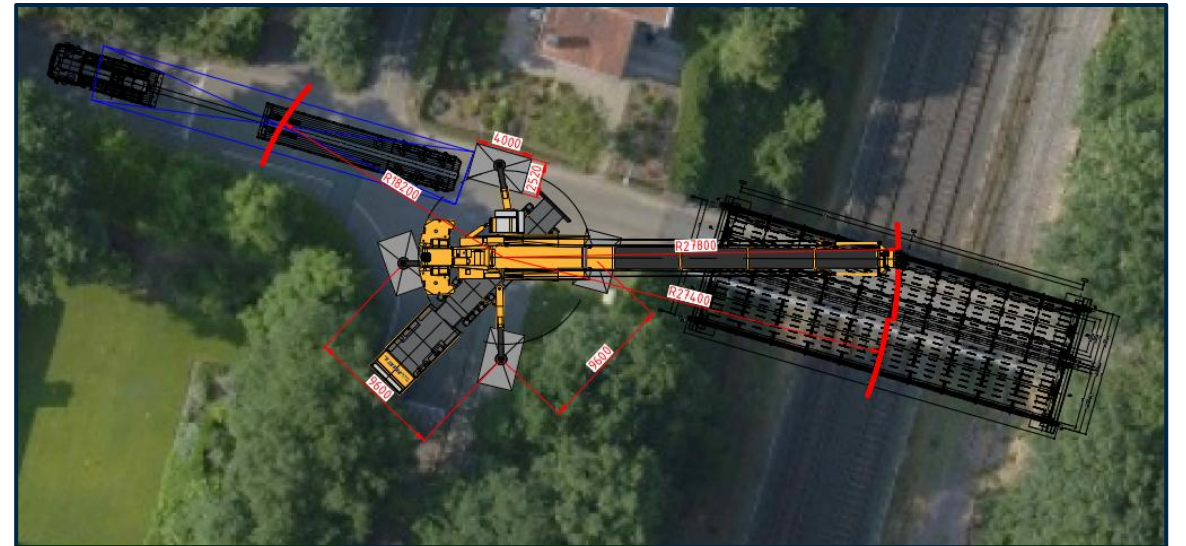

Concept hijsplan

# Uitvoeringsplanning

- **Zaterdag 27 juni t/m zondag 28 juni**
  - Weekend buitendienststelling (dag en nacht)
  - Inhijsen nieuwe bruggen
- **Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli**
  - Dagwerk
  - Aanbrengen resterend metselwerk
  - Plaatsen stootplaten
  - Realiseren omliggende infrastructuur

# Uitvoeringsplanning

- **Zaterdag 4 juli t/m zondag 12 juli**
  - 9-daagse buitendienststelling (dag en nacht)
  - Reserve moment voor inhijzen nieuwe bruggen
  - Realiseren omliggende infrastructuur
- **Maandag 13 juli t/m donderdag 16 juli**
  - Dagwerk
  - Realiseren omliggende infrastructuur
  - Opruimen werkterrein

# Uitvoeringsplanning

- **Vrijdag 17 juli**
  - Openstelling nieuwe brug Heumensebaan inclusief omliggende infrastructuur
- **Zaterdag 18 juli t/m vrijdag 24 juli**
  - Vierdaagsefeesten
  - 4Daagse Wandelmarsen



# Communicatie

- Geen fysiek uitkijkpunt i.v.m. zeer beperkte ruimte
- Livestream van werkzaamheden d.m.v. webcam op bouwplaats
- Informatiekeet tijdens sloop en inhijzen
  - Zaterdag 2 mei t/m zondag 10 mei 09:00-16:00
  - Zaterdag 27 juni t/m zondag 28 juni 09:00-16:00
- Informatie tijdens/over uitvoering:
  - BouwApp: <https://debouw.app/projects/opwaardering-maaslijn>
  - Telefoon: 06 - 27313281
  - Gemeentelijke website

# Omleidingsroutes

- Afzetting kruising Lindenlaan – Heumensebaan
  - Woningen aan Lindenlaan (nr 85 t/m 91) en Heumensebaan 3 blijven te allen tijde bereikbaar
- Geen officiële omleidingsroute over Groesbeekseweg
- Omleiding richting Nijmegen – Gennep – A73 om kernen heen
  - Milsbeek – Bredeweg – Groesbeek – Nijmegen
  - A73 – Malden – Groesbeek
  - Groesbeek – Rijlaan – Bisseltsebaan – Malden – A73 (pas bebording vanaf kruising Bisseltsebaan)

# Overige werkzaamheden 1<sup>e</sup> half jaar 2026

## Elektrificeren spoor

- **27 t/m 29 juni:** afmaken draagconstructies van Heumensebaan tot Boxmeer
- **4 t/m 13 juli:** afrondende werkzaamheden elektrificatie brug over de Maas tussen Heumen en Cuijk
- **27 juli t/m 24 augustus:** afrondende werkzaamheden elektrificatie van station Nijmegen Heyendaal tot Cuijk

# Overige werkzaamheden 1<sup>e</sup> half jaar 2026

## Spoorwerkzaamheden

- **20 maart t/m 23 maart:** lossen materiaal en wegkruisingen ingraven bij Bovensteweg → overweg afgesloten van zaterdag 21 maart 07.00 uur tot zondag 22 maart 16.00 uur. Al het verkeer wordt omgeleid via de N271.
- **2 mei t/m 11 mei:** vervangen wissel door hogesnelheidswissel en vernieuwen overweg Bovensteweg

# Overige werkzaamheden 1<sup>e</sup> half jaar 2026

## Bouw onderstation

- Ruwbouw staat
- bezig met afwerking buitenkant
- Aansluitingen
- Inrichting binnenkant
- Plaatsen en aansluiten componenten
- Testen en inbedrijfstelling – eind juli 2026



# Vragen?

provincie limburg



**Provincie Noord-Brabant**

≡ provincie  
Gelderland

**ProRail**



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

