

**Van:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@brink.nl>  
**Verzonden:** woensdag 26 februari 2025 10:28  
**Aan:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>  
**Cc:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>  
**Onderwerp:** RE: Graag planning BOPA toesturen  
**Bijlage(n):** 250224 =CONCEPT= planning Hengelo.pdf, 250224 =CONCEPT= planning Hengelo.xlsx

Hallo [REDACTED],

Het bestand dat ik je gestuurd heb is een Microsoft Powerproject (planningsprogramma) bestad. Aangehecht de PDF versie en het van MP geconverteerde Excel bestand.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Als je nog vragen hebt, verzoek ik je om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior projectmanager

T +31 10 237 00 00

M +31 6 [REDACTED]

brink.nl



---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>  
**Verzonden:** woensdag 26 februari 2025 10:48  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@brink.nl>  
**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>  
**Onderwerp:** Re: Graag planning BOPA toesturen

Hoi [REDACTED],

We kunnen de bijlage niet openen.  
Kun je ons een excel bestand sturen?

Thnx!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

cluster Zorgen en leren



Elderinkweg 2  
7255 KA Hengelo (Gld)  
Postbus 200  
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50  
W [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**Verzonden:** woensdag 26 februari 2025 09:54

**Aan:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>; [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>; [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**Onderwerp:** FW: Graag planning BOPA toesturen

Met vriendelijke groet,

[redacted]

cluster Zorgen en leren



Elderinkweg 2  
7255 KA Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl)

Postbus 200  
7255 ZJ Hengelo (Gld)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@brink.nl>

**Verzonden:** woensdag 26 februari 2025 09:30

**Aan:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@brink.nl>; [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>  
[redacted] <[redacted]@coa.nl>

**Onderwerp:** RE: Graag planning BOPA toesturen

Goedemorgen [redacted],

Hierbij de concept planning die we nu opgesteld hebben. Uiteraard zitten hier de nodige bestuurlijke en uitvoeringstechnische aannames in.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Senior projectmanager

T +31 10 237 00 00

M +31 6 [redacted]

[brink.nl](http://brink.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**Verzonden:** dinsdag 25 februari 2025 11:23

**Aan:** [redacted] <[redacted]@brink.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

**Onderwerp:** Graag planning BOPA toesturen

Dag [redacted],

Zou ik de planning van jou voor de BOPA kunnen ontvangen?

Gisteren had ik gezegd dat ik jouw onze planning zou sturen maar onze jurist wil graag jullie planning in hetzelfde overzicht opnemen zodat alle drie de opties uitgewerkt zijn in een overzicht.

Indien mogelijk graag vandaag want morgen moet ik stukken voor het college klaar hebben waar dit op de agenda staat.

Thnx!

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
cluster Zorgen en leren



**gemeente Bronckhorst**

Elderinkweg 2  
7255 KA Hengelo (Gld)  
Postbus 200  
7255 ZJ Hengelo (Gld)

**T** (0575) 75 02 50  
**W** [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl)




| Id  | Taaknaam                                                  | Duur      | Begindatum   | Einddatum    | Voorafgaande taken | juni 2024                |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   | kw 3, 2024        |    |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|----|---|---|-------------------|----|--|--|
|     |                                                           |           |              |              |                    | 31                       | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | juli 2024 | 30 | 3 | 6 | 9                 | 12 |  |  |
| 1   | Politieke besluitvorming                                  | 235 dagen | maa 27-5-24  | vri 23-5-25  |                    | Politieke besluitvorming |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 2   | Politiek proces                                           | 3 mndn    | maa 27-5-24  | maa 9-9-24   | 3EB                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 3   | Ambtelijk akkoord                                         | 4 vwkn    | maa 9-9-24   | maa 7-10-24  | 4EB                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 4   | Bestuurlijke afstemming                                   | 8 vwkn    | maa 7-10-24  | maa 2-12-24  | 5EB                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 5   | Politieke afstemming in raad (als nodig)                  | 8 wkn     | maa 2-12-24  | maa 10-2-25  | 6EB                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 6   | Bestuurlijk akkoord                                       | 4 vwkn    | maa 10-2-25  | maa 10-3-25  | 143EB;152E         |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 7   | Verwerven of aanhuren grond                               | 12 wkn    | maa 3-3-25   | vri 23-5-25  | 228EB              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 8   | Initiatieffase                                            | 0 dagen   | din 13-2-24  | din 13-2-24  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 9   | MT-IP                                                     | 0 dagen   | din 13-2-24  | din 13-2-24  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 10  | Definitiefase                                             | 309 dagen | din 13-2-24  | vri 23-5-25  |                    | Definitiefase            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 11  | Vertraging door overdracht dossier                        | 175 dagen | din 13-2-24  | maa 4-11-24  | 9                  |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 12  | RO onderzoeken                                            | 129 dagen | don 24-10-24 | din 6-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 13  | Flora & Fauna (Civil Man.)                                | 23 dagen  | don 24-10-24 | maa 25-11-24 |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 21  | Milieukundig bodemonderzoek (Civil Man.)                  | 38 dagen  | vri 8-11-24  | din 14-1-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 29  | Archeologie & cultuurhistorie                             | 45 dagen  | woe 5-3-25   | din 6-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 37  | Omgevingsgeluid t.g.v. AMV (Aveco de Bondt)               | 17 dagen  | don 20-2-25  | vri 14-3-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 45  | Waterparagraaf (Civil Man.)                               | 46 dagen  | vri 7-2-25   | vri 11-4-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 53  | Stikstofdepositie                                         | 40 dagen  | vri 7-2-25   | don 3-4-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 61  | Verkeerskundig onderzoek                                  | 45 dagen  | din 4-3-25   | maa 5-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 69  | Inmeting terrein (Civil Man.)                             | 31 dagen  | vri 7-2-25   | vri 21-3-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 77  | Kabels & leidingen (CLICK-melding)                        | 31 dagen  | vri 7-2-25   | vri 21-3-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 85  | Nutsvoorzieningen                                         | 120 dagen | maa 4-11-24  | maa 5-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 86  | Netbeheerder                                              | 55 dagen  | maa 4-11-24  | maa 3-2-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 94  | Waterleidingbedrijf                                       | 45 dagen  | din 4-3-25   | maa 5-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 102 | Riolering                                                 | 45 dagen  | din 4-3-25   | maa 5-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 110 | Glasvezel                                                 | 45 dagen  | din 4-3-25   | maa 5-5-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 118 | Voorlopig ontwerp (VO)                                    | 205 dagen | maa 8-7-24   | vri 23-5-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   | Voorlopig ontwerp |    |  |  |
| 119 | VO Selectie adviseurs                                     | 40 dagen  | maa 13-1-25  | vri 7-3-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 120 | Architect J & J                                           | 30 dagen  | maa 13-1-25  | vri 21-2-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 125 | Landschapsarchitect (Civil Man.)                          | 16 dagen  | vri 7-2-25   | vri 28-2-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 130 | Adv. Technische installaties (Aveco de Bondt)             | 18 dagen  | woe 12-2-25  | vri 7-3-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 135 | Adv. bouwfysica en brandveiligheid                        | 18 dagen  | woe 12-2-25  | vri 7-3-25   |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 140 | Voorontwerp (VO)                                          | 54 dagen  | din 28-1-25  | vri 11-4-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 141 | Analyse PvE + ontwikkeling typologie                      | 2 wkn     | din 28-1-25  | maa 10-2-25  | 121BE+11 dagen     |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 142 | Opstellen overzicht m2 - nvo   bvo   terrein              | 1 wk      | din 4-2-25   | maa 10-2-25  | 141GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 143 | Structuurontwerp + typologie                              | 14 dagen  | din 11-2-25  | vri 28-2-25  | 141                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 144 | Studie naar gemeente                                      | 0 dagen   | vri 28-2-25  | vri 28-2-25  | 143GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 145 | Overleg gemeente                                          | 0 dagen   | din 4-3-25   | din 4-3-25   | 144BE+2 dagen      |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 146 | Overleg klankbordgroep omwonenden                         | 0 dagen   | woe 19-3-25  | woe 19-3-25  | 145BE+11 dagen     |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 147 | VO bouwkundig + integraal                                 | 6 wkn     | maa 3-3-25   | vri 11-4-25  | 143                |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 148 | VO constructies                                           | 4 wkn     | maa 17-3-25  | vri 11-4-25  | 147GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 149 | VO technische installaties                                | 4 wkn     | maa 17-3-25  | vri 11-4-25  | 147GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 150 | VO terrein                                                | 30 dagen  | maa 3-3-25   | vri 11-4-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 151 | Analyse PvE                                               | 5 dagen   | maa 3-3-25   | maa 10-3-25  | 152EB              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 152 | Structuurontwerp terrein en overzicht m2 en voorzieningen | 5 dagen   | maa 10-3-25  | maa 17-3-25  | 153EB              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 153 | VO terrein                                                | 20 dagen  | maa 17-3-25  | vri 11-4-25  | 147GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |
| 154 | VO Participatie                                           | 175 dagen | maa 8-7-24   | vri 11-4-25  |                    |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   | VO Participatie   |    |  |  |
| 155 | Overleg Klankbordgroep locatie Hengelo                    | 175 dagen | maa 8-7-24   | vri 11-4-25  | 147GE              |                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |           |    |   |   |                   |    |  |  |

| Id  | Taaknaam                                                 | Duur      | Begindatum  | Einddatum   | Voorafgaande taken | juni 2024 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   | kw 3, 2024 |   |    |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|------------|---|----|--|--|--|
|     |                                                          |           |             |             |                    | 31        | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6          | 9 | 12 |  |  |  |
| 156 | Klankbordgroep locatie Hengelo                           | 0 dagen   | woe 19-3-25 | woe 19-3-25 | 146GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 157 | VO Raming bouw- en investeringskosten                    | 10 dagen  | maa 14-4-25 | vri 25-4-25 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 158 | Raming bouwkosten bouwkundig + constructies              | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147;148            |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 159 | Raming bouwkosten technische installaties                | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 149                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 160 | Raming bouwkosten terrein                                | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 161 | Beoordelen bouwkostenramingen                            | 5 dagen   | maa 21-4-25 | vri 25-4-25 | 158                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 162 | Raming investeringskosten                                | 5 dagen   | maa 21-4-25 | vri 25-4-25 | 158                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 163 | VO Opstellen stukken Omgevingsvergunning                 | 10 dagen  | maa 14-4-25 | vri 25-4-25 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 164 | VO gebouwen                                              | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 165 | VO Infra + Terreininrichting                             | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 166 | Rapportage Bouwfysica                                    | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 167 | Rapportage Brandveiligheid                               | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 168 | Rapportage Flora & fauna onderzoek                       | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 169 | Rapportage Milieukundig bodemonderzoek                   | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 170 | Rapportage Archeologie & cultuurhistorie                 | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 171 | Rapportage Omgevingsgeluid t.g.v. AMV                    | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 172 | Rapportage Waterparagraaf                                | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 173 | Rapportage Stikstofdepositie                             | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 174 | Rapportage Verkeerskundig onderzoek                      | 5 dagen   | maa 14-4-25 | vri 18-4-25 | 147                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 175 | Samenstellen dossier Omgevingsvergunning                 | 5 dagen   | maa 21-4-25 | vri 25-4-25 | 164                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 176 | Fasedocument Definitie + Int. besluitvorming             | 35 dagen  | maa 7-4-25  | vri 23-5-25 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 177 | Concept fasedocument Definitie                           | 15 dagen  | maa 7-4-25  | vri 25-4-25 | 162GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 178 | Interne Review                                           | 5 dagen   | maa 28-4-25 | vri 2-5-25  | 177                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 179 | Definitief Fasedoc. Definitiefase + indienen MT-IP       | 5 dagen   | maa 5-5-25  | vri 9-5-25  | 178                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 180 | MT-IP                                                    | 0 dagen   | vri 9-5-25  | vri 9-5-25  | 179                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 181 | Directieteambespreking                                   | 5 dagen   | maa 12-5-25 | vri 16-5-25 | 180                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 182 | Bestuur (< € 25 mio)                                     | 5 dagen   | maa 19-5-25 | vri 23-5-25 | 181                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 183 | Fase 1 - Voorbereidingsfase                              | 440 dagen | maa 17-3-25 | vri 29-1-27 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 184 | Contractering en vervolgopdrachten                       | 20 dagen  | maa 28-4-25 | vri 23-5-25 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 185 | Concept vervolgopdrachten - Relevante adviseurs          | 10 dagen  | maa 5-5-25  | maa 19-5-25 | 186EB              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 186 | Contractering vervolgopdrachten                          | 5 dagen   | maa 19-5-25 | vri 23-5-25 | 182GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 187 | Concept contractering COACH                              | 15 dagen  | maa 28-4-25 | maa 19-5-25 | 188EB              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 188 | Contractering COACH-bouwer                               | 5 dagen   | maa 19-5-25 | vri 23-5-25 | 182GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 189 | Uitwerken VO naar DO+                                    | 50 dagen  | maa 26-5-25 | vri 1-8-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 190 | Integraal DO+ door COACH-bouwer                          | 7 wkn     | maa 26-5-25 | vri 11-7-25 | 188                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 191 | Integraal DO+ Infra + Terreininrichting                  | 7 wkn     | maa 26-5-25 | vri 11-7-25 | 186                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 192 | Beoordelen integraal DO+ gebouwen   Infra + Terrein      | 5 dagen   | maa 14-7-25 | vri 18-7-25 | 191                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 193 | [EVT] Aanpassen integraal DO+ gebouwen   Infra + Terrein | 10 dagen  | maa 21-7-25 | vri 1-8-25  | 192                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 194 | Minicompetitie aannemer Infra + terrein                  | 60 dagen  | maa 17-3-25 | vri 6-6-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 195 | Voorbereiding                                            | 20 dagen  | maa 17-3-25 | vri 11-4-25 | 153GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 196 | Gunningsfase                                             | 6 wkn     | maa 14-4-25 | vri 23-5-25 | 195                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 197 | Beoordeling                                              | 5 dagen   | maa 26-5-25 | vri 30-5-25 | 196                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 198 | Bezwaartermijn                                           | 5 dagen   | maa 2-6-25  | vri 6-6-25  | 197                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 199 | Contractering aannemer Infra + Terrein                   | 0 dagen   | vri 6-6-25  | vri 6-6-25  | 198                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 200 | Raming bouw- en investeringskosten                       | 30 dagen  | maa 30-6-25 | vri 29-8-25 |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 201 | Raming bouwkosten integraal DO+ (COACH)                  | 10 dagen  | maa 30-6-25 | vri 11-7-25 | 190GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 202 | Raming bouwkosten Infra + Terrein                        | 10 dagen  | maa 30-6-25 | vri 11-7-25 | 191GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |
| 203 | Beoordelen bouwkostenramingen                            | 10 dagen  | maa 14-7-25 | vri 25-7-25 | 201;202            |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |            |   |    |  |  |  |



| Id  | Taaknaam                                                                                              | Duur      | Begindatum   | Einddatum    | Voorafgaande taken | juni 2024 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | kw 3, 2024 |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|------------|--|--|--|--|
|     |                                                                                                       |           |              |              |                    | 31        | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12         |  |  |  |  |
| 204 | [EVT] Aanpassen integraal DO+ en bouwkosten                                                           | 10 dagen  | maa 28-7-25  | vri 29-8-25  | 203                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 205 | Raming investeringskosten                                                                             | 5 dagen   | maa 21-7-25  | vri 25-7-25  | 203GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 206 | Fasedocument Realisatie en Int. besluitvorming                                                        | 35 dagen  | maa 7-7-25   | vri 12-9-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 207 | Concept fasedocument Realisatie                                                                       | 15 dagen  | maa 7-7-25   | vri 25-7-25  | 203GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 208 | Interne Review                                                                                        | 5 dagen   | maa 28-7-25  | vri 1-8-25   | 207                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 209 | Definitief Fasedoc. Realisatiefase + indienen MT-IP                                                   | 5 dagen   | maa 25-8-25  | vri 29-8-25  | 208                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 210 | MT-IP                                                                                                 | 0 dagen   | vri 29-8-25  | vri 29-8-25  | 209                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 211 | Directieteambespreking                                                                                | 5 dagen   | maa 1-9-25   | vri 5-9-25   | 210                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 212 | Bestuur (< € 25 mio)                                                                                  | 5 dagen   | maa 8-9-25   | vri 12-9-25  | 211                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 213 | Vergunningen                                                                                          | 390 dagen | vri 23-5-25  | vri 29-1-27  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 214 | Optie 1: Omgevingsvergunning regulier                                                                 | 245 dagen | vri 23-5-25  | vri 5-6-26   |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 215 | indienen aanvraag omgevingsvergunning                                                                 | 0 dagen   | vri 23-5-25  | vri 23-5-25  | 182                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 216 | procedure omgevingsvergunning                                                                         | 8 vwkn    | vri 23-5-25  | vri 18-7-25  | 215                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 217 | [EVT]: eenmalige verlenging beslistermijn                                                             | 6 wkn     | maa 9-6-25   | vri 18-7-25  | 216GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 218 | [EVENTUEEL]: eenmalige verlenging beslistermijn als instemming ander bestuursorgaan is voorgeschreven | 4 wkn     | maa 23-6-25  | vri 18-7-25  | 216GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 219 | Verlenen herroepelijke omgevingsvergunning                                                            | 0 dagen   | vri 18-7-25  | vri 18-7-25  | 217                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 220 | Bezwaartermijn omgevingsvergunning                                                                    | 6 vwkn    | vri 18-7-25  | vri 29-8-25  | 219                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 221 | Vroegst mogelijke onherroepelijke omgevingsvergunning indien geen bezwaren                            | 0 dagen   | vri 29-8-25  | vri 29-8-25  | 220                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 222 | [EVENTUEEL]: Behandelen bezwaren                                                                      | 6 wkn     | maa 1-9-25   | vri 10-10-25 | 221                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 223 | [EVENTUEEL]: Beroepstermijn                                                                           | 6 wkn     | maa 13-10-25 | vri 21-11-25 | 222                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 224 | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning indien geen beroep                                       | 0 dagen   | vri 21-11-25 | vri 21-11-25 | 223                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 225 | [EVT] Behandelen beroepen                                                                             | 26 wkn    | maa 24-11-25 | vri 5-6-26   | 224                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 226 | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning indien beroepen afgehandeld                              | 0 dagen   | vri 5-6-26   | vri 5-6-26   | 225                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 227 | Optie 2: Omgevingsvergunning uitgebreid                                                               | 390 dagen | vri 23-5-25  | vri 29-1-27  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 228 | indienen aanvraag omgevingsvergunning                                                                 | 0 dagen   | vri 23-5-25  | vri 23-5-25  | 182                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 229 | Procedure omgevingsvergunning                                                                         | 26 wkn    | maa 26-5-25  | vri 12-12-25 | 228                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 230 | [EVT] eenmalige verlenging beslistermijn                                                              | 6 wkn     | maa 15-12-25 | vri 6-2-26   | 229                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 231 | Ter inzage ontwerpbesluit                                                                             | 6 wkn     | maa 9-2-26   | vri 20-3-26  | 230                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 232 | Vroegst mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning indien geen zienswijzen                          | 0 dagen   | vri 20-3-26  | vri 20-3-26  | 231                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 233 | [EVT] Behandelen zienswijzen                                                                          | 10 wkn    | maa 23-3-26  | vri 29-5-26  | 232                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 234 | [EVT] Beroepstermijn                                                                                  | 6 wkn     | maa 1-6-26   | vri 10-7-26  | 233                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 235 | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning indien geen beroep                                       | 0 dagen   | vri 10-7-26  | vri 10-7-26  | 234                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 236 | [EVT] Behandelen beroepen                                                                             | 6 mndn    | maa 13-7-26  | vri 29-1-27  | 235                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 237 | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning indien beroepen afgehandeld                              | 0 dagen   | vri 29-1-27  | vri 29-1-27  | 236                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 238 | Fase 2 - Realisatiefase (onder voorbehoud omgevingsvergunning)                                        | 100 dagen | maa 30-6-25  | vri 5-12-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 239 | Contractering en vervolgopdrachten                                                                    | 20 dagen  | maa 30-6-25  | vri 25-7-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 240 | Concept vervolgopdrachten relevante adviseurs                                                         | 10 dagen  | maa 7-7-25   | vri 18-7-25  | 192GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 241 | Contractering vervolgopdrachten                                                                       | 5 dagen   | maa 21-7-25  | vri 25-7-25  | 240                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 242 | Concept annemingsovereenkomst COACH-bouwer                                                            | 15 dagen  | maa 30-6-25  | vri 18-7-25  | 192GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 243 | Aannemingsovereenkomst COACH-bouwer                                                                   | 5 dagen   | maa 21-7-25  | vri 25-7-25  | 242                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 244 | Concept annemingsovereenkomst Infra + Terrein                                                         | 15 dagen  | maa 30-6-25  | vri 18-7-25  | 192GE              |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 245 | Aannemingsovereenkomst Infra + Terrein                                                                | 5 dagen   | maa 21-7-25  | vri 25-7-25  | 244                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 246 | Realisatie door COACH-bouwer                                                                          | 85 dagen  | maa 21-7-25  | vri 5-12-25  |                    |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 247 | Technisch ontwerp                                                                                     | 4 wkn     | maa 21-7-25  | vri 5-9-25   | 242                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 248 | Beoordeling technisch ontwerp                                                                         | 5 dagen   | maa 8-9-25   | vri 12-9-25  | 247                |           |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |            |  |  |  |  |



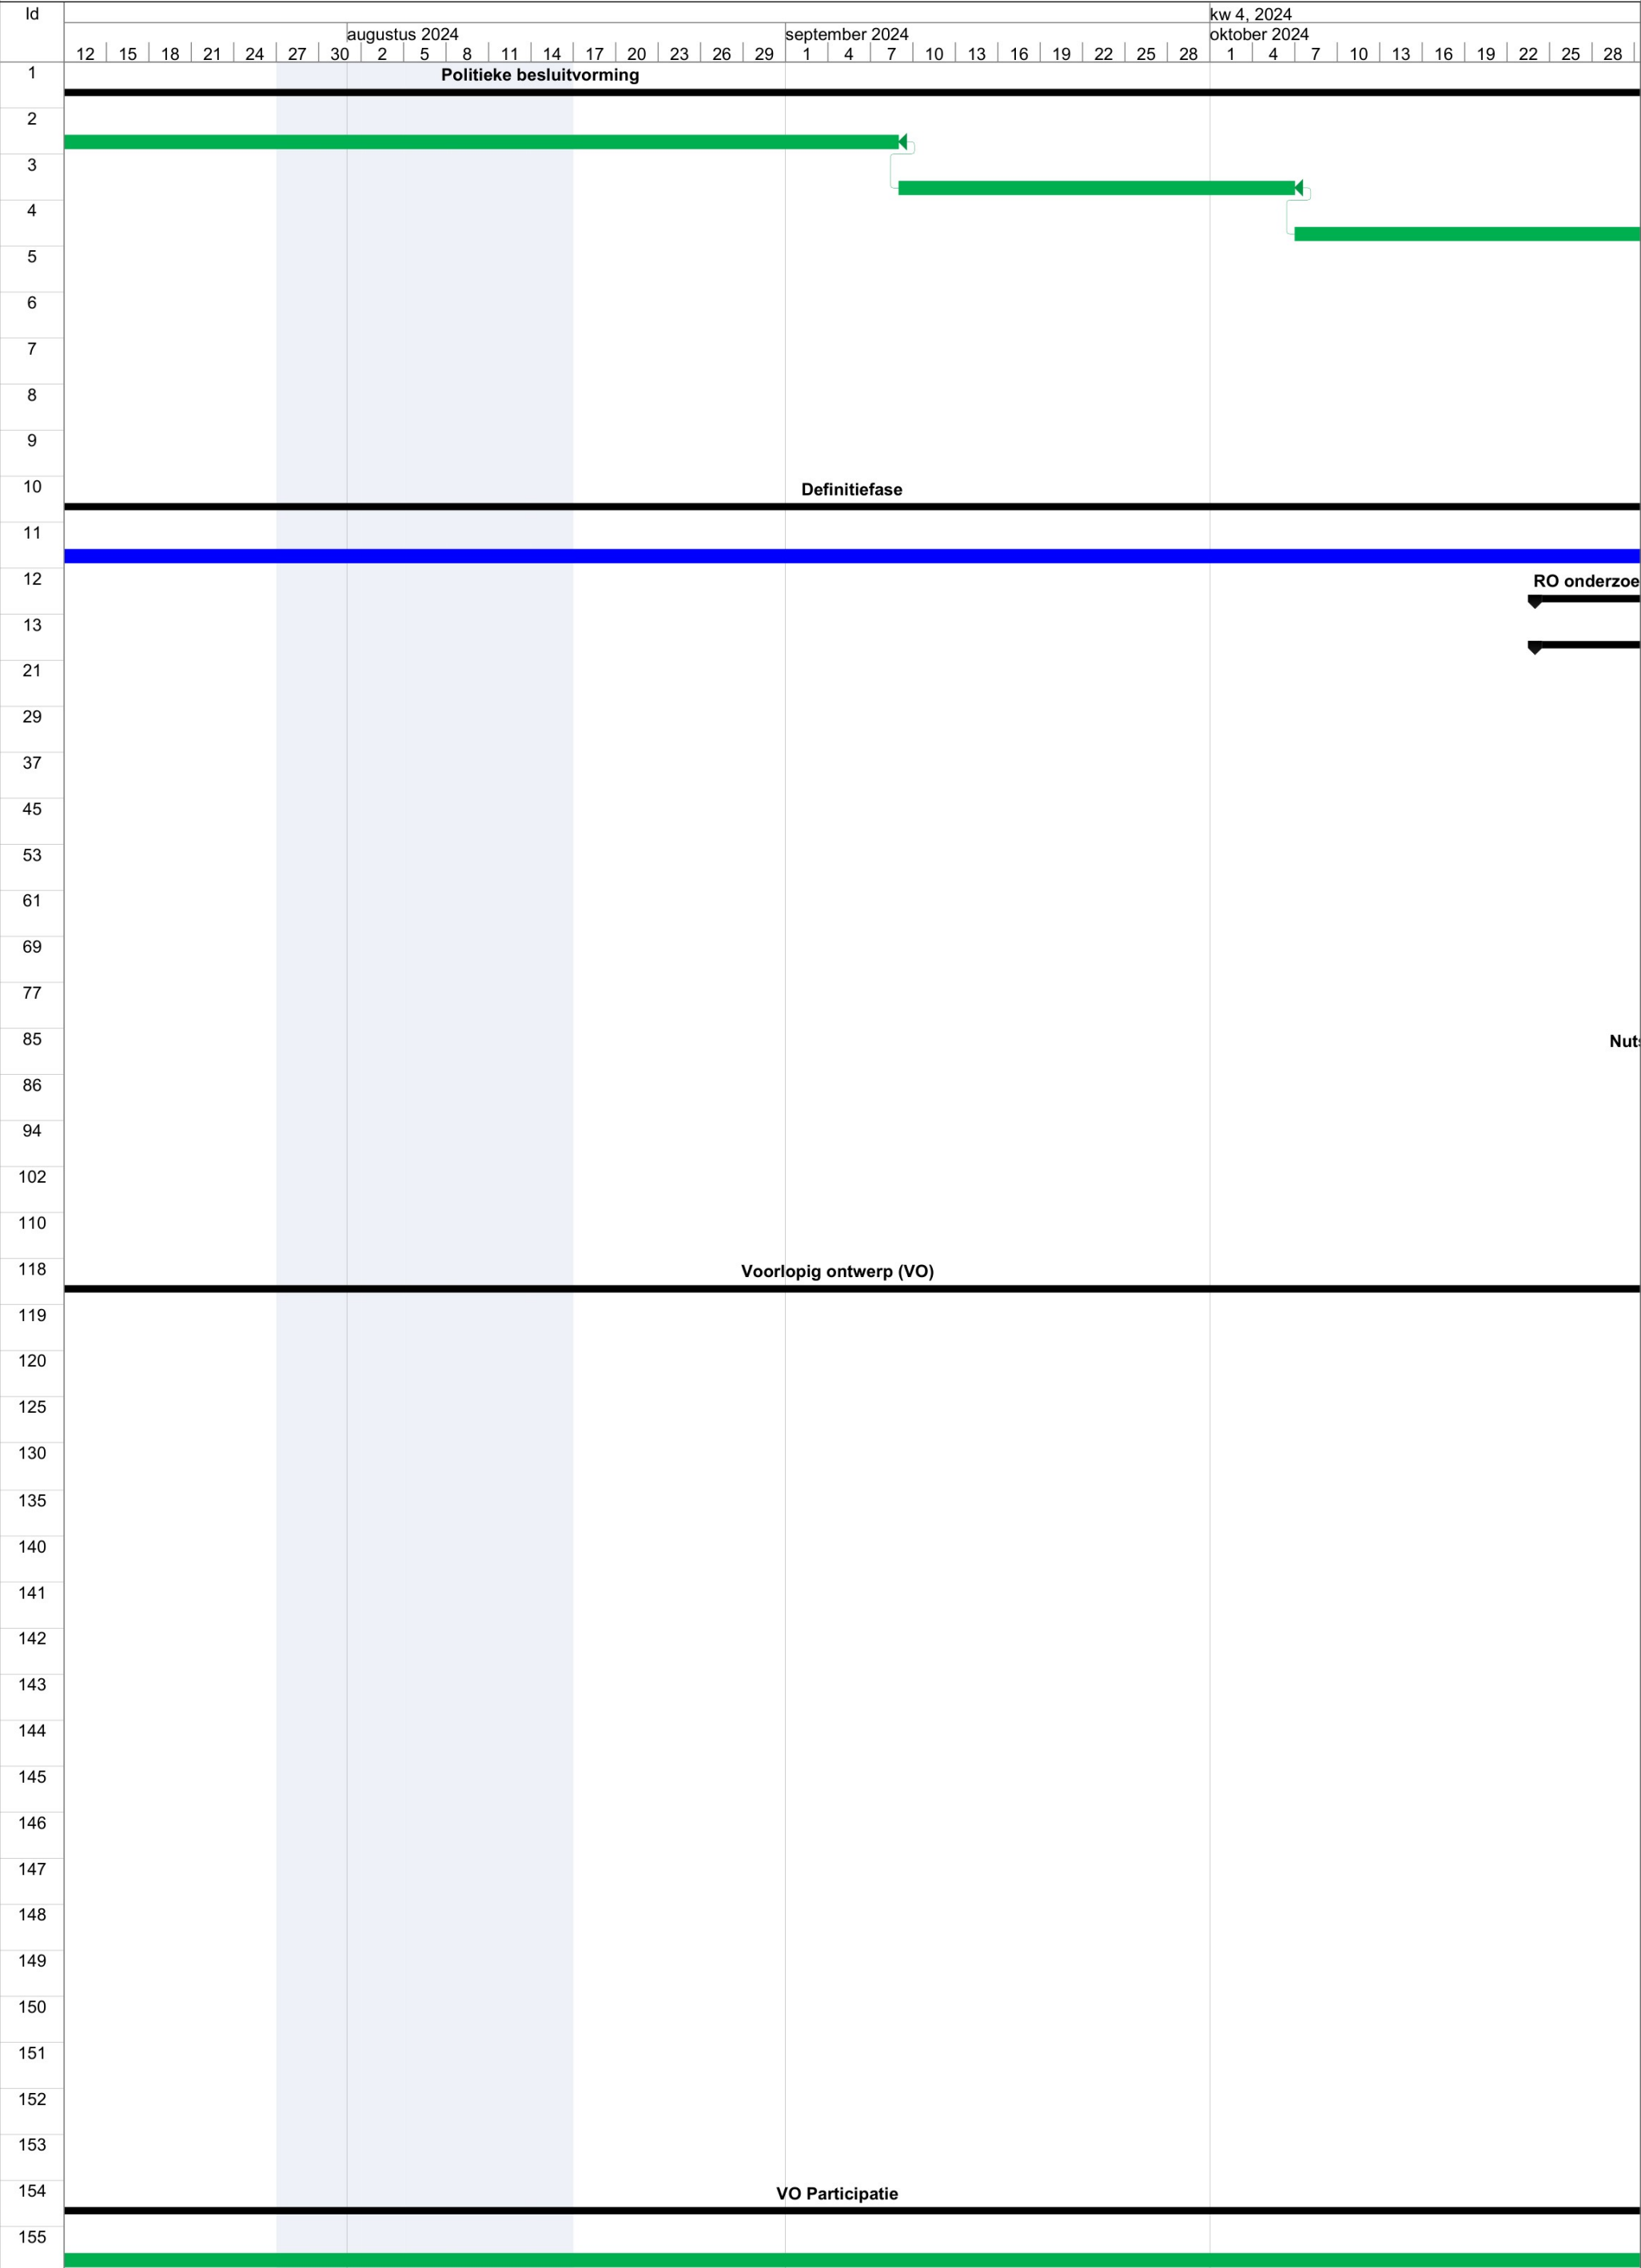




| Id  |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   | kw 4, 2024   |   |    |    |    |    |    |    |
|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----------------|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------|---|----|----|----|----|----|----|
|     | augustus 2024 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    | september 2024 |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   | oktober 2024 |   |    |    |    |    |    |    |
|     | 12            | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23             | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4            | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 204 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 205 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 206 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 207 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 208 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 209 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 210 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 211 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 212 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 213 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 214 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 215 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 216 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 217 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 218 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 219 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 220 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 221 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 222 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 223 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 224 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 225 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 226 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 227 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 228 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 229 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 230 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 231 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 232 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 233 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 234 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 235 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 236 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 237 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 238 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 239 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 240 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 241 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 242 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 243 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 244 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 245 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 246 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 247 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |
| 248 |               |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |                |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |              |   |    |    |    |    |    |    |






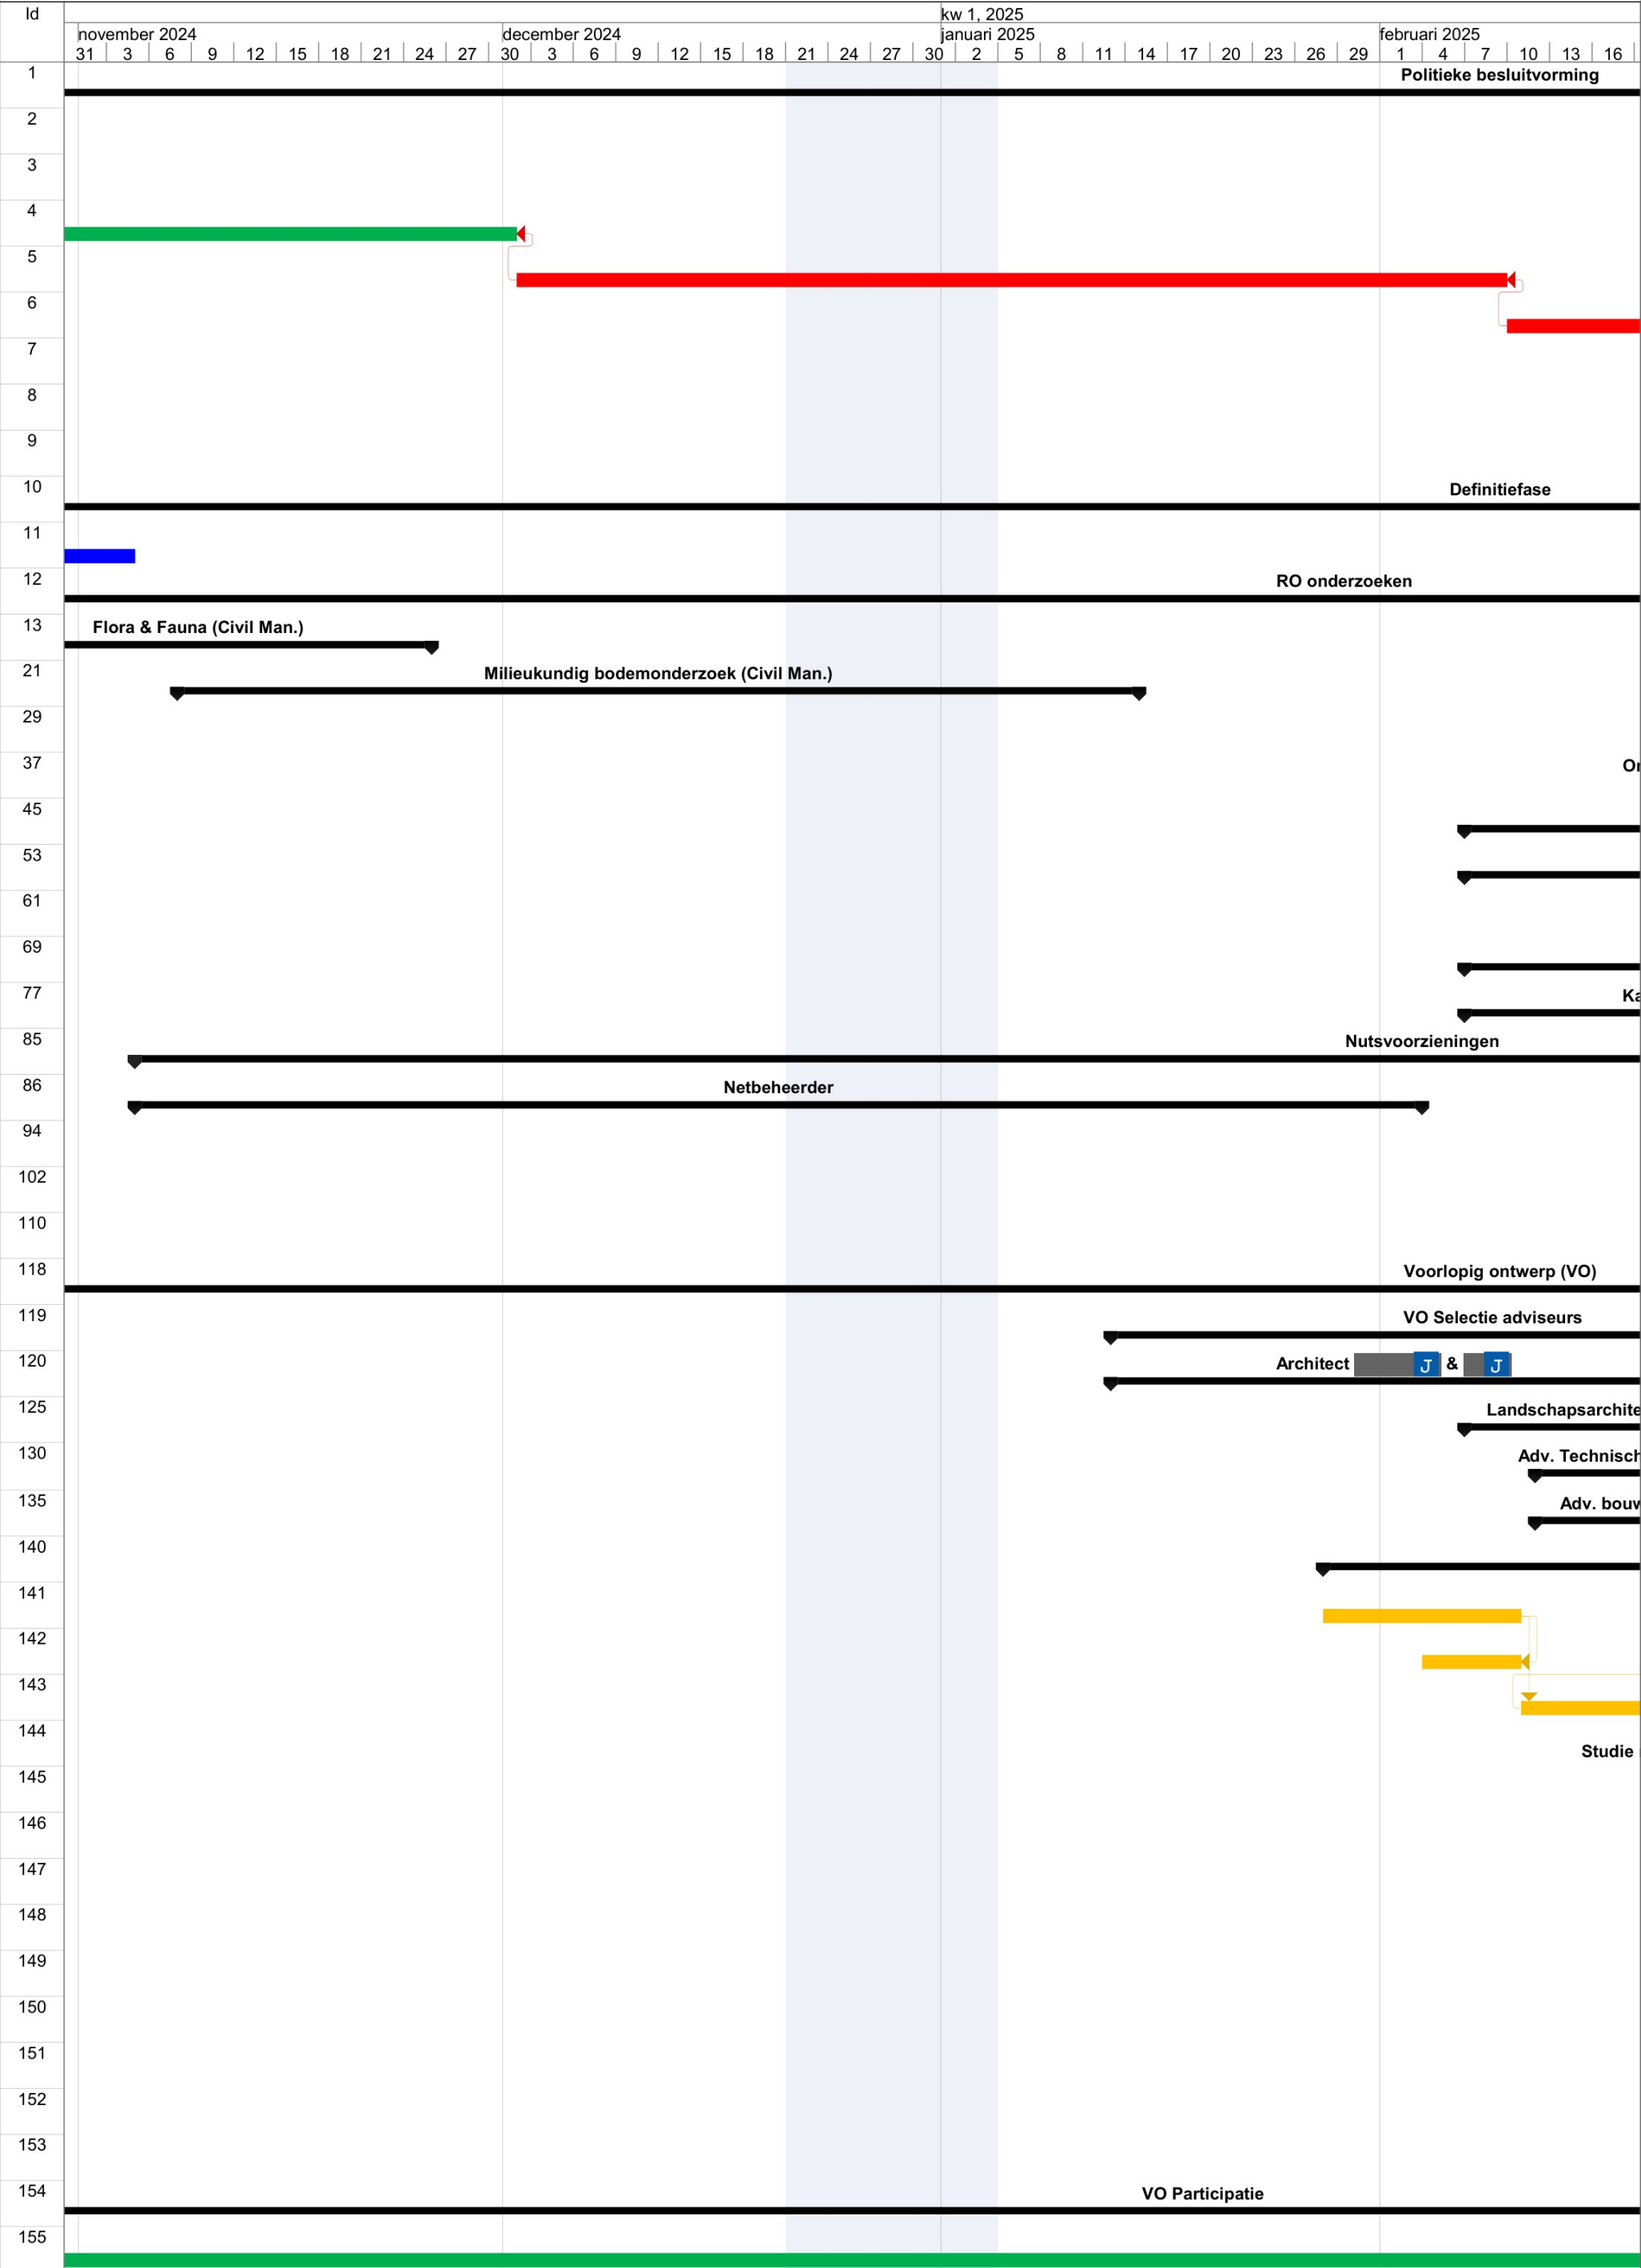







| Id  | november 2024 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | december 2024 |   |   |   |    |    |    |    | kw 1, 2025<br>januari 2025 |    |    |   |   |   |    |    |    |    | februari 2025 |    |    |   |   |   |    |    |
|-----|---------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------|---|---|---|----|----|----|----|----------------------------|----|----|---|---|---|----|----|----|----|---------------|----|----|---|---|---|----|----|
|     | 31            | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30            | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24                         | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23            | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 249 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 250 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 251 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 252 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 253 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 254 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 255 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 256 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 257 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 258 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 259 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 260 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 261 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 262 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 263 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |
| 264 |               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |               |   |   |   |    |    |    |    |                            |    |    |   |   |   |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |    |    |

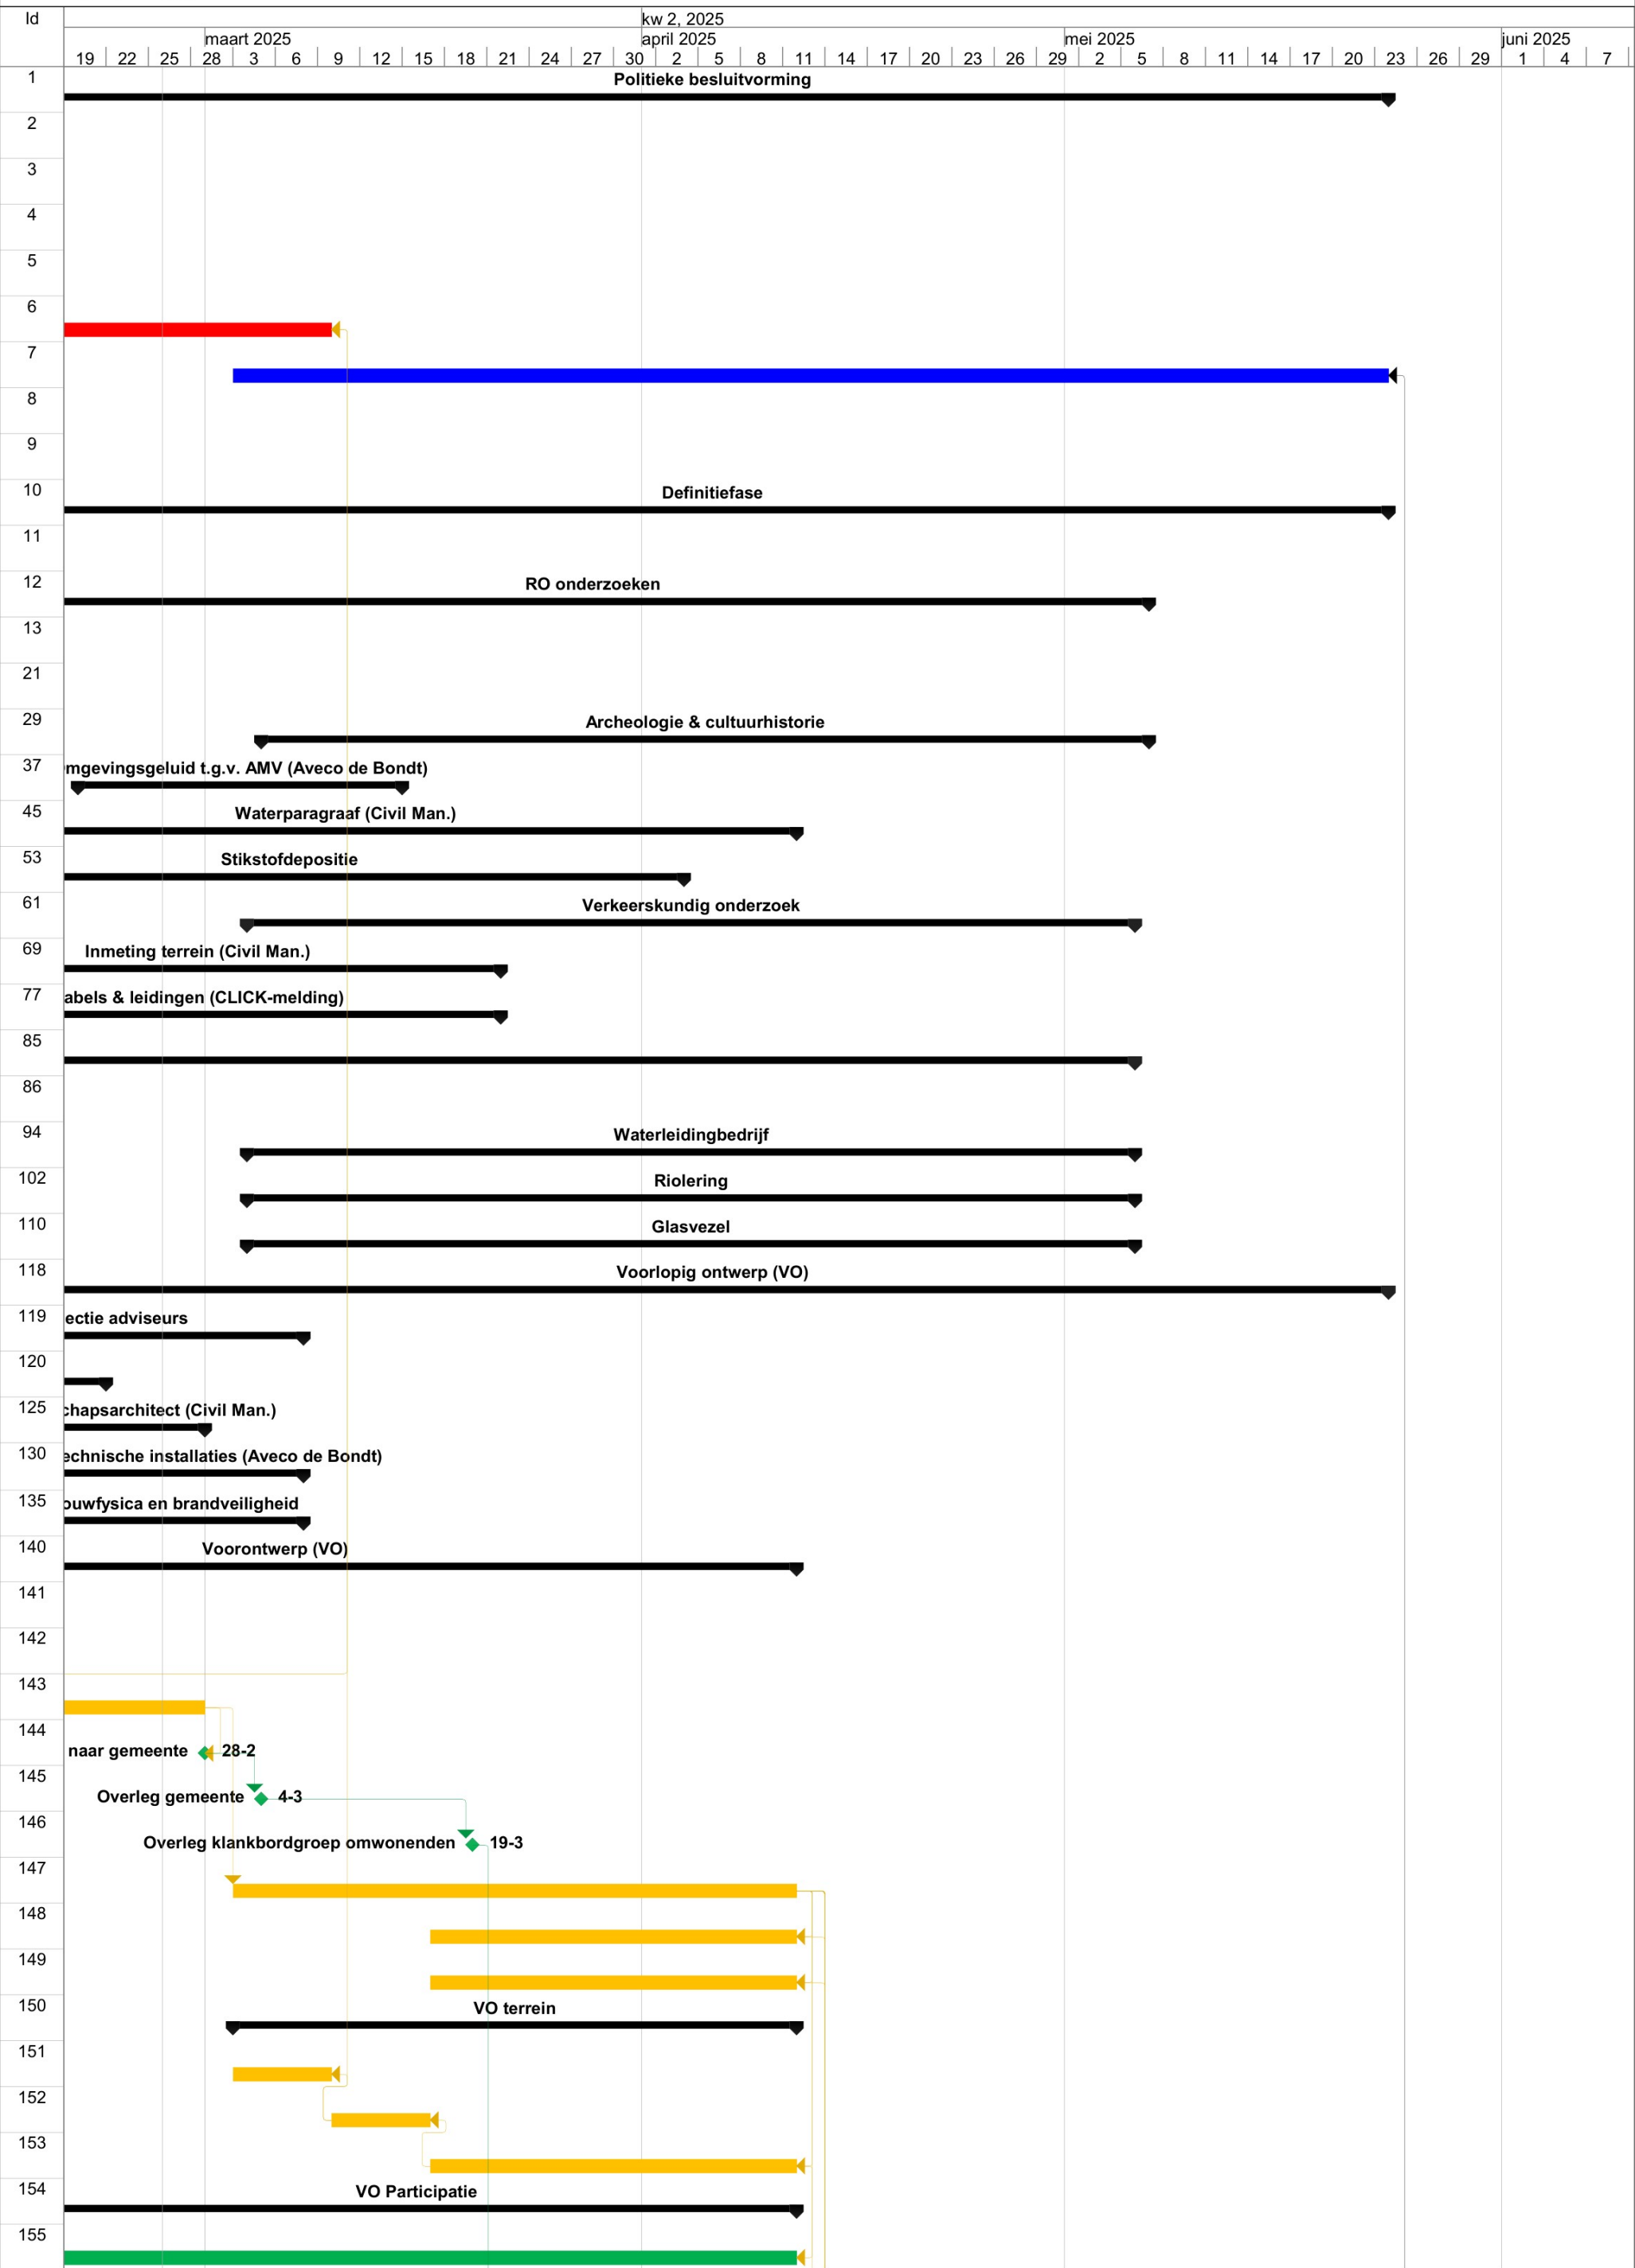




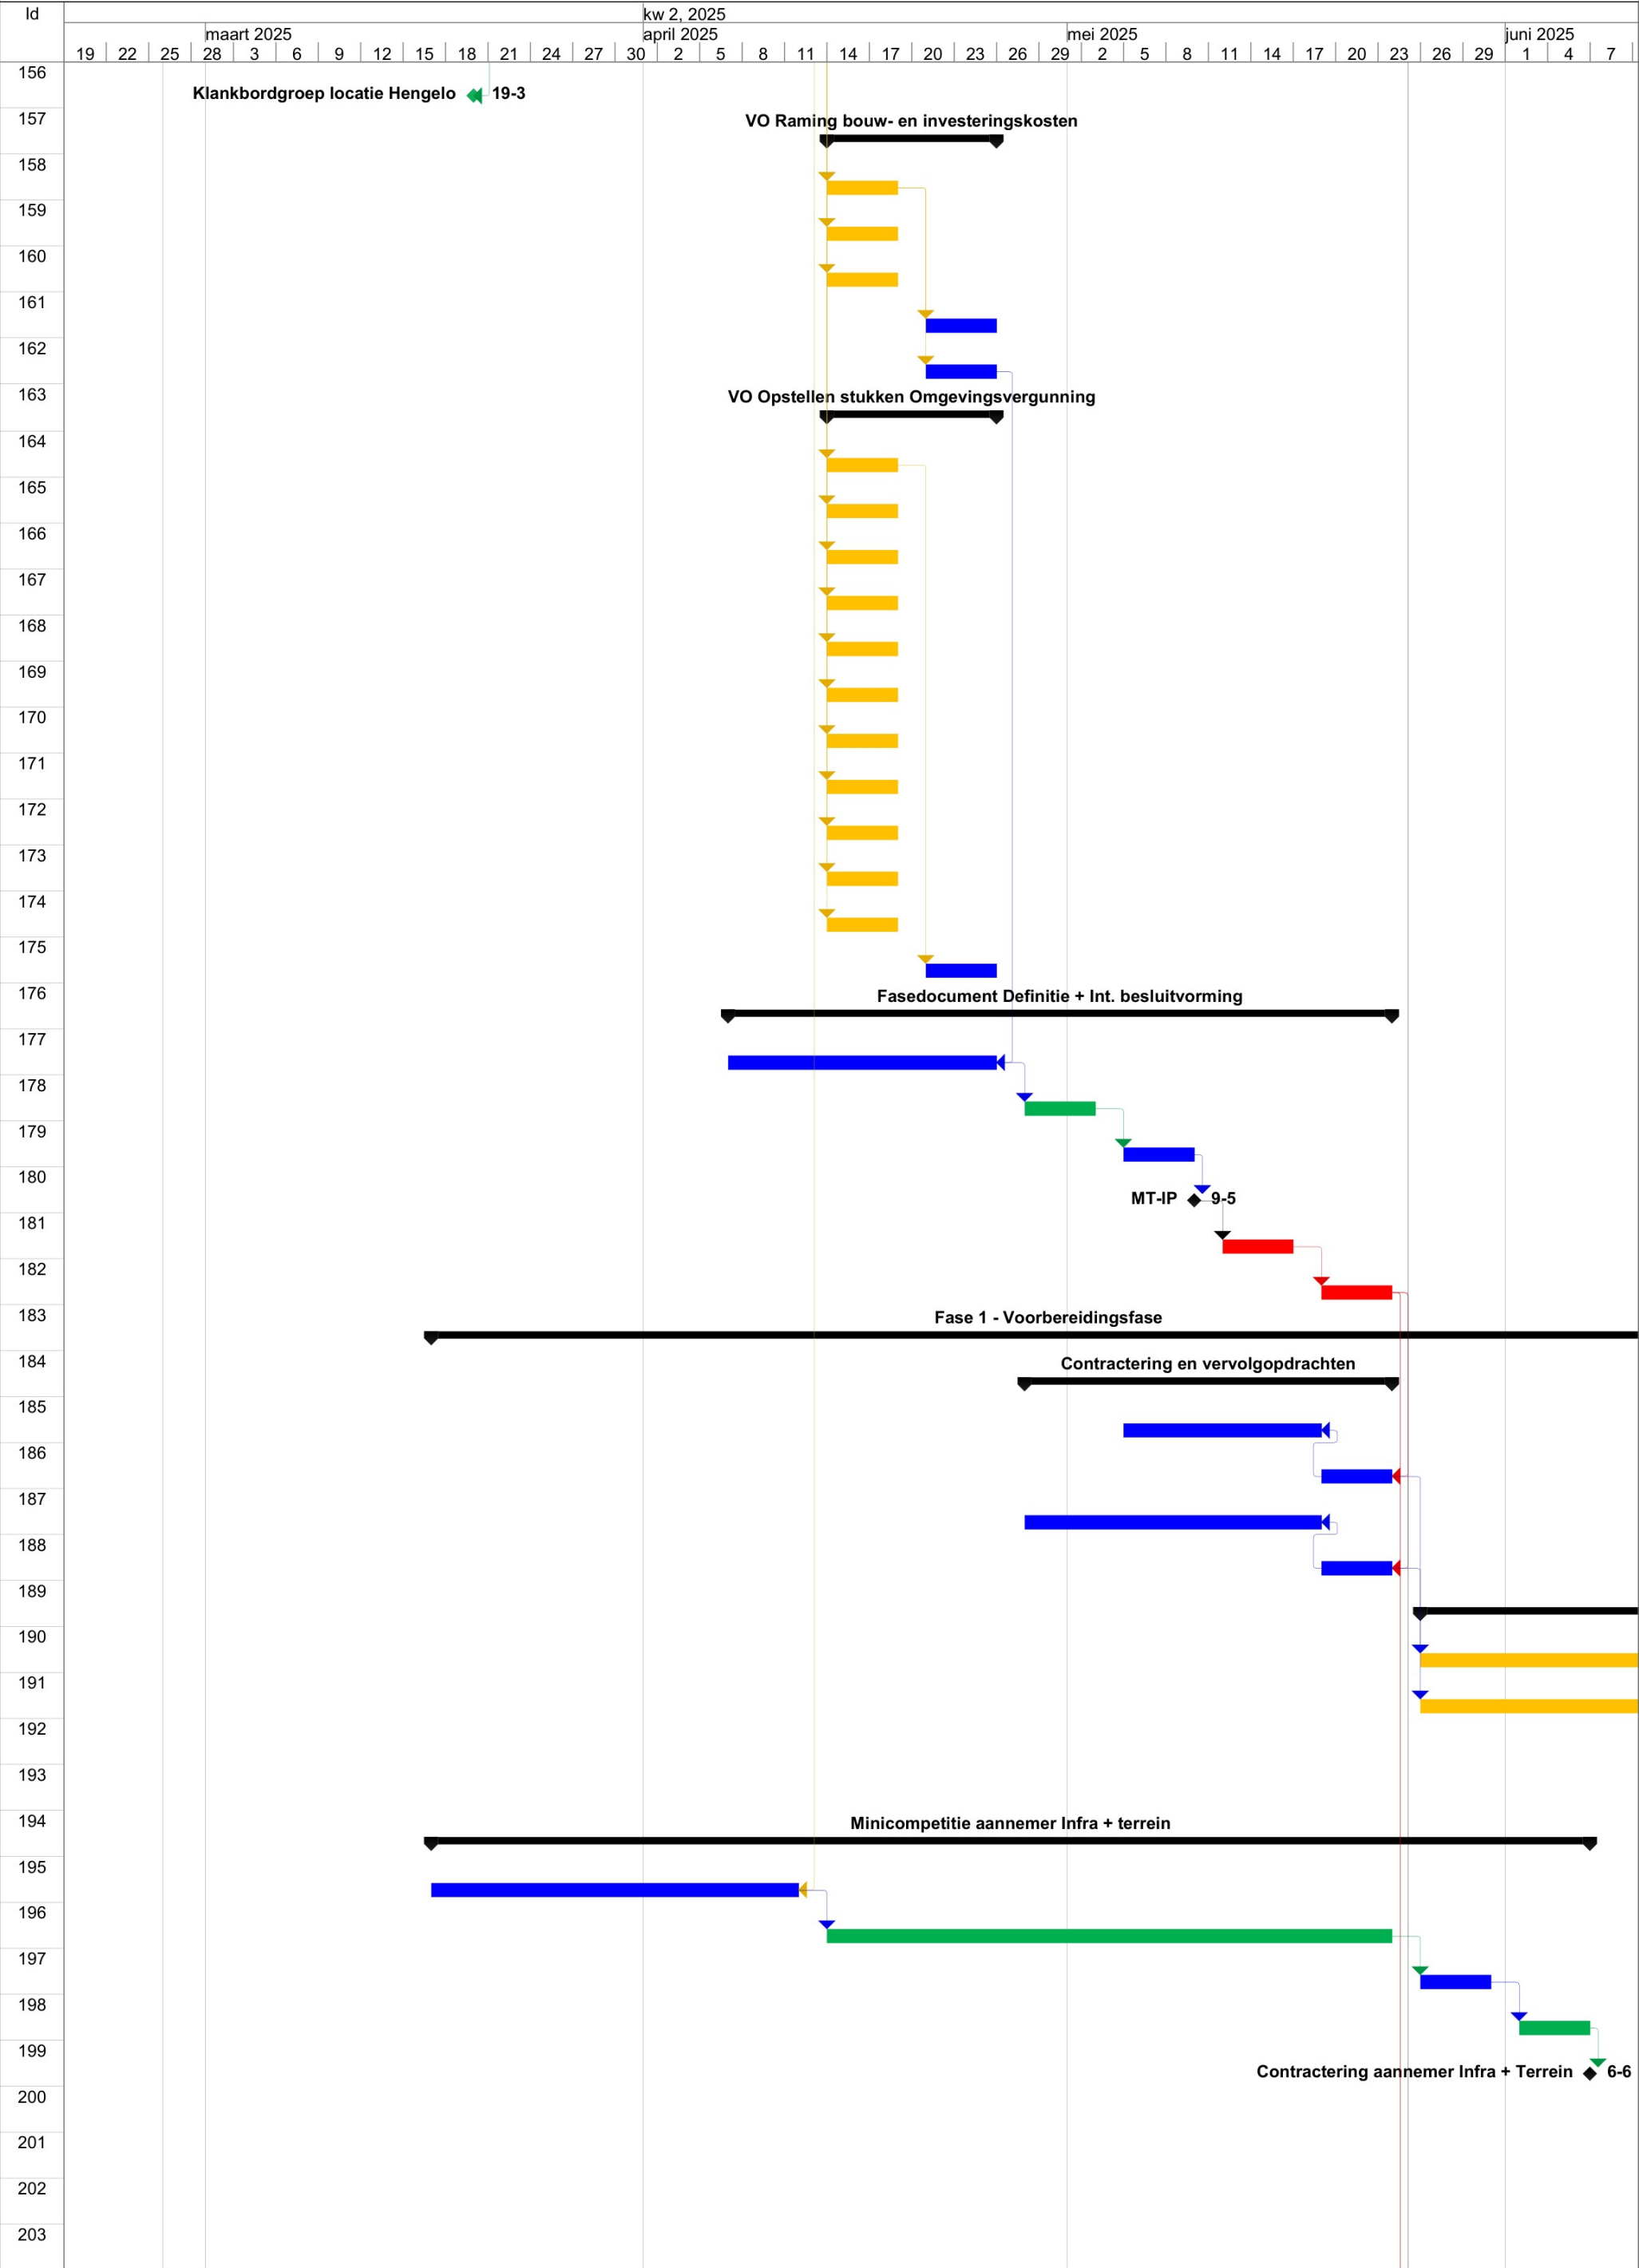


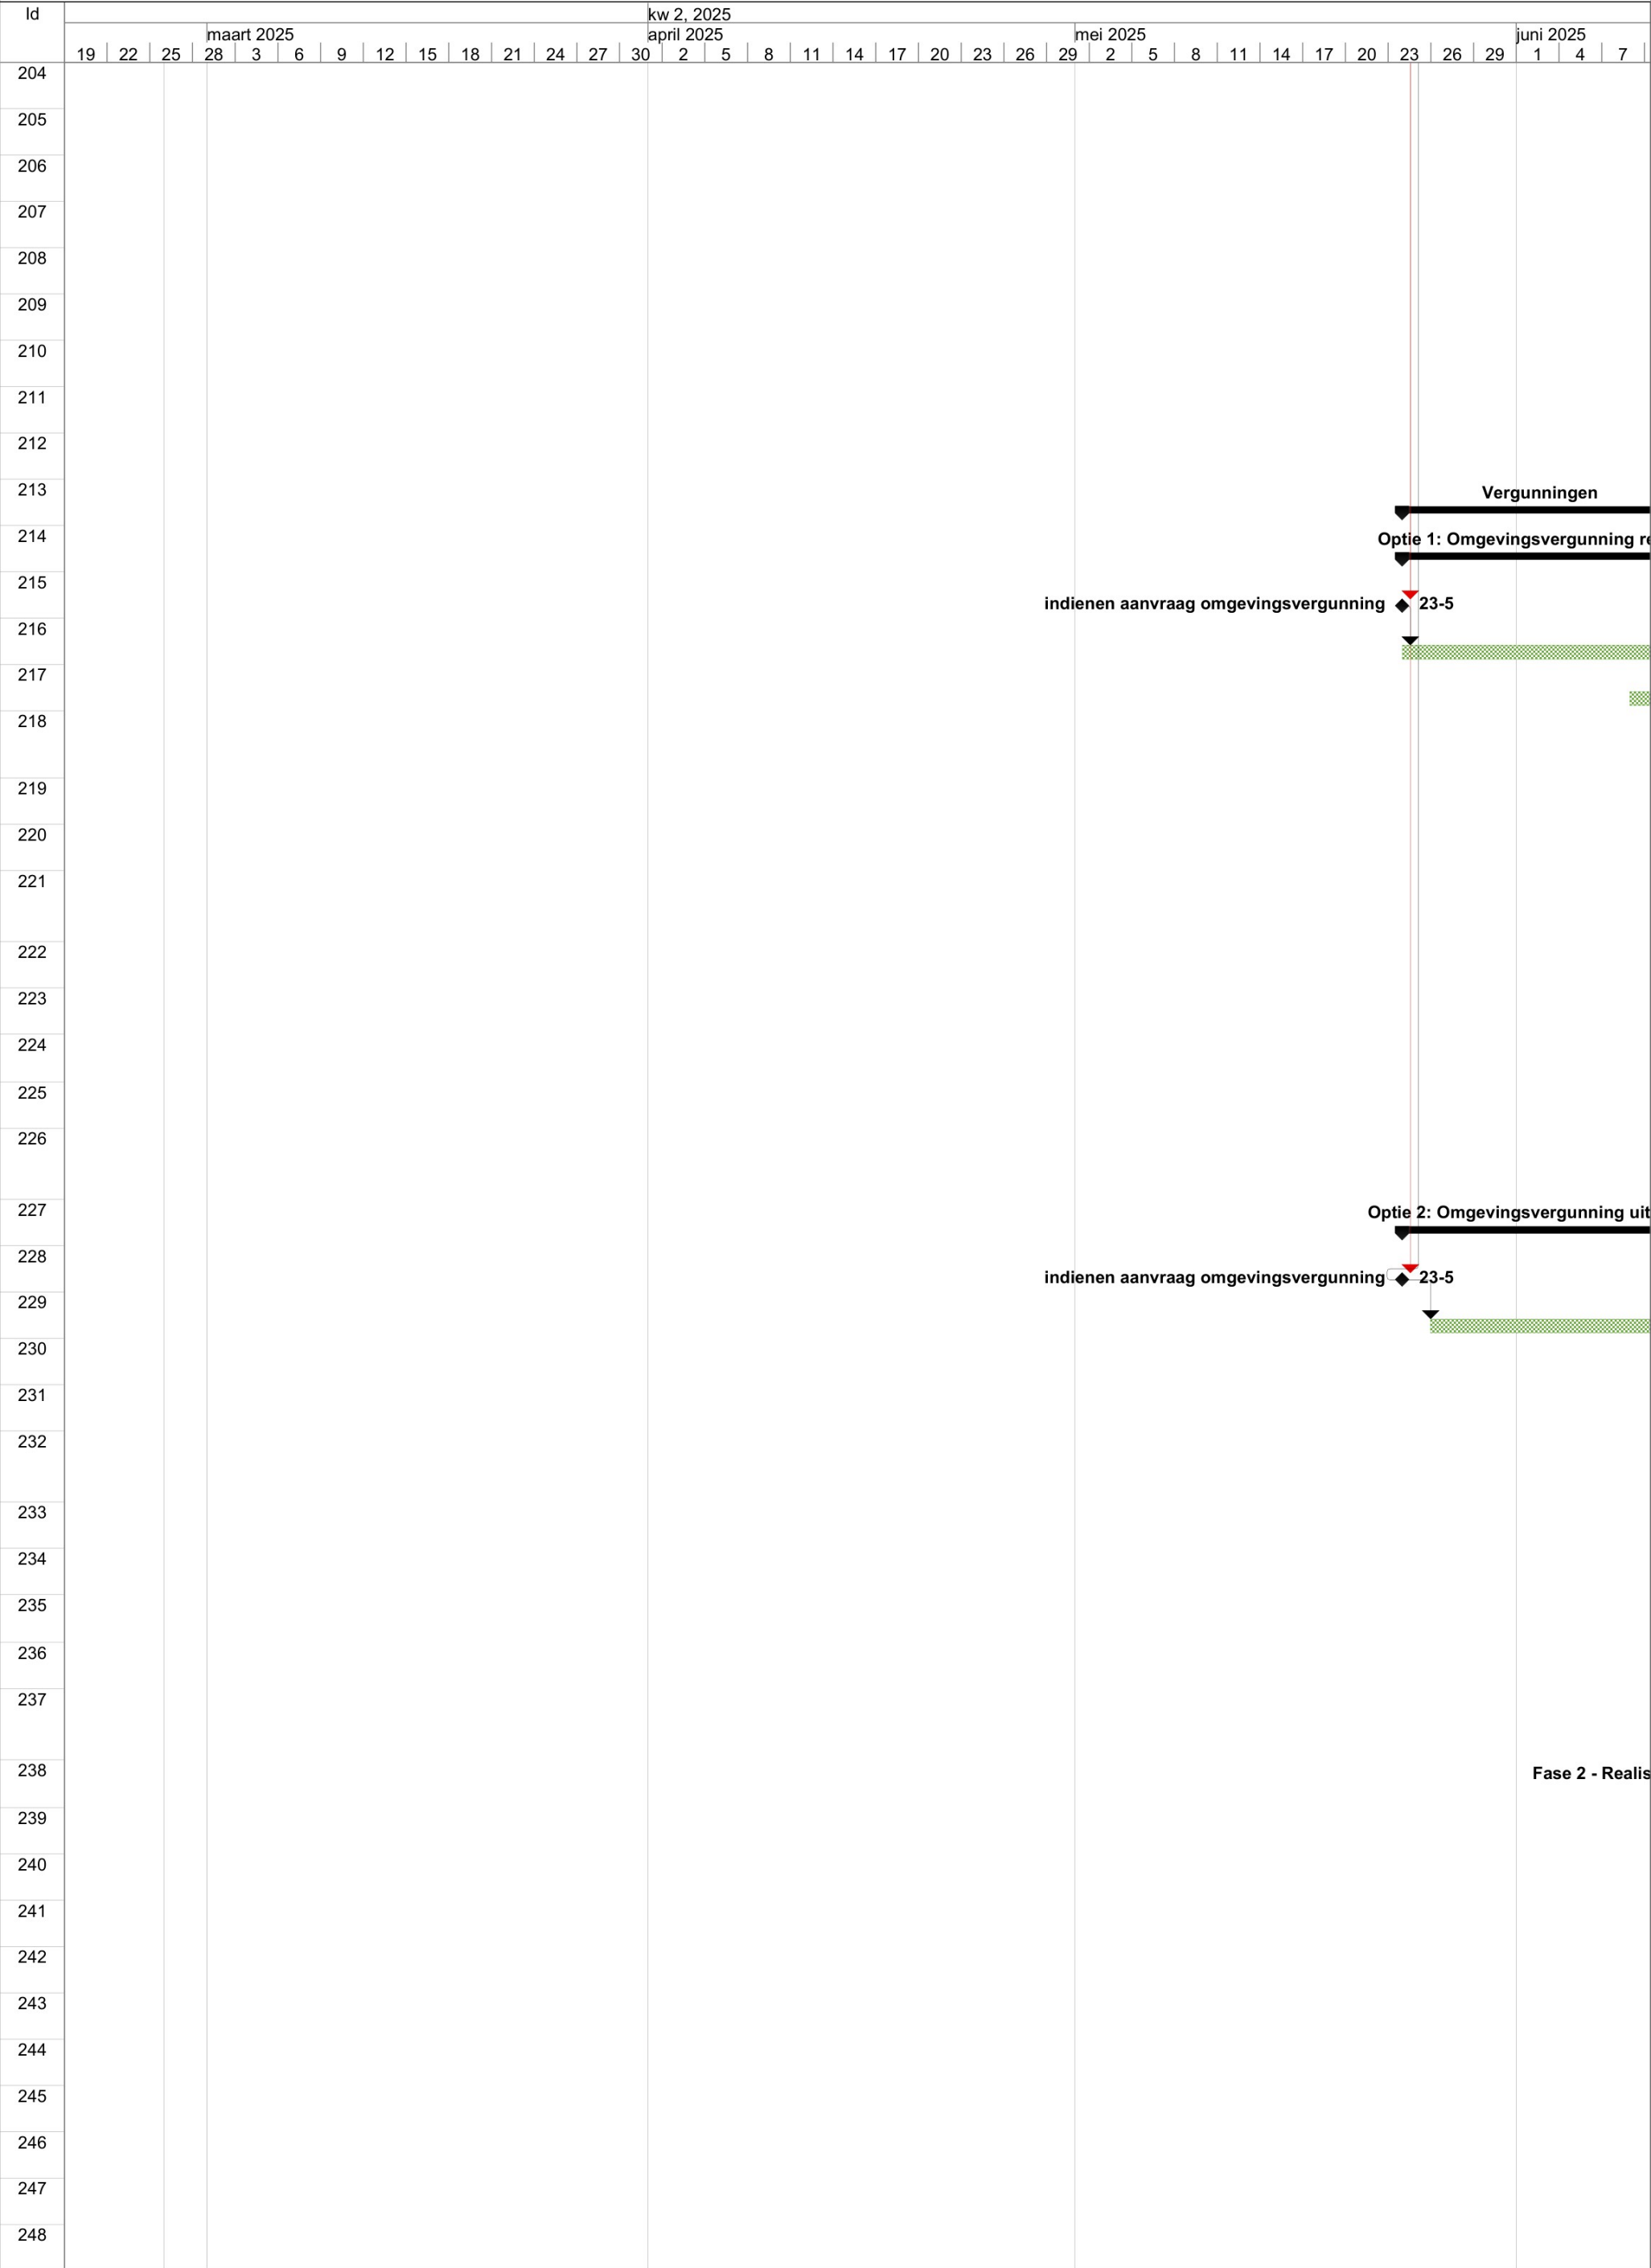





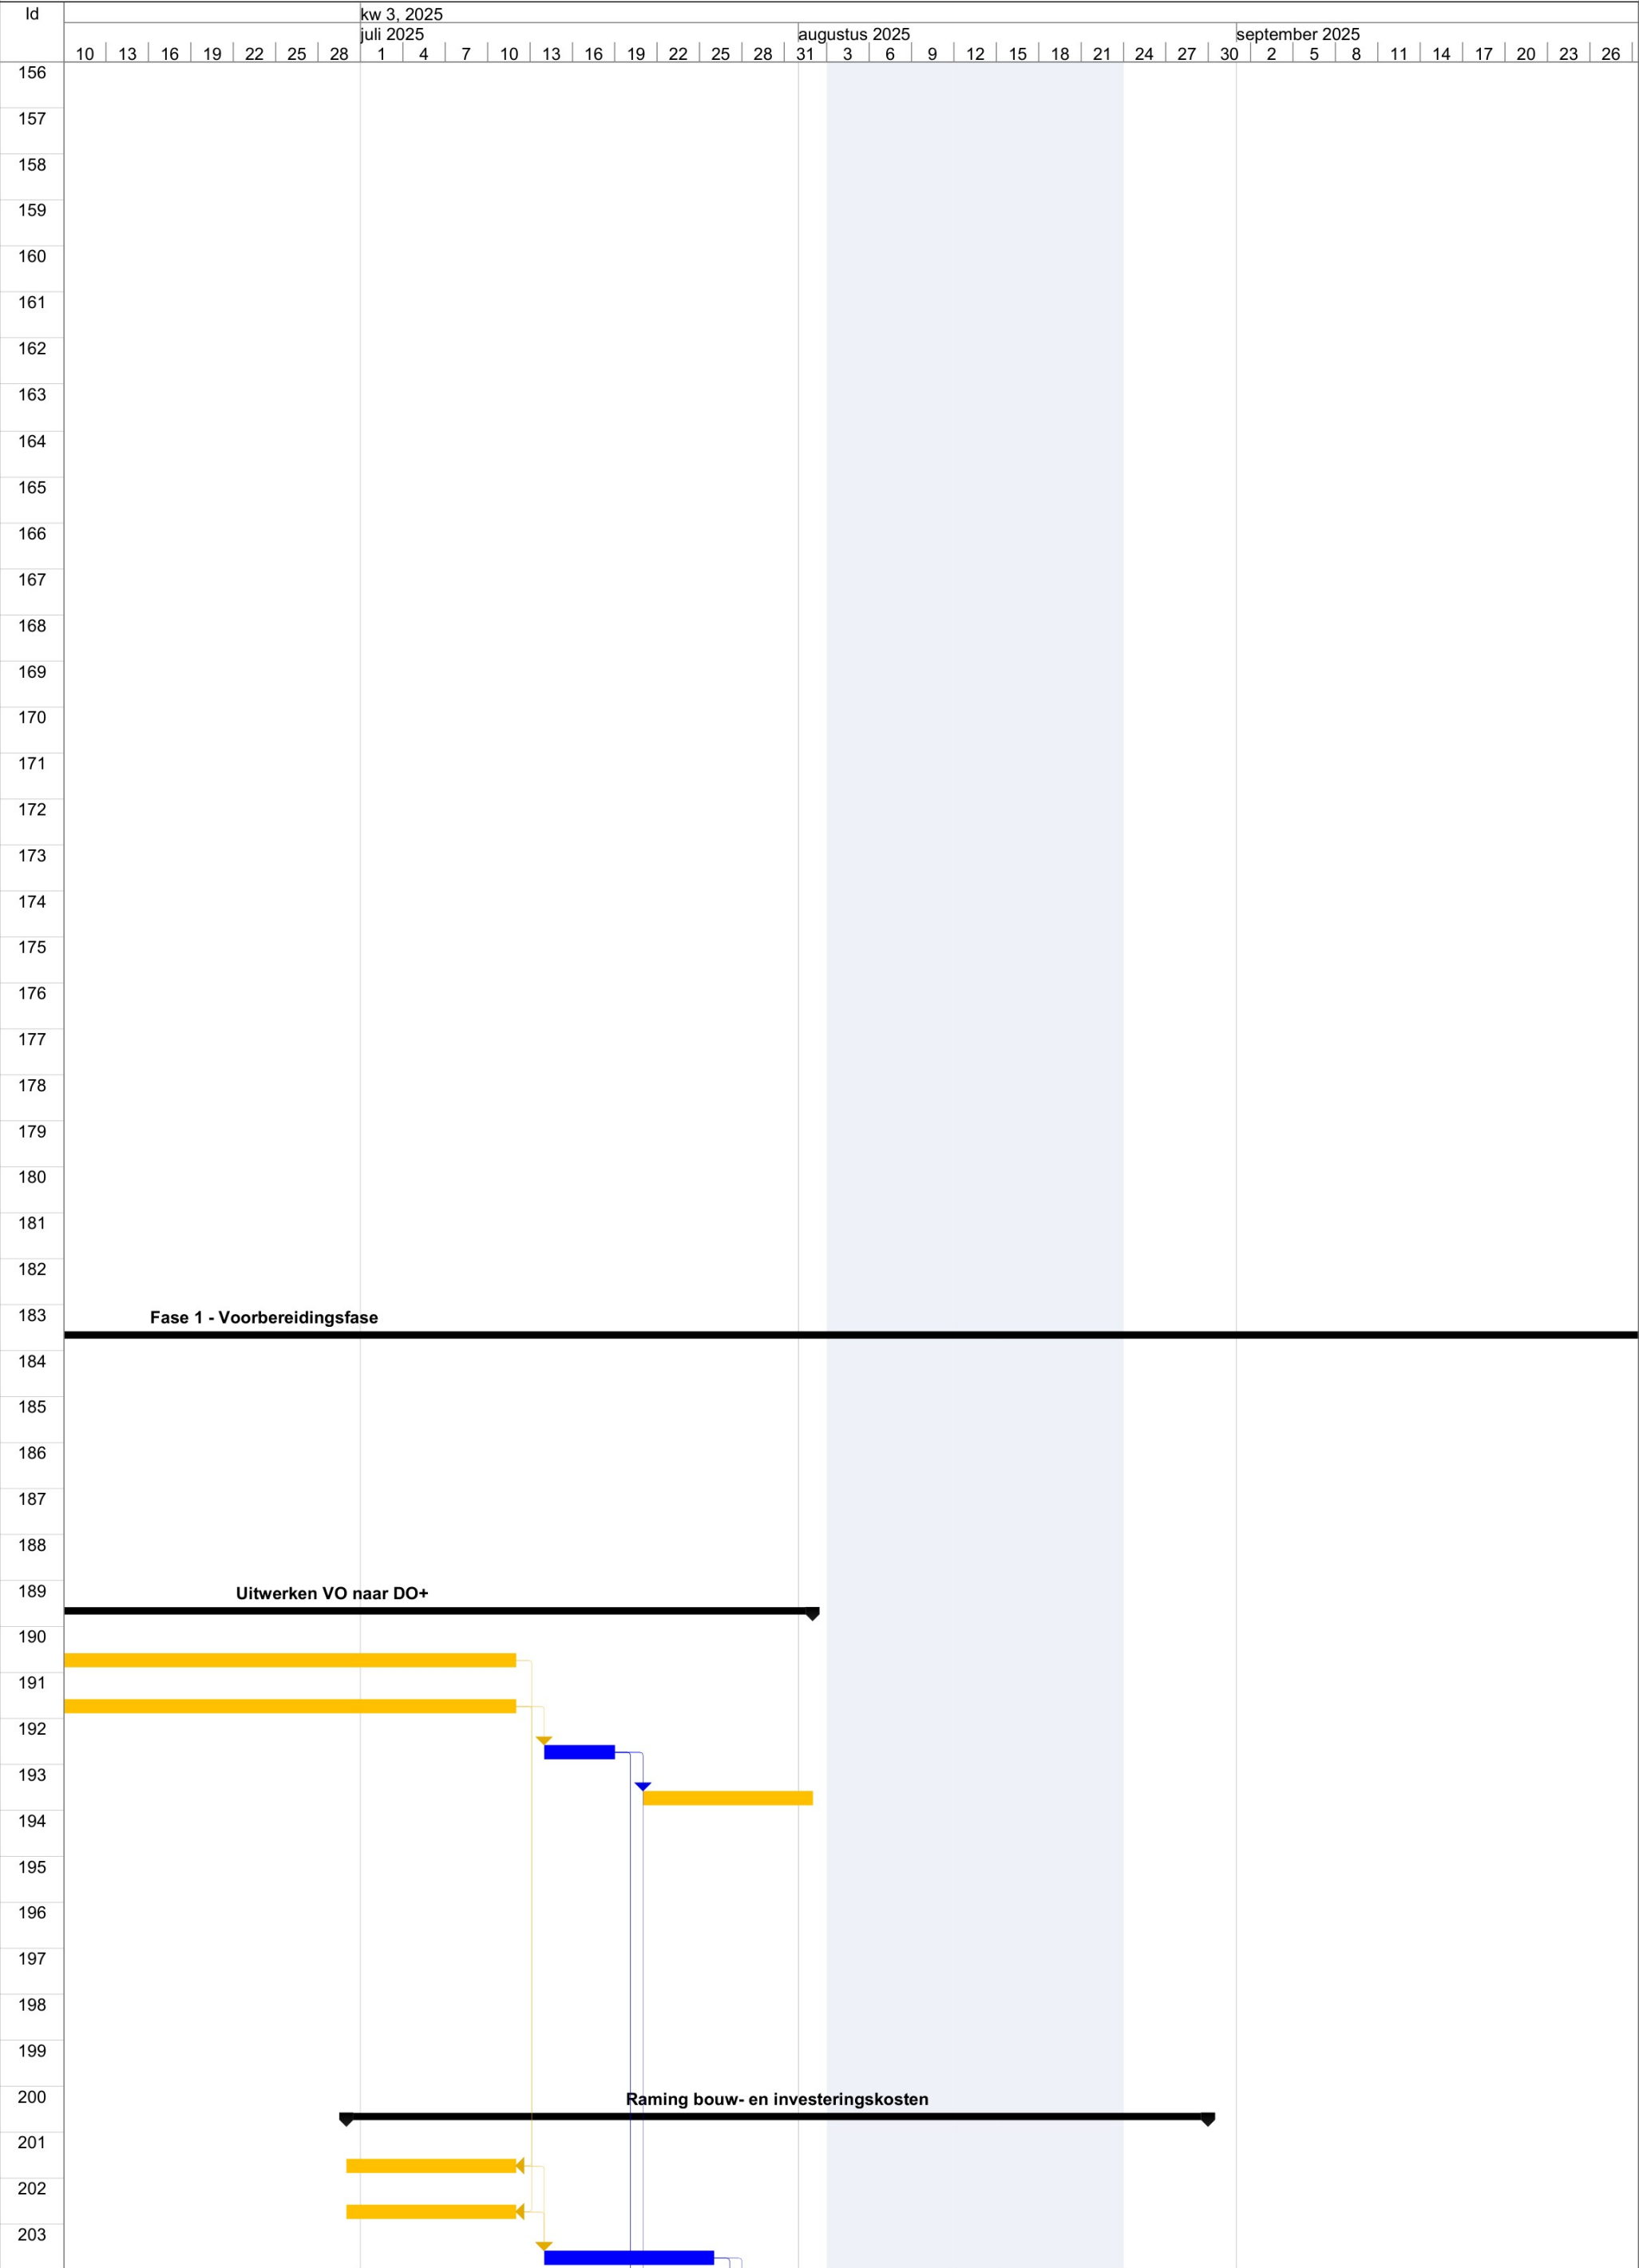

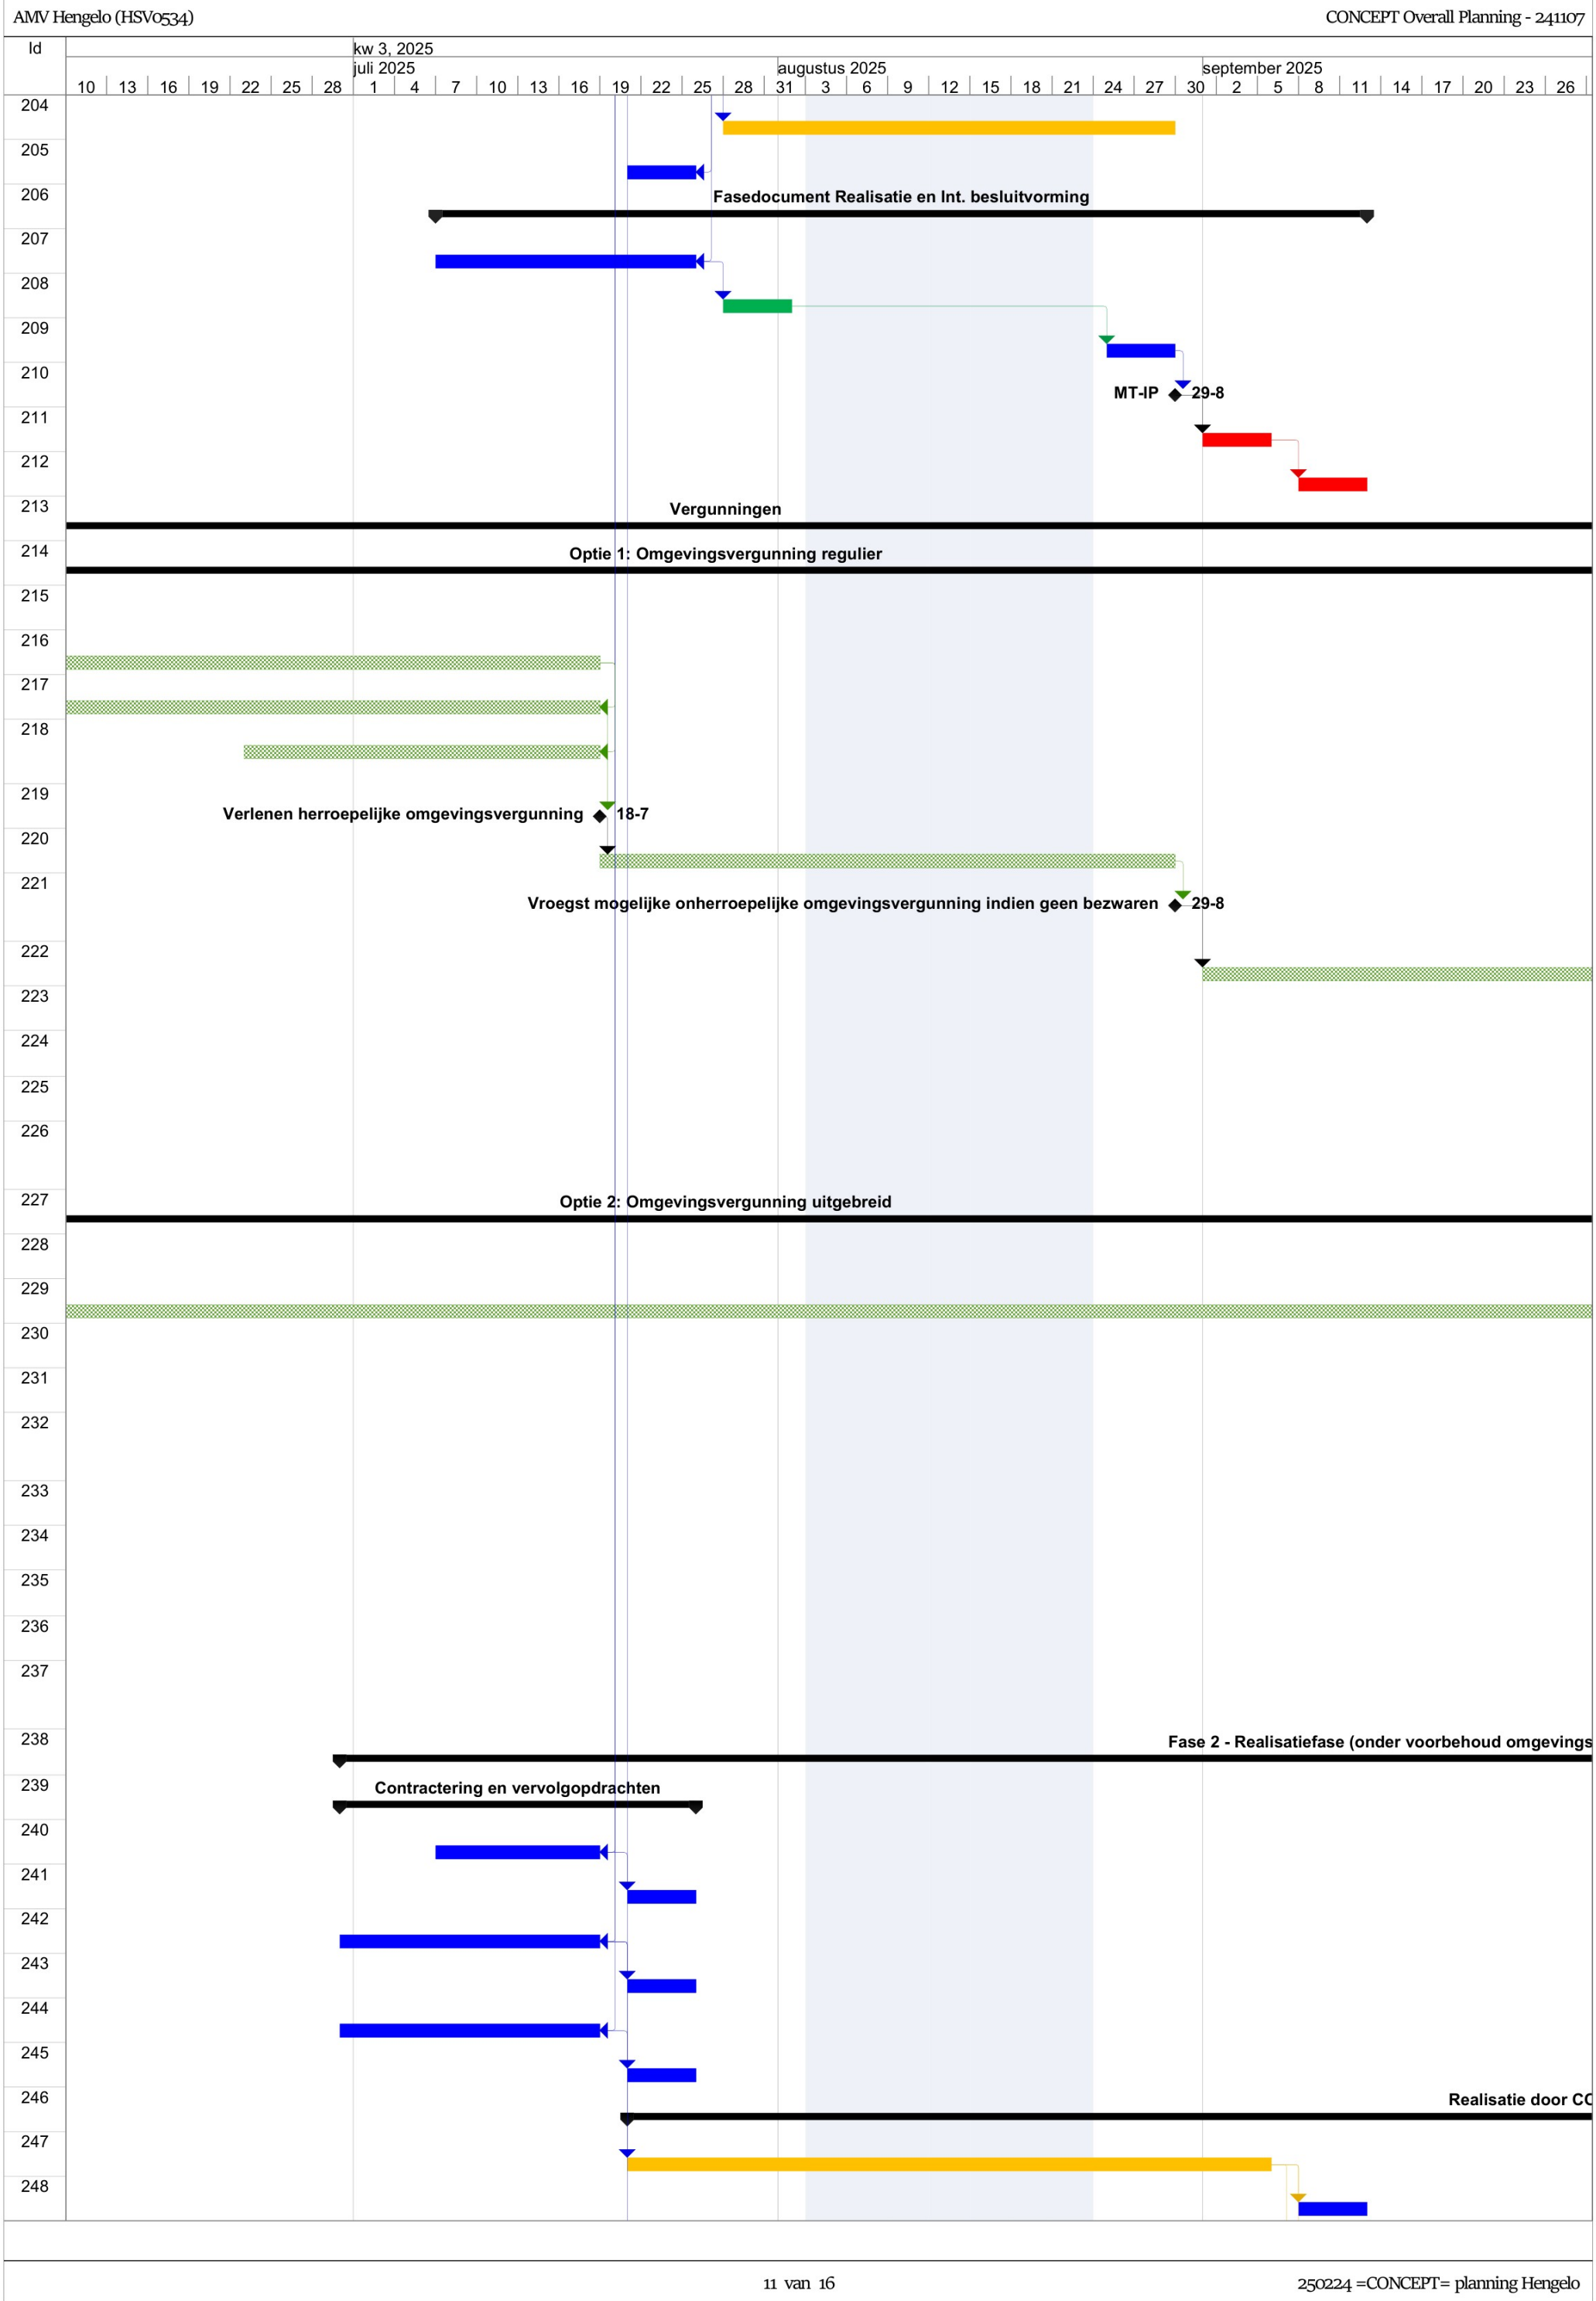





| Id  | kw 3, 2025 |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-----|------------|----|----|----|----|----|----|---------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|     | juli 2025  |    |    |    |    |    |    | augustus 2025 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | september 2025            |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|     | 10         | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1             | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12                        | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 249 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 250 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 251 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 252 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 253 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | <b>Bovengrondse en on</b> |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 254 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 255 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 256 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 257 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 258 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 259 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 260 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 261 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 262 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 263 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 264 |            |    |    |    |    |    |    |               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |







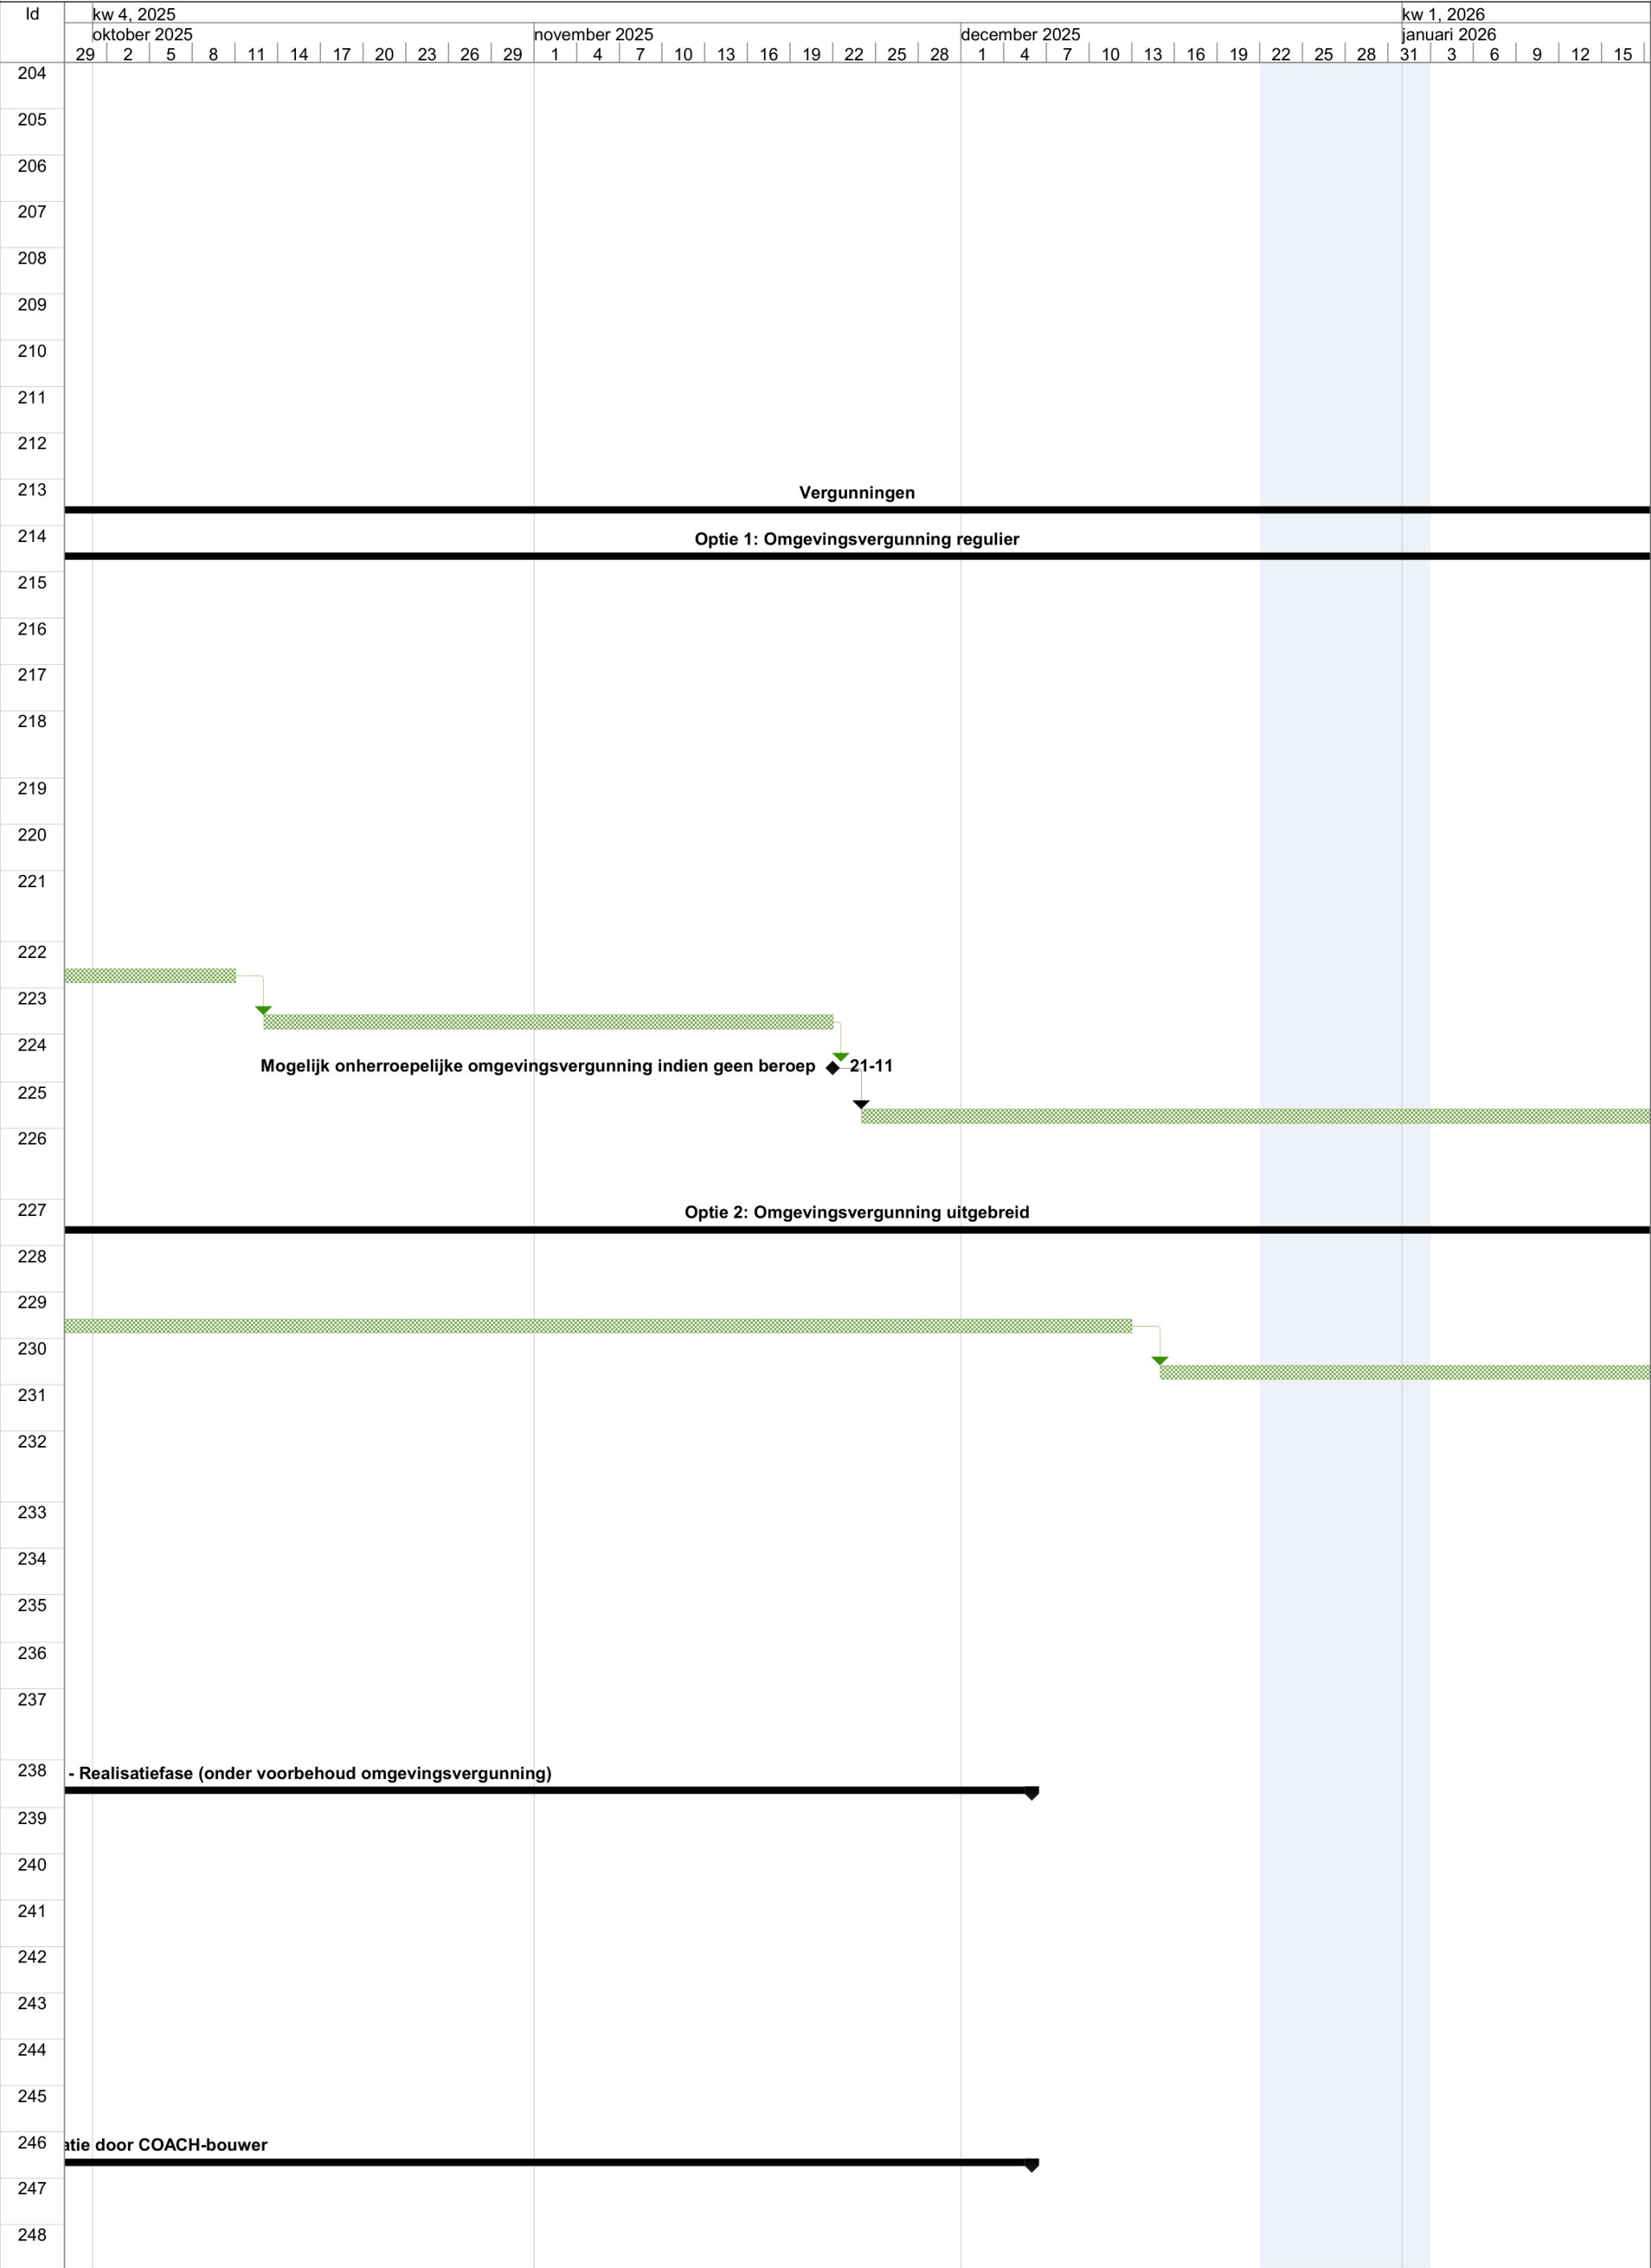

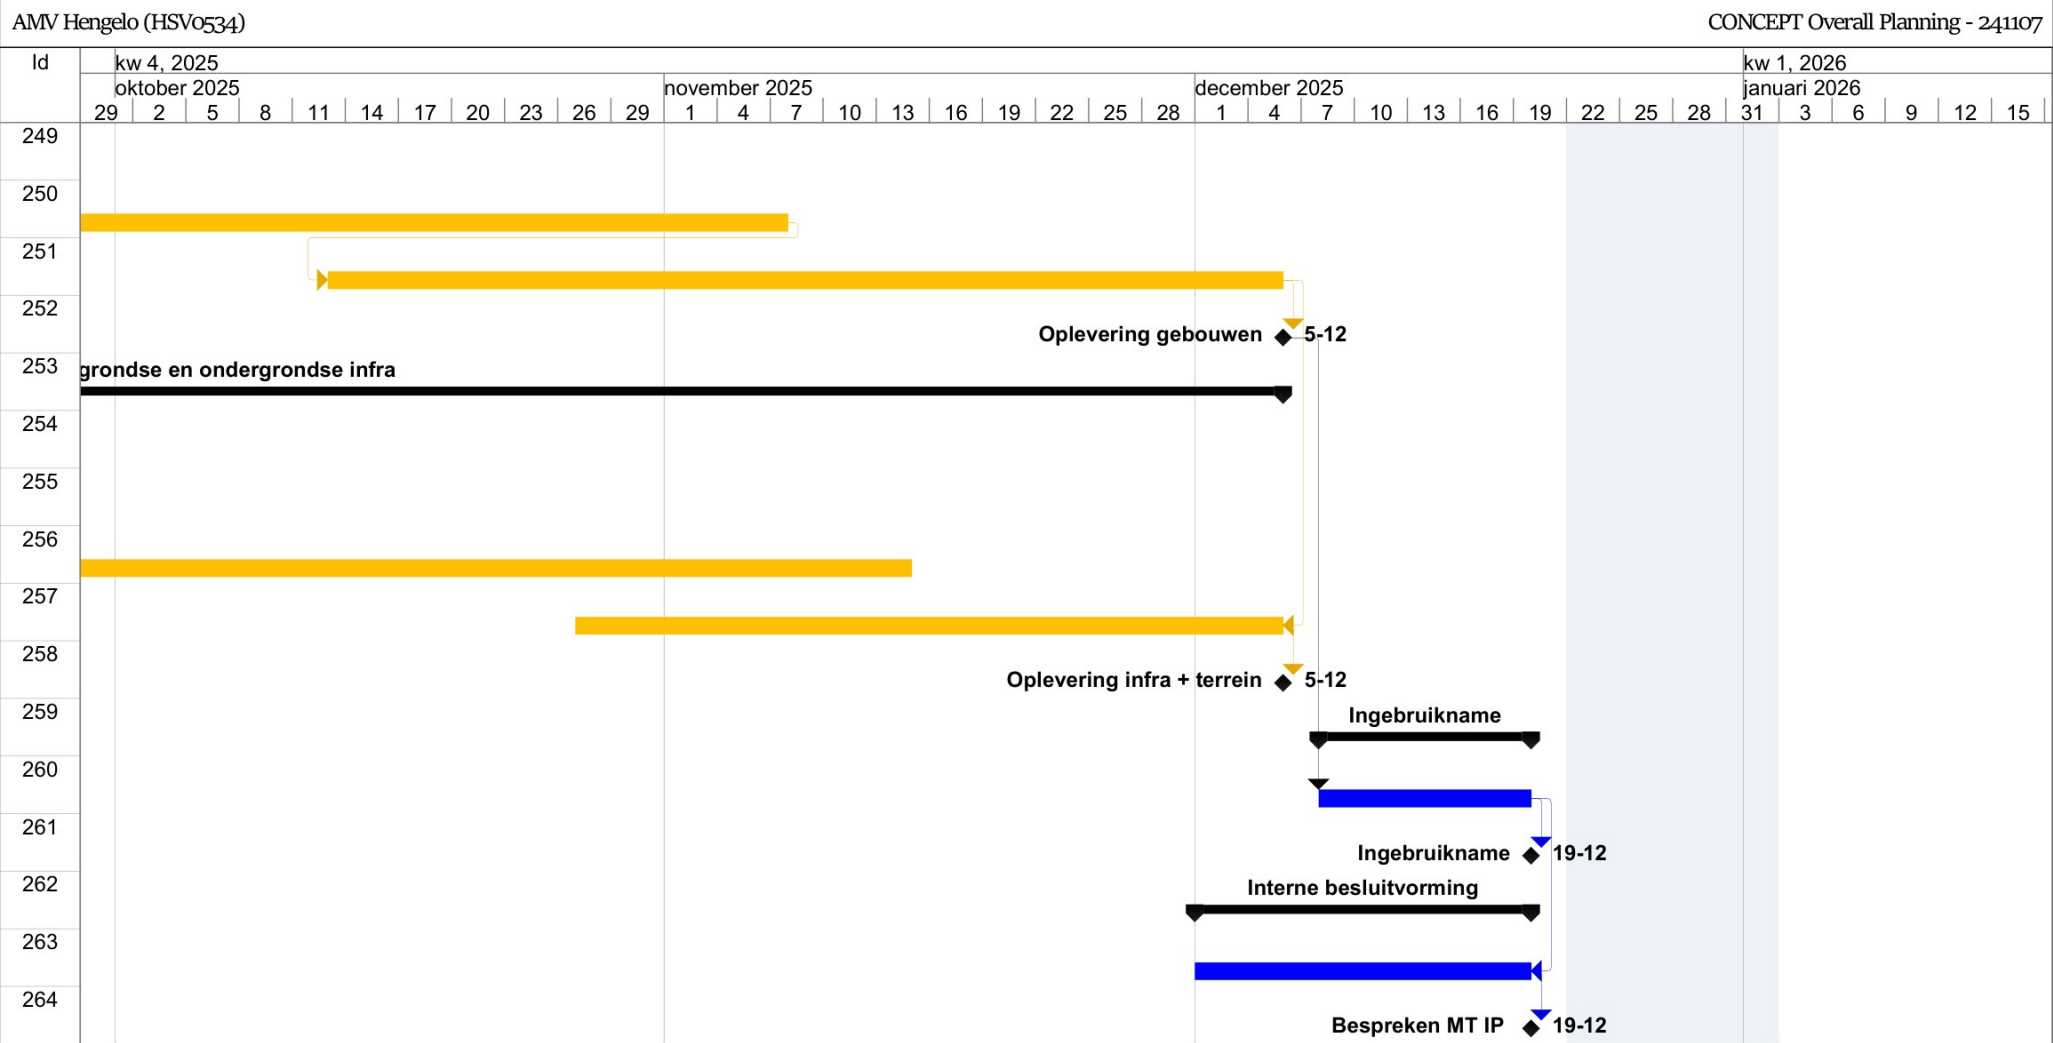

| Id | Actief | Taakmodus           | Naam                                        | Duur      | Begindatum             | Einddatum              | Voorafgaand | Overzichtsniveau | Notities |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1  | Ja     | Automatisch gepland | Politieke besluitvorming                    | 235 dagen | 27 mei 2024 08:30      | 23 mei 2025 17:00      |             | 1                |          |
| 2  | Ja     | Automatisch gepland | Politiek proces                             | 3 mndn    | 27 mei 2024 08:30      | 9 september 2024 08:30 | 3EB         | 2                |          |
| 3  | Ja     | Automatisch gepland | Ambtelijk akkoord                           | 4 vwkn    | 9 september 2024 08:30 | 7 oktober 2024 08:30   | 4EB         | 2                |          |
| 4  | Ja     | Automatisch gepland | Bestuurlijke afstemming                     | 8 vwkn    | 7 oktober 2024 08:30   | 2 december 2024 08:30  | 5EB         | 2                |          |
| 5  | Ja     | Automatisch gepland | Politieke afstemming in raad (als nodig)    | 8 wkn     | 2 december 2024 08:30  | 10 februari 2025 08:30 | 6EB         | 2                |          |
| 6  | Ja     | Automatisch gepland | Bestuurlijk akkoord                         | 4 vwkn    | 10 februari 2025 08:30 | 10 maart 2025 08:30    | 143EB;152E  | 2                |          |
| 7  | Ja     | Automatisch gepland | Verwerven of aanhuren grond                 | 12 wkn    | 3 maart 2025 08:30     | 23 mei 2025 17:00      | 228EB       | 2                |          |
| 8  | Ja     | Automatisch gepland | Initiatieffase                              | 0 dagen   | 13 februari 2024 08:30 | 13 februari 2024 08:30 |             | 1                |          |
| 9  | Ja     | Automatisch gepland | MT-IP                                       | 0 dagen   | 13 februari 2024 08:30 | 13 februari 2024 08:30 |             | 2                |          |
| 10 | Ja     | Automatisch gepland | Definitiefase                               | 309 dagen | 13 februari 2024 08:30 | 23 mei 2025 17:00      |             | 1                |          |
| 11 | Ja     | Automatisch gepland | Vertraging door overdracht dossier          | 175 dagen | 13 februari 2024 08:30 | 4 november 2024 17:00  | 9           | 2                |          |
| 12 | Ja     | Automatisch gepland | RO onderzoeken                              | 129 dagen | 24 oktober 2024 08:30  | 6 mei 2025 17:00       |             | 2                |          |
| 13 | Ja     | Automatisch gepland | Flora & Fauna (Civil Man.)                  | 23 dagen  | 24 oktober 2024 08:30  | 25 november 2024 17:00 |             | 3                |          |
| 14 | Ja     | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                            | 0 dagen   | 24 oktober 2024 08:30  | 24 oktober 2024 08:30  |             | 4                |          |
| 15 | Ja     | Automatisch gepland | Offerte                                     | 6 dagen   | 24 oktober 2024 08:30  | 31 oktober 2024 17:00  | 14          | 4                |          |
| 16 | Ja     | Automatisch gepland | Beoordeling                                 | 5 dagen   | 1 november 2024 08:30  | 7 november 2024 17:00  | 15          | 4                |          |
| 17 | Ja     | Automatisch gepland | Opdracht                                    | 0 dagen   | 7 november 2024 17:00  | 7 november 2024 17:00  | 16          | 4                |          |
| 18 | Ja     | Automatisch gepland | Vorbereiding                                | 2 dagen   | 8 november 2024 08:30  | 11 november 2024 17:00 | 17          | 4                |          |
| 19 | Ja     | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage           | 10 dagen  | 12 november 2024 08:30 | 25 november 2024 17:00 | 18          | 4                |          |
| 20 | Ja     | Automatisch gepland | Rapportage                                  | 0 dagen   | 25 november 2024 17:00 | 25 november 2024 17:00 | 19          | 4                |          |
| 21 | Ja     | Automatisch gepland | Milieukundig bodemonderzoek (Civil Man.)    | 38 dagen  | 8 november 2024 08:30  | 14 januari 2025 17:00  |             | 3                |          |
| 22 | Ja     | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                            | 0 dagen   | 8 november 2024 08:30  | 8 november 2024 08:30  |             | 4                |          |
| 23 | Ja     | Automatisch gepland | Offerte                                     | 6 dagen   | 8 november 2024 08:30  | 15 november 2024 17:00 | 22          | 4                |          |
| 24 | Ja     | Automatisch gepland | Beoordeling                                 | 5 dagen   | 18 november 2024 08:30 | 22 november 2024 17:00 | 23          | 4                |          |
| 25 | Ja     | Automatisch gepland | Opdracht                                    | 0 dagen   | 22 november 2024 17:00 | 22 november 2024 17:00 | 24          | 4                |          |
| 26 | Ja     | Automatisch gepland | Vorbereiding                                | 10 dagen  | 25 november 2024 08:30 | 6 december 2024 17:00  | 25          | 4                |          |
| 27 | Ja     | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage           | 17 dagen  | 9 december 2024 08:30  | 14 januari 2025 17:00  | 26          | 4                |          |
| 28 | Ja     | Automatisch gepland | Rapportage                                  | 0 dagen   | 14 januari 2025 17:00  | 14 januari 2025 17:00  | 27          | 4                |          |
| 29 | Ja     | Automatisch gepland | Archeologie & cultuurhistorie               | 45 dagen  | 5 maart 2025 08:30     | 6 mei 2025 17:00       |             | 3                |          |
| 30 | Ja     | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                            | 0 dagen   | 5 maart 2025 08:30     | 5 maart 2025 08:30     |             | 4                |          |
| 31 | Ja     | Automatisch gepland | Offerte                                     | 10 dagen  | 5 maart 2025 08:30     | 18 maart 2025 17:00    | 30          | 4                |          |
| 32 | Ja     | Automatisch gepland | Beoordeling                                 | 5 dagen   | 19 maart 2025 08:30    | 25 maart 2025 17:00    | 31          | 4                |          |
| 33 | Ja     | Automatisch gepland | Opdracht                                    | 0 dagen   | 25 maart 2025 17:00    | 25 maart 2025 17:00    | 32          | 4                |          |
| 34 | Ja     | Automatisch gepland | Vorbereiding                                | 10 dagen  | 26 maart 2025 08:30    | 8 april 2025 17:00     | 33          | 4                |          |
| 35 | Ja     | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage           | 20 dagen  | 9 april 2025 08:30     | 6 mei 2025 17:00       | 34          | 4                |          |
| 36 | Ja     | Automatisch gepland | Rapportage                                  | 0 dagen   | 6 mei 2025 17:00       | 6 mei 2025 17:00       | 35          | 4                |          |
| 37 | Ja     | Automatisch gepland | Omgevingsgeluid t.g.v. AMV (Aveco de Bondt) | 17 dagen  | 20 februari 2025 08:30 | 14 maart 2025 17:00    |             | 3                |          |
| 38 | Ja     | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                            | 0 dagen   | 20 februari 2025 08:30 | 20 februari 2025 08:30 |             | 4                |          |
| 39 | Ja     | Automatisch gepland | Offerte                                     | 2 dagen   | 20 februari 2025 08:30 | 21 februari 2025 17:00 | 38          | 4                |          |
| 40 | Ja     | Automatisch gepland | Beoordeling                                 | 1 dag     | 24 februari 2025 08:30 | 24 februari 2025 17:00 | 39          | 4                |          |
| 41 | Ja     | Automatisch gepland | Opdracht                                    | 0 dagen   | 24 februari 2025 17:00 | 24 februari 2025 17:00 | 40          | 4                |          |
| 42 | Ja     | Automatisch gepland | Vorbereiding                                | 5 dagen   | 25 februari 2025 08:30 | 3 maart 2025 17:00     | 41          | 4                |          |
| 43 | Ja     | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage           | 9 dagen   | 4 maart 2025 08:30     | 14 maart 2025 17:00    | 42          | 4                |          |
| 44 | Ja     | Automatisch gepland | Rapportage                                  | 0 dagen   | 14 maart 2025 17:00    | 14 maart 2025 17:00    | 43          | 4                |          |
| 45 | Ja     | Automatisch gepland | Waterparagraaf (Civil Man.)                 | 46 dagen  | 7 februari 2025 08:30  | 11 april 2025 17:00    |             | 3                |          |
| 46 | Ja     | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                            | 0 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 7 februari 2025 08:30  |             | 4                |          |
| 47 | Ja     | Automatisch gepland | Offerte                                     | 6 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 46          | 4                |          |
| 48 | Ja     | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                          | 10 dagen  | 17 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 47          | 4                |          |



|    |    |                     |                                    |           |                        |                        |    |   |
|----|----|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----|---|
| 49 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 48 | 4 |
| 50 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 10 dagen  | 3 maart 2025 08:30     | 14 maart 2025 17:00    | 49 | 4 |
| 51 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 20 dagen  | 17 maart 2025 08:30    | 11 april 2025 17:00    | 50 | 4 |
| 52 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 11 april 2025 17:00    | 11 april 2025 17:00    | 51 | 4 |
| 53 | Ja | Automatisch gepland | Stikstofdepositie                  | 40 dagen  | 7 februari 2025 08:30  | 3 april 2025 17:00     |    | 3 |
| 54 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 7 februari 2025 08:30  |    | 4 |
| 55 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 6 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 54 | 4 |
| 56 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                 | 10 dagen  | 17 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 55 | 4 |
| 57 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 56 | 4 |
| 58 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 10 dagen  | 3 maart 2025 08:30     | 14 maart 2025 17:00    | 57 | 4 |
| 59 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 14 dagen  | 17 maart 2025 08:30    | 3 april 2025 17:00     | 58 | 4 |
| 60 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 3 april 2025 17:00     | 3 april 2025 17:00     | 59 | 4 |
| 61 | Ja | Automatisch gepland | Verkeerskundig onderzoek           | 45 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       |    | 3 |
| 62 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 4 maart 2025 08:30     | 4 maart 2025 08:30     |    | 4 |
| 63 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 10 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 17 maart 2025 17:00    | 62 | 4 |
| 64 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                        | 5 dagen   | 18 maart 2025 08:30    | 24 maart 2025 17:00    | 63 | 4 |
| 65 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 24 maart 2025 17:00    | 24 maart 2025 17:00    | 64 | 4 |
| 66 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 10 dagen  | 25 maart 2025 08:30    | 7 april 2025 17:00     | 65 | 4 |
| 67 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 20 dagen  | 8 april 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       | 66 | 4 |
| 68 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 5 mei 2025 17:00       | 5 mei 2025 17:00       | 67 | 4 |
| 69 | Ja | Automatisch gepland | Inmeting terrein (Civil Man.)      | 31 dagen  | 7 februari 2025 08:30  | 21 maart 2025 17:00    |    | 3 |
| 70 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 7 februari 2025 08:30  |    | 4 |
| 71 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 6 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 70 | 4 |
| 72 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                 | 10 dagen  | 17 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 71 | 4 |
| 73 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 72 | 4 |
| 74 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 10 dagen  | 3 maart 2025 08:30     | 14 maart 2025 17:00    | 73 | 4 |
| 75 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 5 dagen   | 17 maart 2025 08:30    | 21 maart 2025 17:00    | 74 | 4 |
| 76 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 21 maart 2025 17:00    | 21 maart 2025 17:00    | 75 | 4 |
| 77 | Ja | Automatisch gepland | Kabels & leidingen (CLICK-melding) | 31 dagen  | 7 februari 2025 08:30  | 21 maart 2025 17:00    |    | 3 |
| 78 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 7 februari 2025 08:30  |    | 4 |
| 79 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 6 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 78 | 4 |
| 80 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                 | 10 dagen  | 17 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 79 | 4 |
| 81 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 80 | 4 |
| 82 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 10 dagen  | 3 maart 2025 08:30     | 14 maart 2025 17:00    | 81 | 4 |
| 83 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 5 dagen   | 17 maart 2025 08:30    | 21 maart 2025 17:00    | 82 | 4 |
| 84 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 21 maart 2025 17:00    | 21 maart 2025 17:00    | 83 | 4 |
| 85 | Ja | Automatisch gepland | Nutsvoorzieningen                  | 120 dagen | 4 november 2024 17:00  | 5 mei 2025 17:00       |    | 3 |
| 86 | Ja | Automatisch gepland | Netbeheerder                       | 55 dagen  | 4 november 2024 17:00  | 3 februari 2025 17:00  |    | 4 |
| 87 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 4 november 2024 17:00  | 4 november 2024 17:00  | 11 | 5 |
| 88 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 10 dagen  | 5 november 2024 08:30  | 18 november 2024 17:00 | 87 | 5 |
| 89 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                        | 5 dagen   | 19 november 2024 08:30 | 25 november 2024 17:00 | 88 | 5 |
| 90 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                           | 0 dagen   | 25 november 2024 17:00 | 25 november 2024 17:00 | 89 | 5 |
| 91 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                      | 20 dagen  | 26 november 2024 08:30 | 6 januari 2025 17:00   | 90 | 5 |
| 92 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage  | 20 dagen  | 7 januari 2025 08:30   | 3 februari 2025 17:00  | 91 | 5 |
| 93 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                         | 0 dagen   | 3 februari 2025 17:00  | 3 februari 2025 17:00  | 92 | 5 |
| 94 | Ja | Automatisch gepland | Waterleidingbedrijf                | 45 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       |    | 4 |
| 95 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                   | 0 dagen   | 4 maart 2025 08:30     | 4 maart 2025 08:30     |    | 5 |
| 96 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                            | 10 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 17 maart 2025 17:00    | 95 | 5 |
| 97 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                        | 5 dagen   | 18 maart 2025 08:30    | 24 maart 2025 17:00    | 96 | 5 |



|     |    |                     |                                                                                                                                                                                    |           |                        |                        |               |   |
|-----|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------|---|
| 98  | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 24 maart 2025 17:00    | 24 maart 2025 17:00    | 97            | 5 |
| 99  | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                                                                                                                                                                      | 10 dagen  | 25 maart 2025 08:30    | 7 april 2025 17:00     | 98;124;129;15 |   |
| 100 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage                                                                                                                                                  | 20 dagen  | 8 april 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       | 99            | 5 |
| 101 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                                                                                                                                                                         | 0 dagen   | 5 mei 2025 17:00       | 5 mei 2025 17:00       | 100           | 5 |
| 102 | Ja | Automatisch gepland | Riolering                                                                                                                                                                          | 45 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       |               | 4 |
| 103 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 4 maart 2025 08:30     | 4 maart 2025 08:30     |               | 5 |
| 104 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 10 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 17 maart 2025 17:00    | 103           | 5 |
| 105 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                                                                                                                                                                        | 5 dagen   | 18 maart 2025 08:30    | 24 maart 2025 17:00    | 104           | 5 |
| 106 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 24 maart 2025 17:00    | 24 maart 2025 17:00    | 105           | 5 |
| 107 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                                                                                                                                                                      | 10 dagen  | 25 maart 2025 08:30    | 7 april 2025 17:00     | 106           | 5 |
| 108 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage                                                                                                                                                  | 20 dagen  | 8 april 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       | 107           | 5 |
| 109 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                                                                                                                                                                         | 0 dagen   | 5 mei 2025 17:00       | 5 mei 2025 17:00       | 108           | 5 |
| 110 | Ja | Automatisch gepland | Glasvezel                                                                                                                                                                          | 45 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       |               | 4 |
| 111 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 4 maart 2025 08:30     | 4 maart 2025 08:30     |               | 5 |
| 112 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 10 dagen  | 4 maart 2025 08:30     | 17 maart 2025 17:00    | 111           | 5 |
| 113 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                                                                                                                                                                        | 5 dagen   | 18 maart 2025 08:30    | 24 maart 2025 17:00    | 112           | 5 |
| 114 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 24 maart 2025 17:00    | 24 maart 2025 17:00    | 113           | 5 |
| 115 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                                                                                                                                                                      | 10 dagen  | 25 maart 2025 08:30    | 7 april 2025 17:00     | 114           | 5 |
| 116 | Ja | Automatisch gepland | Uitvoering onderzoek + rapportage                                                                                                                                                  | 20 dagen  | 8 april 2025 08:30     | 5 mei 2025 17:00       | 115           | 5 |
| 117 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage                                                                                                                                                                         | 0 dagen   | 5 mei 2025 17:00       | 5 mei 2025 17:00       | 116           | 5 |
| 118 | Ja | Automatisch gepland | Voorlopig ontwerp (VO)                                                                                                                                                             | 205 dagen | 8 juli 2024 08:30      | 23 mei 2025 17:00      |               | 2 |
| 119 | Ja | Automatisch gepland | VO Selectie adviseurs                                                                                                                                                              | 40 dagen  | 13 januari 2025 08:30  | 7 maart 2025 17:00     |               | 3 |
| 120 | Ja | Automatisch gepland | Architect  &  | 30 dagen  | 13 januari 2025 08:30  | 21 februari 2025 17:00 |               | 4 |
| 121 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 13 januari 2025 08:30  | 13 januari 2025 08:30  |               | 5 |
| 122 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 5 wkn     | 13 januari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 121           | 5 |
| 123 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                                                                                                                                                                 | 5 dagen   | 17 februari 2025 08:30 | 21 februari 2025 17:00 | 122           | 5 |
| 124 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 21 februari 2025 17:00 | 21 februari 2025 17:00 | 123           | 5 |
| 125 | Ja | Automatisch gepland | Landschapsarchitect (Civil Man.)                                                                                                                                                   | 16 dagen  | 7 februari 2025 08:30  | 28 februari 2025 17:00 |               | 4 |
| 126 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 7 februari 2025 08:30  |               | 5 |
| 127 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 6 dagen   | 7 februari 2025 08:30  | 14 februari 2025 17:00 | 126           | 5 |
| 128 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                                                                                                                                                                 | 10 dagen  | 17 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 127           | 5 |
| 129 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 128           | 5 |
| 130 | Ja | Automatisch gepland | Adv. Technische installaties (Aveco de Bondt)                                                                                                                                      | 18 dagen  | 12 februari 2025 08:30 | 7 maart 2025 17:00     |               | 4 |
| 131 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 12 februari 2025 08:30 | 12 februari 2025 08:30 |               | 5 |
| 132 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 13 dagen  | 12 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 131           | 5 |
| 133 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling + BAFO                                                                                                                                                                 | 5 dagen   | 3 maart 2025 08:30     | 7 maart 2025 17:00     | 132           | 5 |
| 134 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 7 maart 2025 17:00     | 7 maart 2025 17:00     | 133           | 5 |
| 135 | Ja | Automatisch gepland | Adv. bouwfysica en brandveiligheid                                                                                                                                                 | 18 dagen  | 12 februari 2025 08:30 | 7 maart 2025 17:00     |               | 4 |
| 136 | Ja | Automatisch gepland | Aanvraag offerte                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 12 februari 2025 08:30 | 12 februari 2025 08:30 |               | 5 |
| 137 | Ja | Automatisch gepland | Offerte                                                                                                                                                                            | 13 dagen  | 12 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 136           | 5 |
| 138 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                                                                                                                                                                        | 5 dagen   | 3 maart 2025 08:30     | 7 maart 2025 17:00     | 137           | 5 |
| 139 | Ja | Automatisch gepland | Opdracht                                                                                                                                                                           | 0 dagen   | 7 maart 2025 17:00     | 7 maart 2025 17:00     | 138           | 5 |
| 140 | Ja | Automatisch gepland | Voorontwerp (VO)                                                                                                                                                                   | 54 dagen  | 28 januari 2025 08:30  | 11 april 2025 17:00    |               | 3 |
| 141 | Ja | Automatisch gepland | Analyse PvE + ontwikkeling typologie                                                                                                                                               | 2 wkn     | 28 januari 2025 08:30  | 10 februari 2025 17:00 | 121BE+11d     | 4 |
| 142 | Ja | Automatisch gepland | Opstellen overzicht m2 - nvo   bvo   terrein                                                                                                                                       | 1 wk      | 4 februari 2025 08:30  | 10 februari 2025 17:00 | 141GE         | 4 |
| 143 | Ja | Automatisch gepland | Structuurontwerp + typologie                                                                                                                                                       | 14 dagen  | 11 februari 2025 08:30 | 28 februari 2025 17:00 | 141           | 4 |
| 144 | Ja | Automatisch gepland | Studie naar gemeente                                                                                                                                                               | 0 dagen   | 28 februari 2025 17:00 | 28 februari 2025 17:00 | 143GE         | 4 |
| 145 | Ja | Automatisch gepland | Overleg gemeente                                                                                                                                                                   | 0 dagen   | 4 maart 2025 17:00     | 4 maart 2025 17:00     | 144BE+2d      | 4 |
| 146 | Ja | Automatisch gepland | Overleg klankbordgroep omwonenden                                                                                                                                                  | 0 dagen   | 19 maart 2025 17:00    | 19 maart 2025 17:00    | 145BE+11d     | 4 |

|     |    |                     |                                                    |           |                     |                       |         |   |
|-----|----|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|---|
| 147 | Ja | Automatisch gepland | VO bouwkundig + integraal                          | 6 wkn     | 3 maart 2025 08:30  | 11 april 2025 17:00   | 143     | 4 |
| 148 | Ja | Automatisch gepland | VO constructies                                    | 4 wkn     | 17 maart 2025 08:30 | 11 april 2025 17:00   | 147GE   | 4 |
| 149 | Ja | Automatisch gepland | VO technische installaties                         | 4 wkn     | 17 maart 2025 08:30 | 11 april 2025 17:00   | 147GE   | 4 |
| 150 | Ja | Automatisch gepland | VO terrein                                         | 30 dagen  | 3 maart 2025 08:30  | 11 april 2025 17:00   |         | 3 |
| 151 | Ja | Automatisch gepland | Analyse PvE                                        | 5 dagen   | 3 maart 2025 08:30  | 10 maart 2025 08:30   | 152EB   | 4 |
| 152 | Ja | Automatisch gepland | Structuurontwerp terrein en overzicht m2 en voorzi | 5 dagen   | 10 maart 2025 08:30 | 17 maart 2025 08:30   | 153EB   | 4 |
| 153 | Ja | Automatisch gepland | VO terrein                                         | 20 dagen  | 17 maart 2025 08:30 | 11 april 2025 17:00   | 147GE   | 4 |
| 154 | Ja | Automatisch gepland | VO Participatie                                    | 175 dagen | 8 juli 2024 08:30   | 11 april 2025 17:00   |         | 3 |
| 155 | Ja | Automatisch gepland | Overleg Klankbordgroep locatie Hengelo             | 175 dagen | 8 juli 2024 08:30   | 11 april 2025 17:00   | 147GE   | 4 |
| 156 | Ja | Automatisch gepland | Klankbordgroep locatie Hengelo                     | 0 dagen   | 19 maart 2025 17:00 | 19 maart 2025 17:00   | 146GE   | 4 |
| 157 | Ja | Automatisch gepland | VO Raming bouw- en investeringskosten              | 10 dagen  | 14 april 2025 08:30 | 25 april 2025 17:00   |         | 3 |
| 158 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouwkosten bouwkundig + constructies        | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147;148 | 4 |
| 159 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouwkosten technische installaties          | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 149     | 4 |
| 160 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouwkosten terrein                          | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 4 |
| 161 | Ja | Automatisch gepland | Beoordelen bouwkostenramingen                      | 5 dagen   | 21 april 2025 08:30 | 25 april 2025 17:00   | 158     | 4 |
| 162 | Ja | Automatisch gepland | Raming investeringskosten                          | 5 dagen   | 21 april 2025 08:30 | 25 april 2025 17:00   | 158     | 4 |
| 163 | Ja | Automatisch gepland | VO Opstellen stukken Omgevingsvergunning           | 10 dagen  | 14 april 2025 08:30 | 25 april 2025 17:00   |         | 4 |
| 164 | Ja | Automatisch gepland | VO gebouwen                                        | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 165 | Ja | Automatisch gepland | VO Infra + Terreininrichting                       | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 166 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Bouwfysica                              | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 167 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Brandveiligheid                         | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 168 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Flora & fauna onderzoek                 | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 169 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Milieukundig bodemonderzoek             | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 170 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Archeologie & cultuurhistorie           | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 171 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Omgevingsgeluid t.g.v. AMV              | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 172 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Waterparagraaf                          | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 173 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Stikstofdepositie                       | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 174 | Ja | Automatisch gepland | Rapportage Verkeerskundig onderzoek                | 5 dagen   | 14 april 2025 08:30 | 18 april 2025 17:00   | 147     | 5 |
| 175 | Ja | Automatisch gepland | Samenstellen dossier Omgevingsvergunning           | 5 dagen   | 21 april 2025 08:30 | 25 april 2025 17:00   | 164     | 5 |
| 176 | Ja | Automatisch gepland | Fasedocument Definitie + Int. besluitvorming       | 35 dagen  | 7 april 2025 08:30  | 23 mei 2025 17:00     |         | 3 |
| 177 | Ja | Automatisch gepland | Concept fasedocument Definitie                     | 15 dagen  | 7 april 2025 08:30  | 25 april 2025 17:00   | 162GE   | 4 |
| 178 | Ja | Automatisch gepland | Interne Review                                     | 5 dagen   | 28 april 2025 08:30 | 2 mei 2025 17:00      | 177     | 4 |
| 179 | Ja | Automatisch gepland | Definitief Fasedoc. Definitiefase + indienen MT-IP | 5 dagen   | 5 mei 2025 08:30    | 9 mei 2025 17:00      | 178     | 4 |
| 180 | Ja | Automatisch gepland | MT-IP                                              | 0 dagen   | 9 mei 2025 17:00    | 9 mei 2025 17:00      | 179     | 4 |
| 181 | Ja | Automatisch gepland | Directieteambespreking                             | 5 dagen   | 12 mei 2025 08:30   | 16 mei 2025 17:00     | 180     | 4 |
| 182 | Ja | Automatisch gepland | Bestuur (< € 25 mio)                               | 5 dagen   | 19 mei 2025 08:30   | 23 mei 2025 17:00     | 181     | 4 |
| 183 | Ja | Automatisch gepland | Fase 1 - Voorbereidingsfase                        | 440 dagen | 17 maart 2025 08:30 | 29 januari 2027 17:00 |         | 1 |
| 184 | Ja | Automatisch gepland | Contractering en vervolgopdrachten                 | 20 dagen  | 28 april 2025 08:30 | 23 mei 2025 17:00     |         | 2 |
| 185 | Ja | Automatisch gepland | Concept vervolgopdrachten - Relevante adviseurs    | 10 dagen  | 5 mei 2025 08:30    | 19 mei 2025 08:30     | 186EB   | 3 |
| 186 | Ja | Automatisch gepland | Contractering vervolgopdrachten                    | 5 dagen   | 19 mei 2025 08:30   | 23 mei 2025 17:00     | 182GE   | 3 |
| 187 | Ja | Automatisch gepland | Concept contractering COACH                        | 15 dagen  | 28 april 2025 08:30 | 19 mei 2025 08:30     | 188EB   | 3 |
| 188 | Ja | Automatisch gepland | Contractering COACH-bouwer                         | 5 dagen   | 19 mei 2025 08:30   | 23 mei 2025 17:00     | 182GE   | 3 |
| 189 | Ja | Automatisch gepland | Uitwerken VO naar DO+                              | 50 dagen  | 26 mei 2025 08:30   | 1 augustus 2025 17:00 |         | 2 |
| 190 | Ja | Automatisch gepland | Integraal DO+ door COACH-bouwer                    | 7 wkn     | 26 mei 2025 08:30   | 11 juli 2025 17:00    | 188     | 3 |
| 191 | Ja | Automatisch gepland | Integraal DO+ Infra + Terreininrichting            | 7 wkn     | 26 mei 2025 08:30   | 11 juli 2025 17:00    | 186     | 3 |
| 192 | Ja | Automatisch gepland | Beoordelen integraal DO+ gebouwen   Infra + Terr   | 5 dagen   | 14 juli 2025 08:30  | 18 juli 2025 17:00    | 191     | 3 |
| 193 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Aanpassen integraal DO+ gebouwen   Infra -   | 10 dagen  | 21 juli 2025 08:30  | 1 augustus 2025 17:00 | 192     | 3 |
| 194 | Ja | Automatisch gepland | Minicompetitie aannemer Infra + terrein            | 60 dagen  | 17 maart 2025 08:30 | 6 juni 2025 17:00     |         | 2 |
| 195 | Ja | Automatisch gepland | Voorbereiding                                      | 20 dagen  | 17 maart 2025 08:30 | 11 april 2025 17:00   | 153GE   | 3 |



|     |    |                     |                                                                |           |                        |                         |         |   |
|-----|----|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|---|
| 196 | Ja | Automatisch gepland | Gunningsfase                                                   | 6 wkn     | 14 april 2025 08:30    | 23 mei 2025 17:00       | 195     | 3 |
| 197 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling                                                    | 5 dagen   | 26 mei 2025 08:30      | 30 mei 2025 17:00       | 196     | 3 |
| 198 | Ja | Automatisch gepland | Bezwaartermijn                                                 | 5 dagen   | 2 juni 2025 08:30      | 6 juni 2025 17:00       | 197     | 3 |
| 199 | Ja | Automatisch gepland | Contractering aannemer Infra + Terrein                         | 0 dagen   | 6 juni 2025 17:00      | 6 juni 2025 17:00       | 198     | 3 |
| 200 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouw- en investeringskosten                             | 30 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 29 augustus 2025 17:00  |         | 2 |
| 201 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouwkosten integraal DO+ (COACH)                        | 10 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 11 juli 2025 17:00      | 190GE   | 3 |
| 202 | Ja | Automatisch gepland | Raming bouwkosten Infra + Terrein                              | 10 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 11 juli 2025 17:00      | 191GE   | 3 |
| 203 | Ja | Automatisch gepland | Beoordelen bouwkostenramingen                                  | 10 dagen  | 14 juli 2025 08:30     | 25 juli 2025 17:00      | 201;202 | 3 |
| 204 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Aanpassen integraal DO+ en bouwkosten                    | 10 dagen  | 28 juli 2025 08:30     | 29 augustus 2025 17:00  | 203     | 3 |
| 205 | Ja | Automatisch gepland | Raming investeringskosten                                      | 5 dagen   | 21 juli 2025 08:30     | 25 juli 2025 17:00      | 203GE   | 3 |
| 206 | Ja | Automatisch gepland | Fasedocument Realisatie en Int. besluitvorming                 | 35 dagen  | 7 juli 2025 08:30      | 12 september 2025 17:00 |         | 2 |
| 207 | Ja | Automatisch gepland | Concept fasedocument Realisatie                                | 15 dagen  | 7 juli 2025 08:30      | 25 juli 2025 17:00      | 203GE   | 3 |
| 208 | Ja | Automatisch gepland | Interne Review                                                 | 5 dagen   | 28 juli 2025 08:30     | 1 augustus 2025 17:00   | 207     | 3 |
| 209 | Ja | Automatisch gepland | Definitief Fasedoc. Realisatiefase + indienen MT-II            | 5 dagen   | 25 augustus 2025 08:30 | 29 augustus 2025 17:00  | 208     | 3 |
| 210 | Ja | Automatisch gepland | MT-IP                                                          | 0 dagen   | 29 augustus 2025 17:00 | 29 augustus 2025 17:00  | 209     | 3 |
| 211 | Ja | Automatisch gepland | Directieteambespreking                                         | 5 dagen   | 1 september 2025 08:30 | 5 september 2025 17:00  | 210     | 3 |
| 212 | Ja | Automatisch gepland | Bestuur (< € 25 mio)                                           | 5 dagen   | 8 september 2025 08:30 | 12 september 2025 17:00 | 211     | 3 |
| 213 | Ja | Automatisch gepland | Vergunningen                                                   | 390 dagen | 23 mei 2025 17:00      | 29 januari 2027 17:00   |         | 2 |
| 214 | Ja | Automatisch gepland | Optie 1: Omgevingsvergunning regulier                          | 245 dagen | 23 mei 2025 17:00      | 5 juni 2026 17:00       |         | 3 |
| 215 | Ja | Automatisch gepland | indienen aanvraag omgevingsvergunning                          | 0 dagen   | 23 mei 2025 17:00      | 23 mei 2025 17:00       | 182     | 4 |
| 216 | Ja | Automatisch gepland | procedure omgevingsvergunning                                  | 8 vwkn    | 23 mei 2025 17:00      | 18 juli 2025 17:00      | 215     | 4 |
| 217 | Ja | Automatisch gepland | [EVT]: eenmalige verlenging beslistermijn                      | 6 wkn     | 9 juni 2025 08:30      | 18 juli 2025 17:00      | 216GE   | 4 |
| 218 | Ja | Automatisch gepland | [EVENTUEEL]: eenmalige verlenging beslistermijn                | 4 wkn     | 23 juni 2025 08:30     | 18 juli 2025 17:00      | 216GE   | 4 |
| 219 | Ja | Automatisch gepland | Verlenen herroepelijke omgevingsvergunning                     | 0 dagen   | 18 juli 2025 17:00     | 18 juli 2025 17:00      | 217     | 4 |
| 220 | Ja | Automatisch gepland | Bezwaartermijn omgevingsvergunning                             | 6 vwkn    | 18 juli 2025 17:00     | 29 augustus 2025 17:00  | 219     | 4 |
| 221 | Ja | Automatisch gepland | Vroegst mogelijke onherroepelijke omgevingsvergunning          | 0 dagen   | 29 augustus 2025 17:00 | 29 augustus 2025 17:00  | 220     | 4 |
| 222 | Ja | Automatisch gepland | [EVENTUEEL]: Behandelen bezwaren                               | 6 wkn     | 1 september 2025 08:30 | 10 oktober 2025 17:00   | 221     | 4 |
| 223 | Ja | Automatisch gepland | [EVENTUEEL]: Beroepstermijn                                    | 6 wkn     | 13 oktober 2025 08:30  | 21 november 2025 17:00  | 222     | 4 |
| 224 | Ja | Automatisch gepland | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning incl              | 0 dagen   | 21 november 2025 17:00 | 21 november 2025 17:00  | 223     | 4 |
| 225 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Behandelen beroepen                                      | 26 wkn    | 24 november 2025 08:30 | 5 juni 2026 17:00       | 224     | 4 |
| 226 | Ja | Automatisch gepland | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning incl              | 0 dagen   | 5 juni 2026 17:00      | 5 juni 2026 17:00       | 225     | 4 |
| 227 | Ja | Automatisch gepland | Optie 2: Omgevingsvergunning uitgebreid                        | 390 dagen | 23 mei 2025 17:00      | 29 januari 2027 17:00   |         | 3 |
| 228 | Ja | Automatisch gepland | indienen aanvraag omgevingsvergunning                          | 0 dagen   | 23 mei 2025 17:00      | 23 mei 2025 17:00       | 182     | 4 |
| 229 | Ja | Automatisch gepland | Procedure omgevingsvergunning                                  | 26 wkn    | 26 mei 2025 08:30      | 12 december 2025 17:00  | 228     | 4 |
| 230 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] eenmalige verlenging beslistermijn                       | 6 wkn     | 15 december 2025 08:30 | 6 februari 2026 17:00   | 229     | 4 |
| 231 | Ja | Automatisch gepland | Ter inzage ontwerpbesluit                                      | 6 wkn     | 9 februari 2026 08:30  | 20 maart 2026 17:00     | 230     | 4 |
| 232 | Ja | Automatisch gepland | Vroegst mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning           | 0 dagen   | 20 maart 2026 17:00    | 20 maart 2026 17:00     | 231     | 4 |
| 233 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Behandelen zienswijzen                                   | 10 wkn    | 23 maart 2026 08:30    | 29 mei 2026 17:00       | 232     | 4 |
| 234 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Beroepstermijn                                           | 6 wkn     | 1 juni 2026 08:30      | 10 juli 2026 17:00      | 233     | 4 |
| 235 | Ja | Automatisch gepland | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning incl              | 0 dagen   | 10 juli 2026 17:00     | 10 juli 2026 17:00      | 234     | 4 |
| 236 | Ja | Automatisch gepland | [EVT] Behandelen beroepen                                      | 6 mndn    | 13 juli 2026 08:30     | 29 januari 2027 17:00   | 235     | 4 |
| 237 | Ja | Automatisch gepland | Mogelijk onherroepelijke omgevingsvergunning incl              | 0 dagen   | 29 januari 2027 17:00  | 29 januari 2027 17:00   | 236     | 4 |
| 238 | Ja | Automatisch gepland | Fase 2 - Realisatiefase (onder voorbehoud omgevingsvergunning) | 100 dagen | 30 juni 2025 08:30     | 5 december 2025 17:00   |         | 1 |
| 239 | Ja | Automatisch gepland | Contractering en vervolgoopdrachten                            | 20 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 25 juli 2025 17:00      |         | 2 |
| 240 | Ja | Automatisch gepland | Concept vervolgoopdrachten relevante adviseurs                 | 10 dagen  | 7 juli 2025 08:30      | 18 juli 2025 17:00      | 192GE   | 3 |
| 241 | Ja | Automatisch gepland | Contractering vervolgoopdrachten                               | 5 dagen   | 21 juli 2025 08:30     | 25 juli 2025 17:00      | 240     | 3 |
| 242 | Ja | Automatisch gepland | Concept annemingsovereenkomst COACH-bouwer                     | 15 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 18 juli 2025 17:00      | 192GE   | 3 |
| 243 | Ja | Automatisch gepland | Aannemingsovereenkomst COACH-bouwer                            | 5 dagen   | 21 juli 2025 08:30     | 25 juli 2025 17:00      | 242     | 3 |
| 244 | Ja | Automatisch gepland | Concept annemingsovereenkomst Infra + Terrein                  | 15 dagen  | 30 juni 2025 08:30     | 18 juli 2025 17:00      | 192GE   | 3 |

|     |    |                     |                                           |          |                         |                         |           |   |
|-----|----|---------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|---|
| 245 | Ja | Automatisch gepland | Aannemingsovereenkomst Infra + Terrein    | 5 dagen  | 21 juli 2025 08:30      | 25 juli 2025 17:00      | 244       | 3 |
| 246 | Ja | Automatisch gepland | Realisatie door COACH-bouwer              | 85 dagen | 21 juli 2025 08:30      | 5 december 2025 17:00   |           | 2 |
| 247 | Ja | Automatisch gepland | Technisch ontwerp                         | 4 wkn    | 21 juli 2025 08:30      | 5 september 2025 17:00  | 242       | 3 |
| 248 | Ja | Automatisch gepland | Beoordeling technisch ontwerp             | 5 dagen  | 8 september 2025 08:30  | 12 september 2025 17:00 | 247       | 3 |
| 249 | Ja | Automatisch gepland | Fundering op staal                        | 1 mnd    | 21 juli 2025 08:30      | 5 september 2025 17:00  | 247GE     | 3 |
| 250 | Ja | Automatisch gepland | Productie gebouwen                        | 9 wkn    | 8 september 2025 08:30  | 7 november 2025 17:00   | 247       | 3 |
| 251 | Ja | Automatisch gepland | Plaatsen gebouwen                         | 2 mndn   | 13 oktober 2025 08:30   | 5 december 2025 17:00   | 250BE-1ma | 3 |
| 252 | Ja | Automatisch gepland | Oplevering gebouwen                       | 0 dagen  | 5 december 2025 17:00   | 5 december 2025 17:00   | 251       | 3 |
| 253 | Ja | Automatisch gepland | Bovengrondse en ondergrondse infra        | 85 dagen | 21 juli 2025 08:30      | 5 december 2025 17:00   |           | 2 |
| 254 | Ja | Automatisch gepland | Technisch Ontwerp                         | 6 wkn    | 21 juli 2025 08:30      | 19 september 2025 17:00 | 192       | 3 |
| 255 | Ja | Automatisch gepland | Bouwvoorbereiding                         | 4 wkn    | 25 augustus 2025 08:30  | 19 september 2025 17:00 | 254GE     | 3 |
| 256 | Ja | Automatisch gepland | Bouwrijpmaken + aanleg ondergrondse infra | 2 mndn   | 22 september 2025 08:30 | 14 november 2025 17:00  | 255       | 3 |
| 257 | Ja | Automatisch gepland | Bouw terreininrichting                    | 6 wkn    | 27 oktober 2025 08:30   | 5 december 2025 17:00   | 251GE     | 3 |
| 258 | Ja | Automatisch gepland | Oplevering infra + terrein                | 0 dagen  | 5 december 2025 17:00   | 5 december 2025 17:00   | 257       | 3 |
| 259 | Ja | Automatisch gepland | Ingebruikname                             | 10 dagen | 8 december 2025 08:30   | 19 december 2025 17:00  |           | 1 |
| 260 | Ja | Automatisch gepland | Inrichting                                | 2 wkn    | 8 december 2025 08:30   | 19 december 2025 17:00  | 252       | 2 |
| 261 | Ja | Automatisch gepland | Ingebruikname                             | 0 dagen  | 19 december 2025 17:00  | 19 december 2025 17:00  | 260       | 2 |
| 262 | Ja | Automatisch gepland | Interne besluitvorming                    | 15 dagen | 1 december 2025 08:30   | 19 december 2025 17:00  |           | 1 |
| 263 | Ja | Automatisch gepland | Fasedocument eindafrekening               | 15 dagen | 1 december 2025 08:30   | 19 december 2025 17:00  | 260GE     | 2 |
| 264 | Ja | Automatisch gepland | Bespreken MT IP                           | 0 dagen  | 19 december 2025 17:00  | 19 december 2025 17:00  | 263       | 2 |

| Id |  | Naam | Initialen | Type | Materiaal |  | label | Groep | E-mail | adres | De aanmeldi | Maximum | eenheden | Standaard | Kosten per | Notities |
|----|--|------|-----------|------|-----------|--|-------|-------|--------|-------|-------------|---------|----------|-----------|------------|----------|
|----|--|------|-----------|------|-----------|--|-------|-------|--------|-------|-------------|---------|----------|-----------|------------|----------|

| Taaknaam | Resource | % werk voltooid | Werk | Eenheden |
|----------|----------|-----------------|------|----------|
|----------|----------|-----------------|------|----------|

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
