

OVERZICHT STRENGEN: lokatie**Selectiekriteria vaste gegevens**


Onderwerp	Selectie
-----------	----------

Bestandsnaam	e:\Mijn documenten\zwartsluis.suf (Opdracht: P17)
--------------	---

Selectiekriteria variabele gegevens

Geen selectie op variabele gegevens uitgevoerd

Plaatsnaam	Wijk/kern	Straat	Riool-ID	B-put / E-put	Datum	Streng m1	Inspectie m1
-----Slingerbeek							
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Slingerbeek	21	V26 - V16	08112004	36.20	36.20
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Slingerbeek	22	R16 - R25	08112004	35.40	35.40
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Slingerbeek	23	R16 - R17	08112004	18.20	18.20
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Slingerbeek	23a	R17 - R16	08112004	8.90	8.90
						-----+	-----+
Totaal deze straat						98.70	98.70
-----Stroombeek							
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	10	V3 - V2	08112004	37.50	37.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	11	V2 - V1	08112004	36.80	36.80
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	13	V3 - K1	08112004	33.00	33.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	14	K1 - V16	08112004	33.10	33.10
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	15	V16 - V17	08112004	27.00	27.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	16	R3 - R2	08112004	39.50	39.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	17	R2 - R1	08112004	36.80	36.80
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	18	R3 - R56	08112004	11.50	11.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	19	R56 - K1	08112004	19.40	19.40
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	20	K1 - R16	08112004	31.80	31.80
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	24	R20 - R19	08112004	46.60	46.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	25	V20 - V19	08112004	46.60	46.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	26	V19 - V18	08112004	61.00	61.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	27	R19 - R18	08112004	51.60	51.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	28	R18 - R17	08112004	44.00	44.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	29	V18 - V17	08112004	28.90	28.90
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	30	V18 - V18a	08112004	5.60	5.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	31	R26 - R27	08112004	43.00	43.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	32	R27 - R28	08112004	42.40	42.40
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	33	R30 - R29	08112004	39.50	39.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	34	R29 - R28	08112004	40.50	40.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	35	V29 - V28	08112004	39.50	39.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	36	V28 - V27	08112004	39.30	39.30
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	37	V29 - V30	08112004	35.40	35.40
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	38	V30 - V31	08112004	34.40	34.40



Plaatsnaam	Wijk/kern	Straat	Riool-ID	B-put / E-put	Datum	Streng m1	Inspectie m1
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Stroombeek	32a	R28 - R27	08112004	1.40	1.40
						-----+	-----+
				Totaal deze straat		906.10	906.10
-----Zilverbeek							
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	1	R6 - R7	08112004	52.60	52.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	2	R7 - R8	08112004	48.60	48.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	3	V6 - V7	08112004	52.30	52.30
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	4	V7 - V8	08112004	43.70	43.70
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	5	V6 - V5	08112004	48.00	48.00
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	6	V5 - V4	08112004	44.60	44.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	7	R6 - R5	08112004	48.50	48.50
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	8	R5 - R4	08112004	45.60	45.60
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	9	R4 - R3	08112004	31.30	31.30
Zwartsluis	Barsbekerbinnenpolder	Zilverbeek	12	V3 - V4	08112004	32.70	32.70
						-----+	-----+
				Totaal deze straat		447.90	447.90
=====							
Totale strenglengte	1452.70						
Totale inspectielengte	1452.70						
=====							



Induron BV Raalte

SAMENGESTELD FOUTENVERSLAG (maximale klasse per schadebeeld)

Selectiekriteria vaste gegevens

Onderwerp

Selectie

Bestandsnaam

e:\Mijn documenten\zwartsluis.suf (Opdracht: P17)

Selectiekriteria variabele gegevens

Geen selectie op variabele gegevens uitgevoerd

[illegible]



[illegible]




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 5 -

Begin put:
R6

Eind put
R7

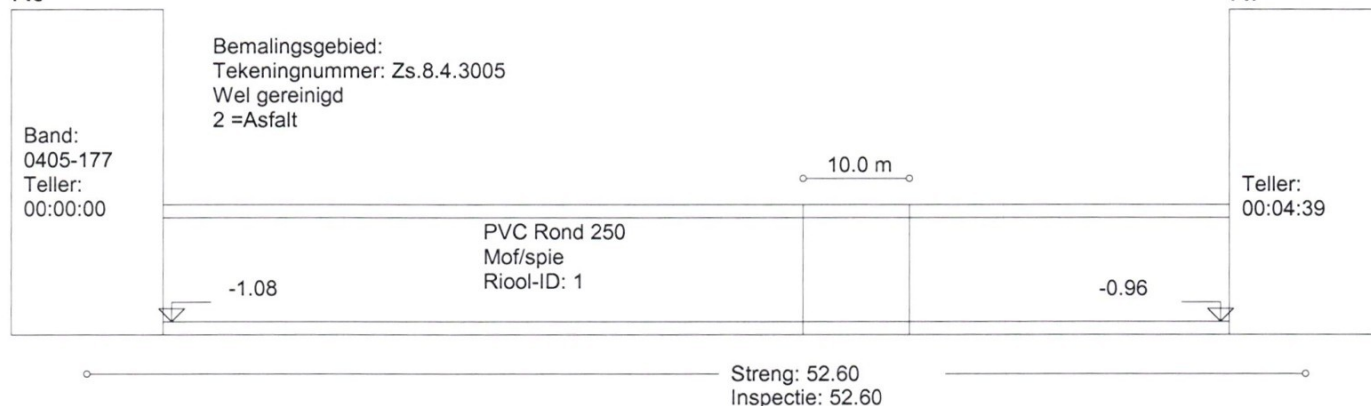
**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 1
Zilverbeek
R6 - R7

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:00:00)				
5,60	B		X1	Prefab inlaat (00:00:17)		12		
16,70	B		X1	Prefab inlaat (00:01:05)		12		
18,90	B		X1	Prefab inlaat (00:01:14)		12		
19,60	B	29,70	B4	Deformatie 5% < deformatie <= 10% van de middellijn (00:01:28)	3			
27,30	B		X1	Prefab inlaat (00:02:06)		12		
29,70	B		B4	Deformatie Niet geconstateerd (00:02:20)	1			
38,00	B		X1	Prefab inlaat (00:03:00)		12		
40,10	B		X1	Prefab inlaat (00:03:13)		12		
48,70	B		X1	Prefab inlaat (00:03:58)		12		
52,60	B		Y3	Inspectieput (Nr R700:04:36)				
52,60	B		Z2	Einde inspectie (00:04:37)				



INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,60	B	Prefab inlaat	12
16,70	B	Prefab inlaat	12
18,90	B	Prefab inlaat	12
27,30	B	Prefab inlaat	12
38,00	B	Prefab inlaat	12
40,10	B	Prefab inlaat	12
48,70	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 7 -

Begin put:
R7

Eind put
R8

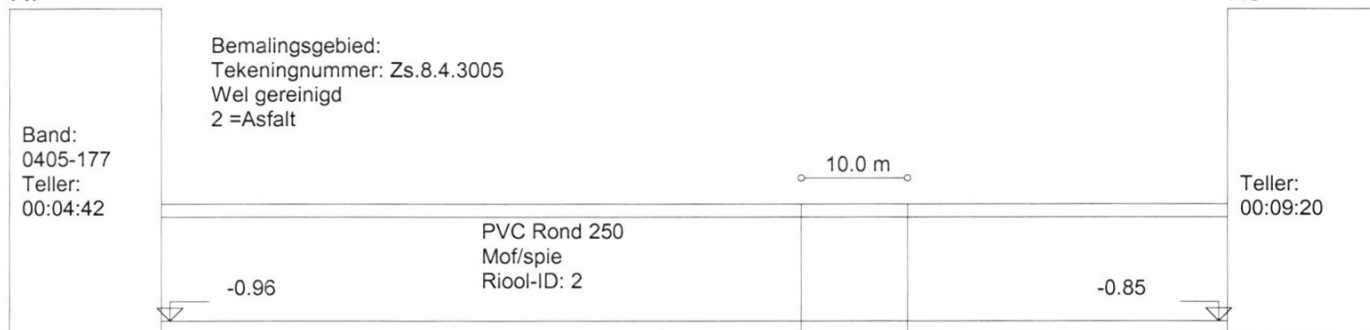

Streng: 48.60
Inspectie: 48.60

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 2
Zilverbeek
R7 - R8

DETAIL GEGEVENS


Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:04:42)				
7,10	B		X1	Prefab inlaat (00:05:14)		12		
9,30	B		X1	Prefab inlaat (00:05:31)		12		
17,70	B		X1	Prefab inlaat (00:06:16)		12		
28,50	B		X1	Prefab inlaat (00:07:10)		12		
34,20	B		X1	Prefab inlaat (00:07:47)		12		
39,20	B		X1	Prefab inlaat (00:08:07)		12		
48,20	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (00:09:00)	2			
48,60	B		Y3	Inspectieput (Nr R800:09:16)				
48,60	B		Z2	Einde inspectie (00:09:18)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
------------------	------------	-------------	------



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
7,10	B	Prefab inlaat	12
9,30	B	Prefab inlaat	12
17,70	B	Prefab inlaat	12
28,50	B	Prefab inlaat	12
34,20	B	Prefab inlaat	12
39,20	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 9 -


Begin put:
V6

Eind put
V7

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
00:09:23

Teller:
00:16:32



Streng: 52.30
Inspectie: 52.30

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 3
Zilverbeek
V6 - V7

DETAIL GEGEVENS


Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:09:23)				
5,90	B		X1	Prefab inlaat (00:09:44)		12		
15,50	B		X1	Prefab inlaat (00:10:31)		12		
27,30	B		X1	Prefab inlaat (00:11:30)		12		
36,90	B		X1	Prefab inlaat (00:13:18)		12		
48,90	B		X1	Prefab inlaat (00:15:53)		12		
52,30	B		Y3	Inspectieput (Nr V700:16:29)				
52,30	B		Z2	Einde inspectie (00:16:30)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,90	B	Prefab inlaat	12
15,50	B	Prefab inlaat	12
27,30	B	Prefab inlaat	12
36,90	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
48,90	B	Prefab inlaat	12

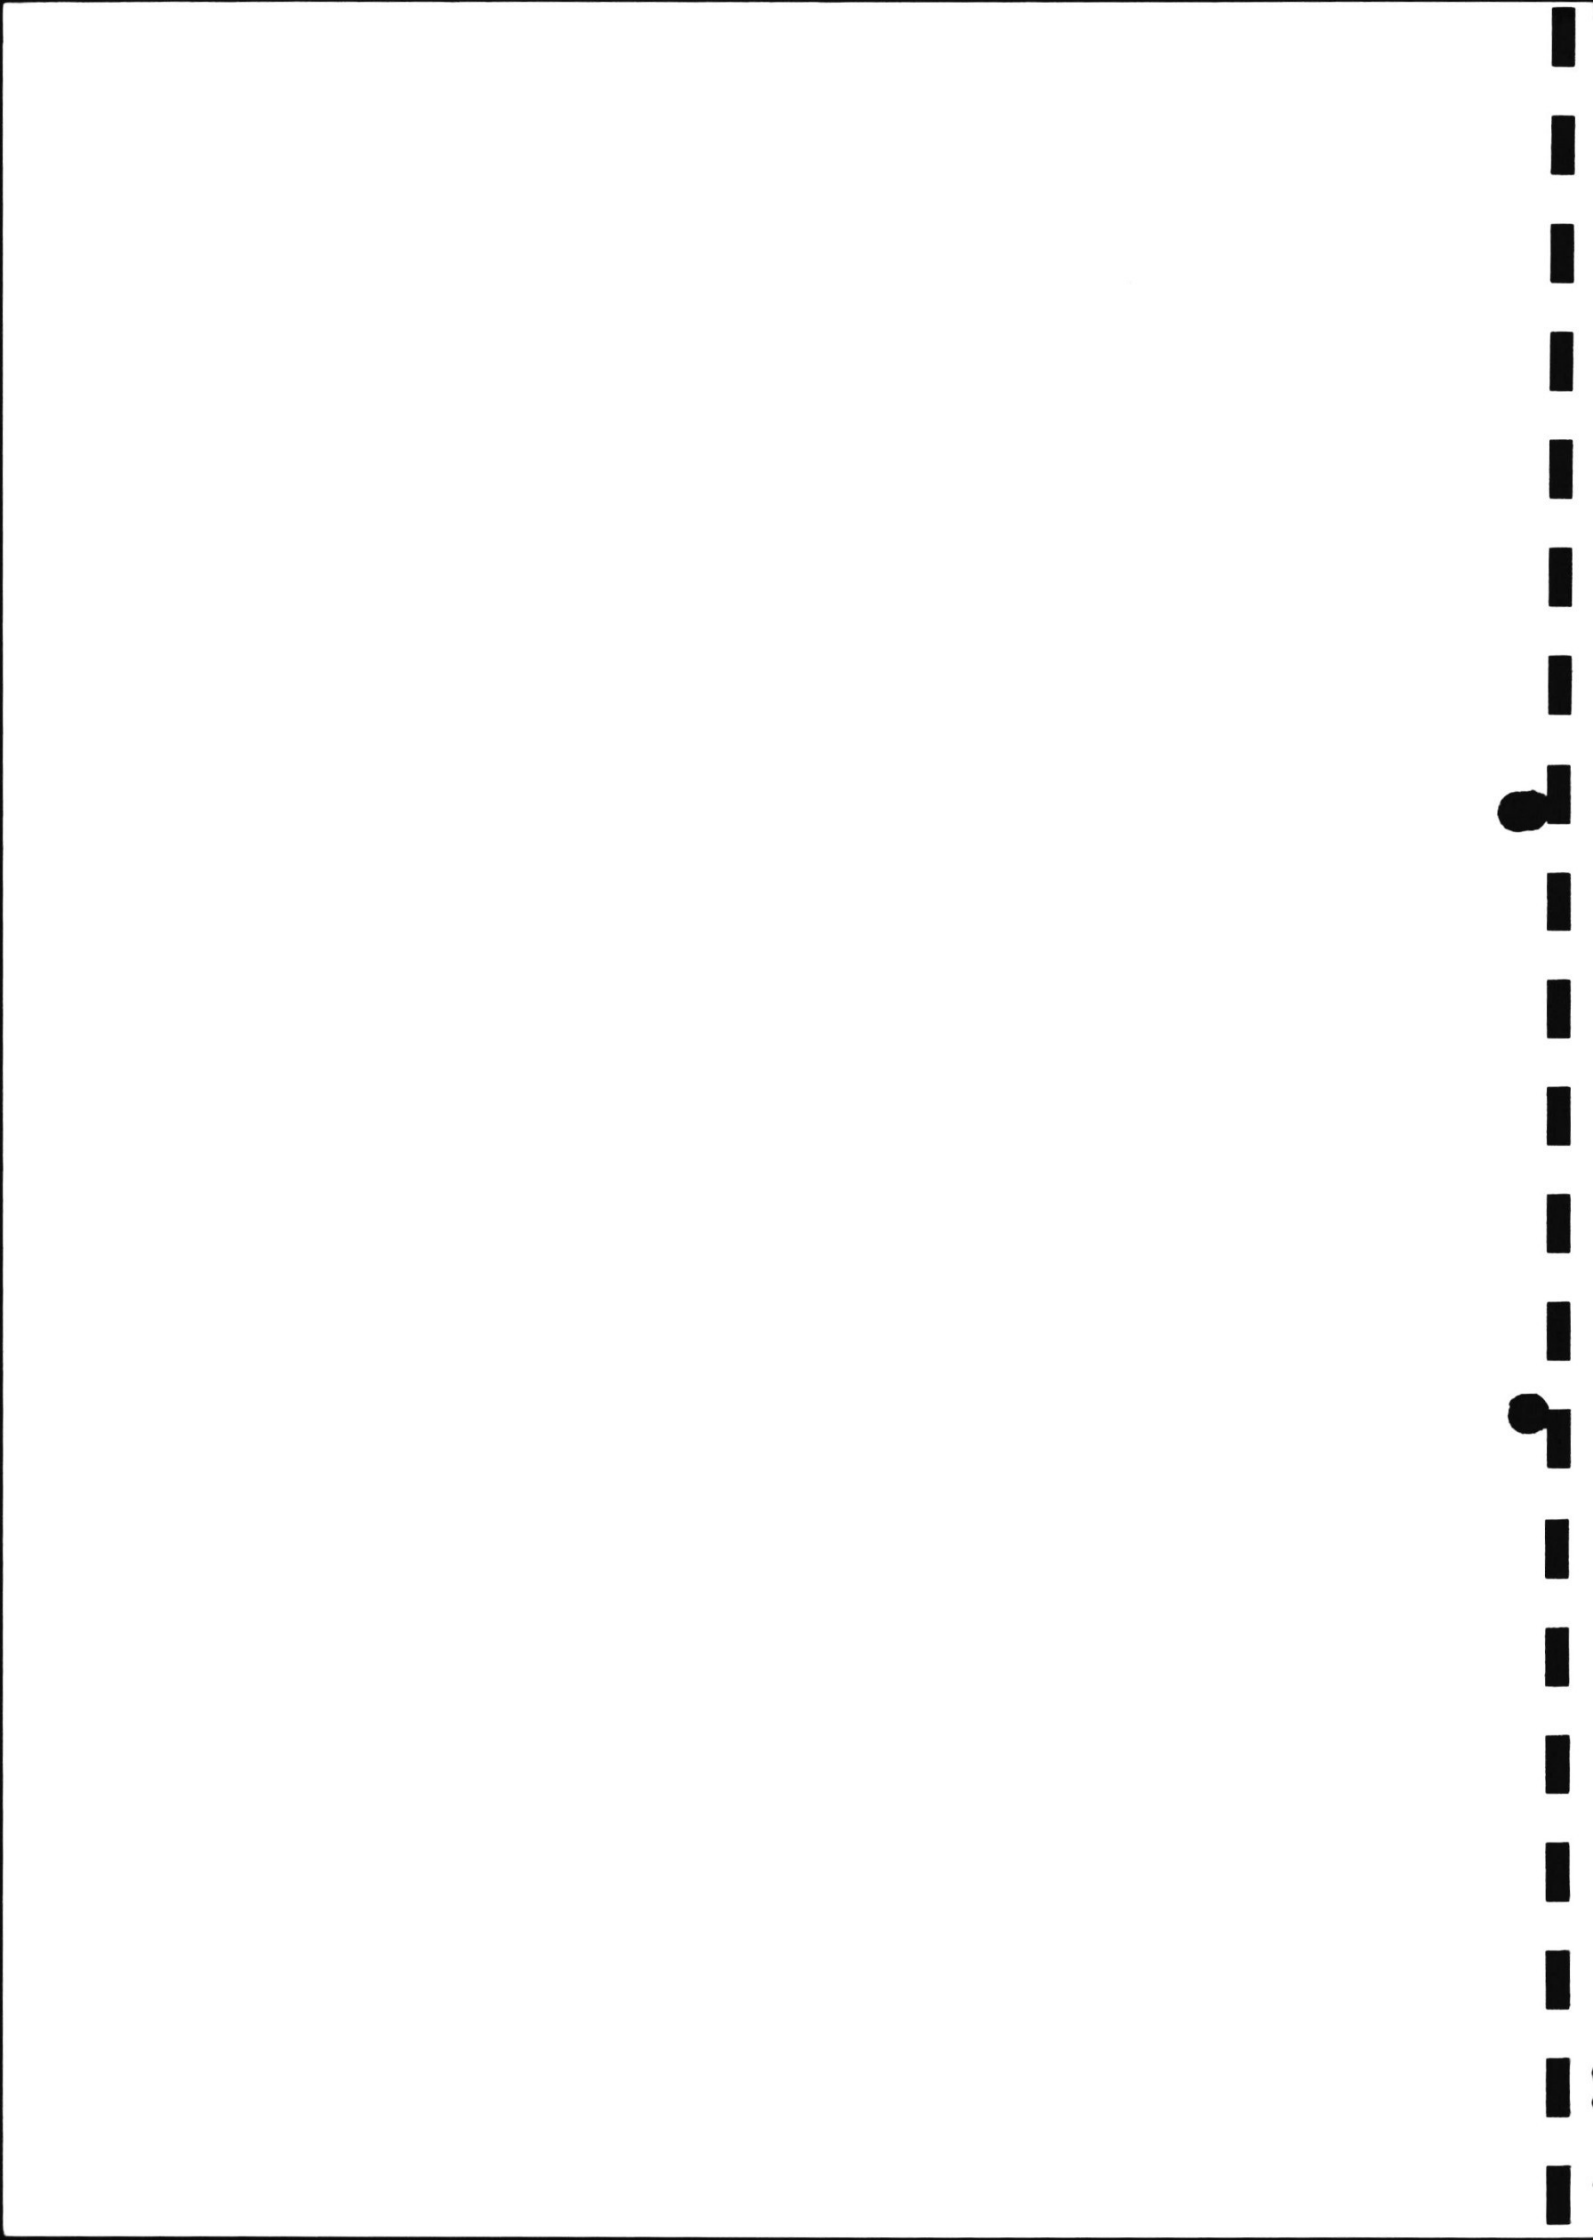


STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 11 -

Begin put:
V7

Eind put
V8

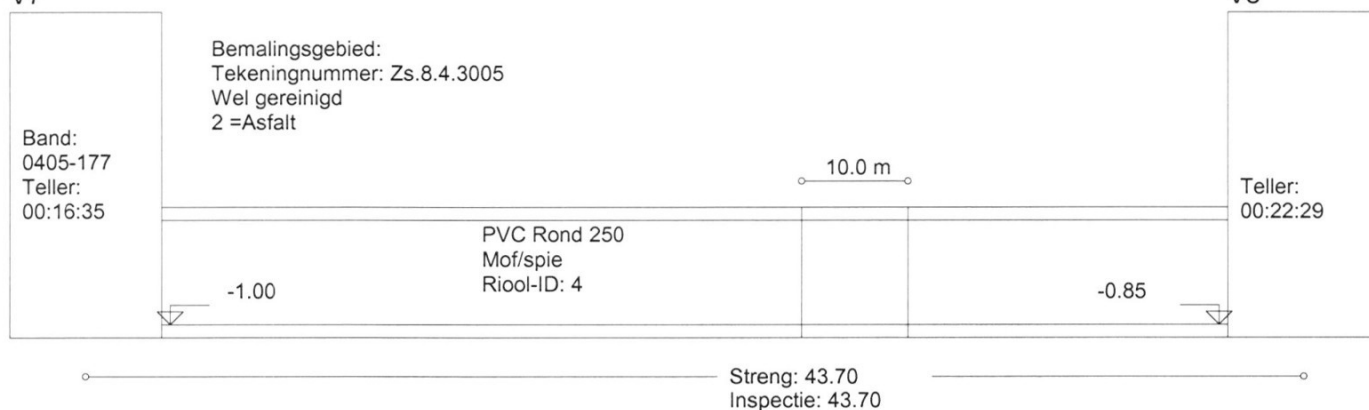**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 4
Zilverbeek
V7 - V8

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:16:35)				
3,40	B	7,30	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:16:55)	2			
5,80	B		X1	Prefab inlaat (00:17:10)		12		
7,30	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:17:23)	1			
17,50	B		X1	Prefab inlaat (00:18:55)		12		
27,30	B		X1	Prefab inlaat (00:19:58)		12		
35,50	B	43,70	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:21:07)	2			
39,20	B		X1	Prefab inlaat (00:21:29)		12		
43,70	B		Y3	Inspectieput (Nr V800:22:26)				
43,70	B		Z2	Einde inspectie (00:22:28)				



INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,80	B	Prefab inlaat	12
17,50	B	Prefab inlaat	12
27,30	B	Prefab inlaat	12
39,20	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 13 -


Begin put:
V6

Eind put
V5

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
00:22:33

Teller:
00:26:25



Streng: 48.00
Inspectie: 48.00

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 5
Zilverbeek
V6 - V5

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B	8,50	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:22:36)	2			
1,40	B		Z1	Begin inspectie (00:22:33)				
5,60	B		X1	Prefab inlaat (00:22:53)		12		
8,50	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:23:16)	1			
12,70	B	16,70	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:23:31)	2			
15,30	B		X1	Prefab inlaat (00:23:43)		12		
16,70	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:23:49)	1			
22,00	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:24:19)	1			
26,60	B		X1	Prefab inlaat (00:24:35)		12		
36,60	B		X1	Prefab inlaat (00:25:20)		12		
47,10	B		X1	Prefab inlaat (00:26:06)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
48,00	B		Y3	Inspectieput (Nr V500:26:22)				
48,00	B		Z2	Einde inspectie (00:26:23)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,60	B	Prefab inlaat	12
15,30	B	Prefab inlaat	12
26,60	B	Prefab inlaat	12
36,60	B	Prefab inlaat	12
47,10	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 15 -

Begin put:
V5

Eind put
V4

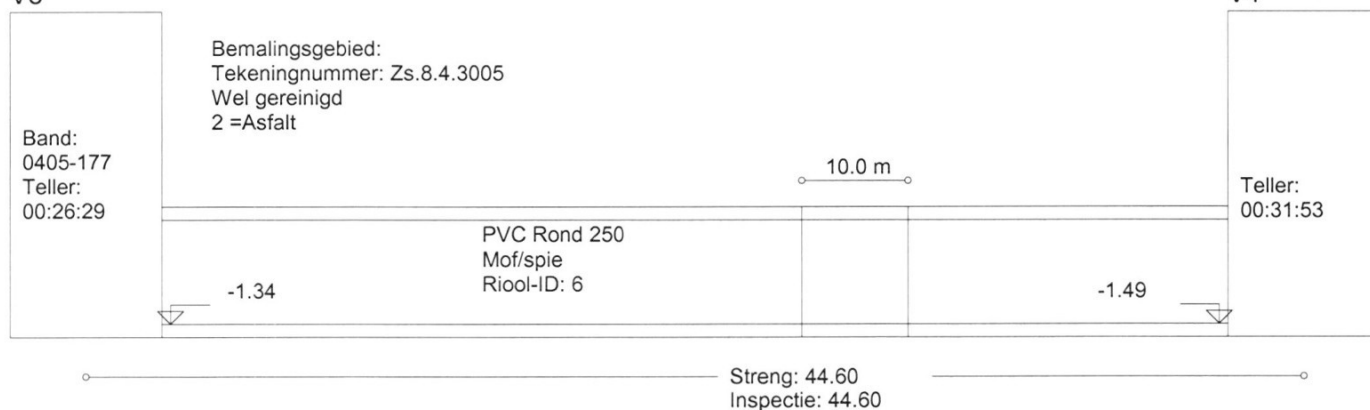**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 6
Zilverbeek
V5 - V4

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:26:28)				
9,60	B		X1	Prefab inlaat (00:27:19)		12		
21,50	B		X1	Prefab inlaat (00:28:33)		12		
31,00	B		X1	Prefab inlaat (00:29:30)		12		
43,00	B		X1	Prefab inlaat (00:31:13)		12		
44,60	B		Y3	Inspectieput (Nr V400:31:46)				
44,60	B		Z2	Einde inspectie (00:31:50)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
9,60	B	Prefab inlaat	12
21,50	B	Prefab inlaat	12
31,00	B	Prefab inlaat	12
43,00	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 16 -

Begin put:
R6

Eind put
R5

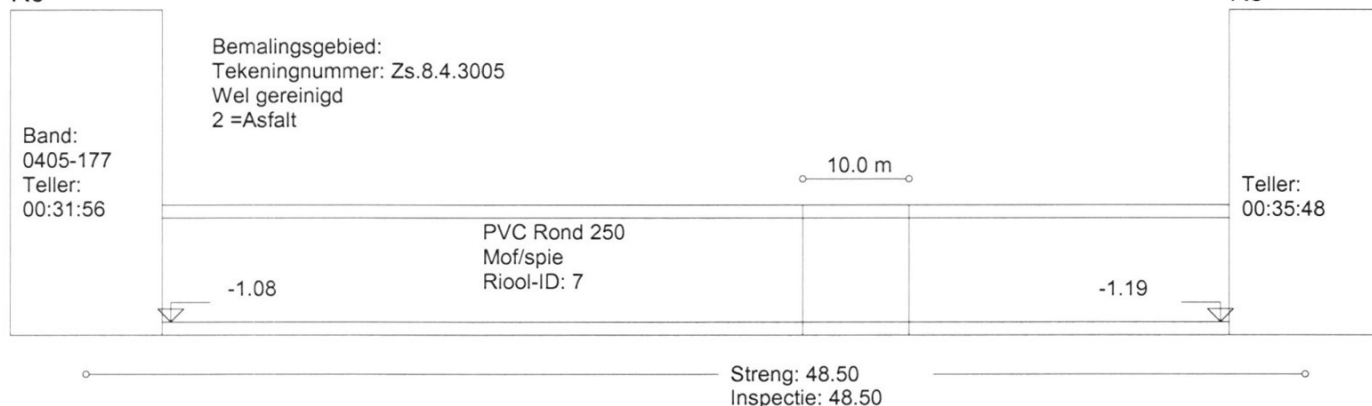**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 7
Zilverbeek
R6 - R5

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:31:56)				
2,60	B		X1	Prefab inlaat (00:32:03)		12		
4,90	B		X1	Prefab inlaat (00:32:15)		12		
8,80	B	10,40	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:32:39)	2			
10,40	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:32:47)	1			
13,70	B	15,50	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:32:57)	2			
15,50	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:33:06)	1			
15,90	B		X1	Prefab inlaat (00:33:13)		12		
24,20	B		X1	Prefab inlaat (00:33:50)		12		
26,50	B		X1	Prefab inlaat (00:34:00)		12		
37,40	B		X1	Prefab inlaat (00:34:44)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
45,80	B		X1	Prefab inlaat (00:35:23)		12		
46,50	B		X1	Prefab inlaat (00:35:29)		12		
48,50	B		Y3	Inspectieput (Nr R500:35:45)				
48,50	B		Z2	Einde inspectie (00:35:46)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
2,60	B	Prefab inlaat	12
4,90	B	Prefab inlaat	12
15,90	B	Prefab inlaat	12
24,20	B	Prefab inlaat	12
26,50	B	Prefab inlaat	12
37,40	B	Prefab inlaat	12
45,80	B	Prefab inlaat	12
46,50	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 18 -

Begin put:
R5

Eind put
R4

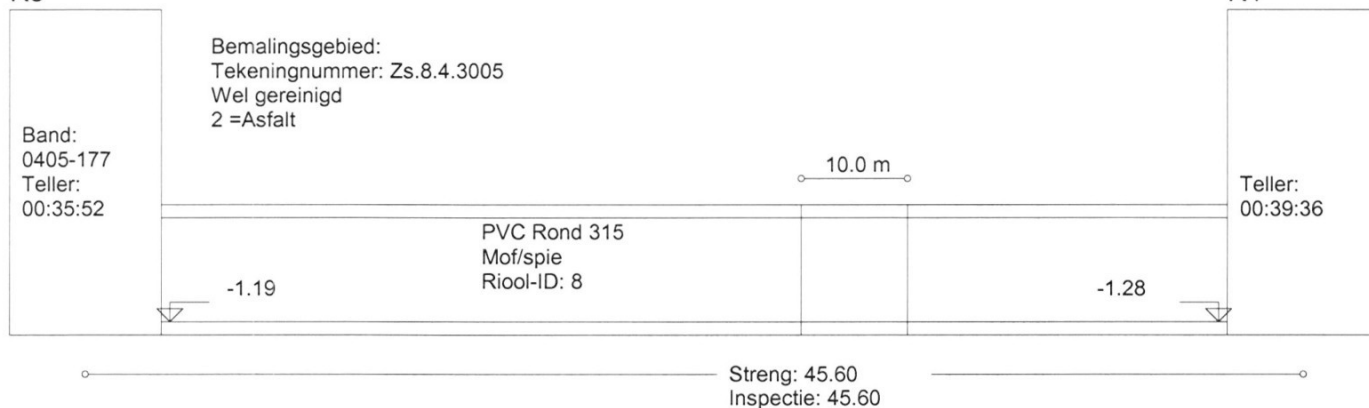**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 8
Zilverbeek
R5 - R4

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:35:51)				
10,80	B		X1	Prefab inlaat (00:36:42)		12		
19,10	B		X1	Prefab inlaat (00:37:21)		12		
21,40	B		X1	Prefab inlaat (00:37:32)		12		
32,20	B		X1	Prefab inlaat (00:38:19)		12		
40,60	B		X1	Prefab inlaat (00:39:01)		12		
42,90	B		X1	Prefab inlaat (00:39:12)		12		
45,60	B		Y3	Inspectieput (Nr R400:39:31)				
45,60	B		Z2	Einde inspectie (00:39:33)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
10,80	B	Prefab inlaat	12
19,10	B	Prefab inlaat	12
21,40	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
32,20	B	Prefab inlaat	12
40,60	B	Prefab inlaat	12
42,90	B	Prefab inlaat	12






STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 21 -

Begin put:
V3

Eind put
V2

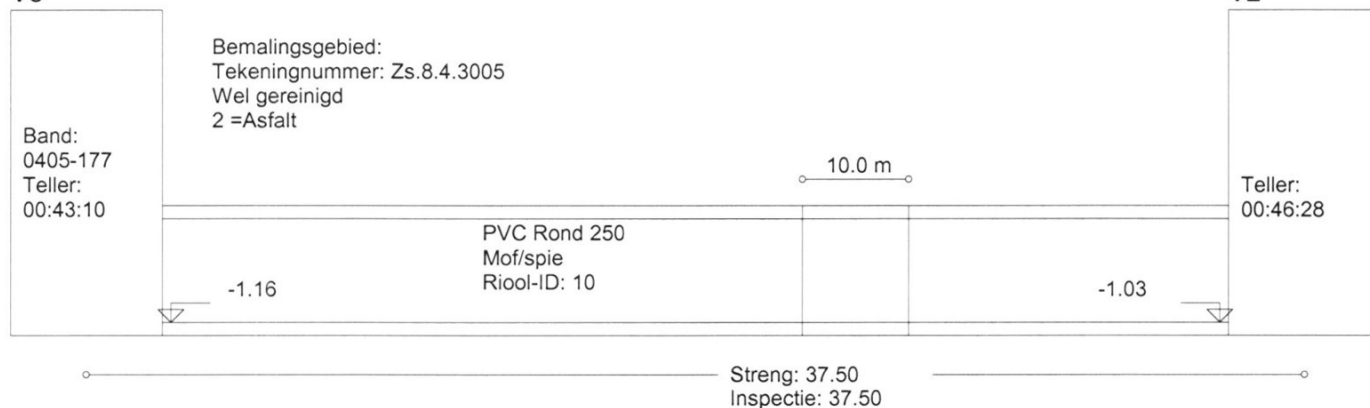**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 10
Stroombeek
V3 - V2

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:43:10)				
9,70	B	18,30	B4	Deformatie Deformatie <= 5% van de middellijn (00:43:36)	2			
12,20	B		X1	Prefab inlaat (00:44:00)		12		
14,50	B		X1	Prefab inlaat (00:44:11)		12		
18,30	B		B4	Deformatie Niet geconstateerd (00:44:25)	1			
19,20	B		X1	Prefab inlaat (00:44:32)		12		
23,70	B		X1	Prefab inlaat (00:45:02)		12		
29,90	B		X1	Prefab inlaat (00:45:26)		12		
32,80	B		X1	Prefab inlaat (00:45:55)		12		
36,40	B		X1	Prefab inlaat (00:46:09)		12		
37,50	B		Y3	Inspectieput (nr V200:46:23)				
37,50	B		Z2	Einde inspectie (00:46:26)				



INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
12,20	B	Prefab inlaat	12
14,50	B	Prefab inlaat	12
19,20	B	Prefab inlaat	12
23,70	B	Prefab inlaat	12
29,90	B	Prefab inlaat	12
32,80	B	Prefab inlaat	12
36,40	B	Prefab inlaat	12



Begin put:
V2

Eind put
V1

Band:
0405-177
Teller:
00:46:30

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

10.0 m

Teller:
00:50:31

-1.03

PVC Rond 250
Mof/spie
Rijool-ID: 11

-0.85

Streng: 36.80
Inspectie: 36.80

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
 Inspecteur: ML
 Opdrachtgever Induron bv
 Soort inspectie: TV vanuit riool
 Commentaar:
 Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 11
Stroombeek
V2 - V1

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put eind	Afstand Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B	Z1	Begin inspectie (00:46:30)				
6,60	B	X1	Prefab inlaat (00:47:12)		12		
9,90	B	X1	Prefab inlaat (00:47:28)		12		
14,30	B	X1	Prefab inlaat (00:48:03)		12		
36,80	B	X1	Prefab inlaat (in Eput00:50:09)				
36,80	B	C1	Instekende inlaat Insteeklengte > 25% van de rioolhoogte (in Eput00:50:17)	5			
36,80	B	Y3	Inspectieput (Nr V100:50:28)				
36,80	B	Z2	Einde inspectie (00:50:29)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
6,60	B	Prefab inlaat	12
9,90	B	Prefab inlaat	12
14,30	B	Prefab inlaat	12
36,80	B	Prefab inlaat	



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
------------------	------------	-------------	------

36,80	B	Inlaat	
-------	---	--------	--



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Zilverbeek
08 november 2004

- 25 -


Begin put:
V3

Eind put
V4

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
00:50:34

Teller:
00:53:22



Streng: 32.70
Inspectie: 32.70

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 12
Zilverbeek
V3 - V4

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:50:34)				
1,30	B	2,90	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:50:38)	2			
2,90	B	6,40	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (00:50:55)	3			
6,40	B	10,20	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:51:08)	2			
10,20	B	12,60	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (00:51:24)	3			
12,60	B	24,10	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:51:45)	2			
13,20	B		X1	Prefab inlaat (00:51:52)		12		
24,10	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:52:35)	1			
24,90	B		X1	Prefab inlaat (00:52:40)		12		
32,70	B		Y3	Inspectieput (Nr V400:53:19)				



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
32,70	B		Z2	Einde inspectie (00:53:20)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
13,20	B	Prefab inlaat	12
24,90	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 27 -


Begin put:
V3

Eind put
K1

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
00:53:25

Teller:
00:55:52



Streng: 33.00
Inspectie: 33.00


ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 13
Stroombeek
V3 - K1

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (00:53:25)				
13,50	B	21,80	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:54:26)	2			
21,80	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:54:51)	1			
24,50	B	33,00	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:55:12)	2			
33,00	B		K1	Verloop diameter (00:55:49)				
33,00	B		Z2	Einde inspectie (00:55:50)				




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 28 -

Begin put:
K1

Eind put
V16

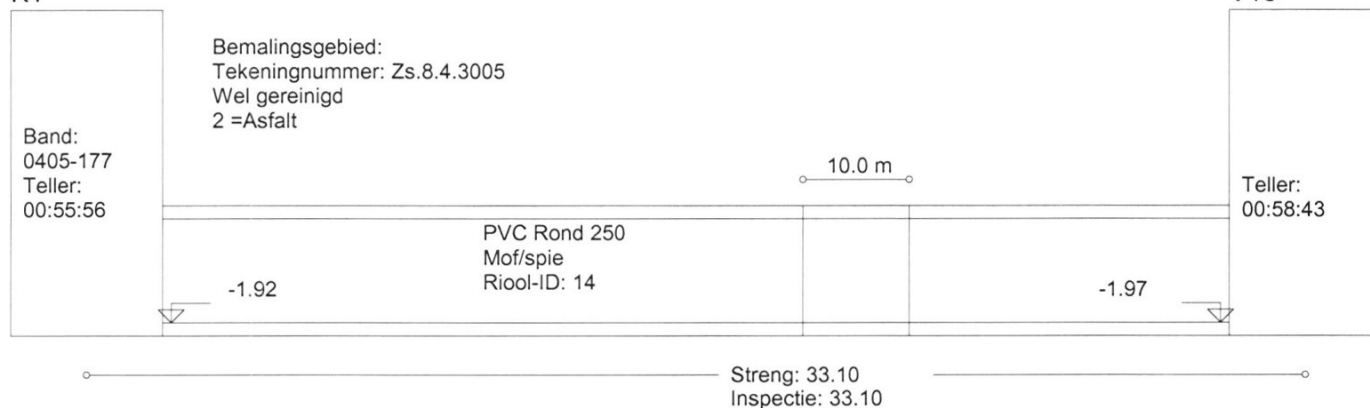**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 14
Stroombeek
K1 - V16

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:55:56)				
0,00	B	20,20	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:56:04)	2			
20,20	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:57:23)	1			
25,40	B	32,00	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (00:57:51)	3			
32,00	B	33,10	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:58:12)	2			
33,10	B		Y3	Inspectieput (nr V1600:58:38)				
33,10	B		Z2	Einde inspectie (00:58:40)				



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 29 -


Begin put:
V16

Eind put
V17

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
00:58:45

Teller:
01:04:14



Streng: 27.00
Inspectie: 27.00

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 15
Stroombeek
V16 - V17

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (00:58:45)				
0,50	B	2,30	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:58:56)	2			
2,30	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (00:59:05)	1			
6,20	B		X1	Prefab inlaat (00:59:19)		12		
10,00	B	10,80	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (00:59:33)	2			
10,80	B	11,30	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (Verzakking00:59:52)	3			
11,30	B	12,00	C7	Waterdiepte 50% <= buisvulling <= 75% buishoogte (00:59:58)	4			
11,30	B	17,00	C4	Afzetting 5% < belemmering buisdoorsnede <= 10% (Vet01:00:01)	2			
12,00	B	16,80	C7	Waterdiepte Buisvulling > 75% buishoogte (Verzakking01:00:17)	5			
16,00	B		X1	Prefab inlaat (01:01:17)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
16,80	B	17,50	C7	Waterdiepte 50% <= buisvulling <= 75% buishoogte (01:01:29)	4			
17,00	B		C4	Afzetting Belemmering buisdoorsnede <= 5% (01:01:33)	1			
17,50	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:02:26)	1			
17,90	B	18,60	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:02:42)	2			
18,60	B	19,30	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (01:02:51)	3			
19,30	B	22,40	C7	Waterdiepte 50% <= buisvulling <= 75% buishoogte (01:02:57)	4			
22,40	B	24,40	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (01:03:28)	3			
24,40	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:03:38)	1			
26,30	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (01:03:53)	2			
27,00	B		Y3	Inspectieput (Nr v1701:04:10)				
27,00	B		Z2	Einde inspectie (01:04:12)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
6,20	B	Prefab inlaat	12
16,00	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 31 -


Begin put:
R3

Eind put
R2

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:04:17

Teller:
01:07:33



Streng: 39.50
Inspectie: 39.50

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 16
Stroombeek
R3 - R2

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:04:17)				
10,40	B		A1	Lekkage Zwetende lekkage (Via voegen tussen buizen01:04:59)	2			
14,70	B		X1	Prefab inlaat (01:05:13)		12		
15,90	B		X1	Prefab inlaat (01:05:21)		12		
17,70	B	39,50	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:05:28)	2			
19,50	B		X1	Prefab inlaat (01:05:37)		12		
21,80	B		X1	Prefab inlaat (01:05:59)		12		
22,30	B		X1	Prefab inlaat (01:06:05)		12		
25,20	B		X1	Prefab inlaat (01:06:17)		12		
32,20	B		X1	Prefab inlaat (01:06:49)		12		
35,50	B		X1	Prefab inlaat (01:07:01)		12		
38,40	B		X1	Prefab inlaat (01:07:13)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
39,40	B		Y3	Inspectieput (Nr R201:07:30)				
39,50	B		Z2	Einde inspectie (01:07:31)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
14,70	B	Prefab inlaat	12
15,90	B	Prefab inlaat	12
19,50	B	Prefab inlaat	12
21,80	B	Prefab inlaat	12
22,30	B	Prefab inlaat	12
25,20	B	Prefab inlaat	12
32,20	B	Prefab inlaat	12
35,50	B	Prefab inlaat	12
38,40	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 33 -

Begin put:
R2

Eind put
R1

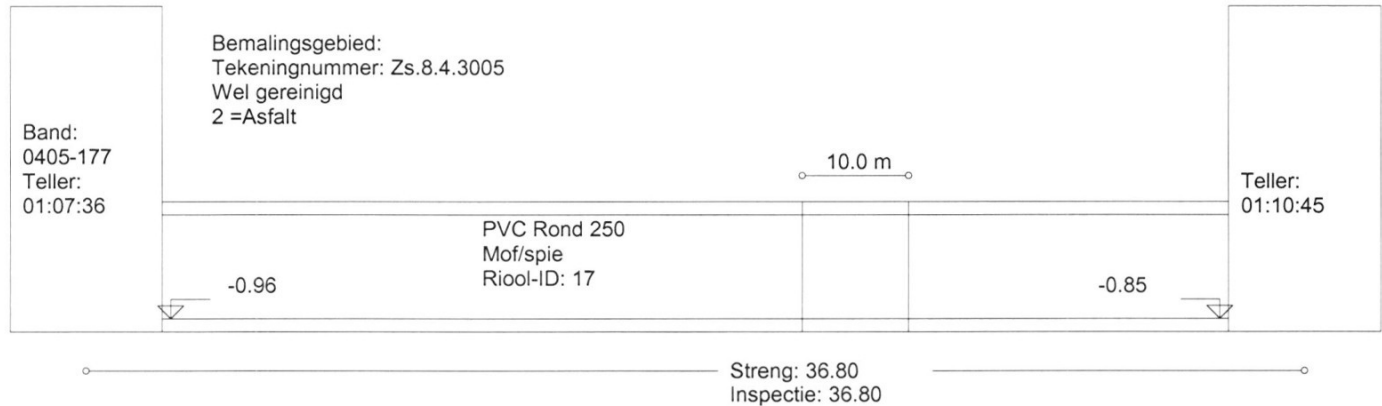**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 17
Stroombeek
R2 - R1

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (01:07:36)				
3,90	B		X1	Prefab inlaat (01:07:58)		12		
6,40	B		X1	Prefab inlaat (01:08:09)		12		
9,50	B		X1	Prefab inlaat (01:08:22)		12		
15,20	B		X1	Prefab inlaat (01:08:58)		12		
30,00	B		X1	Prefab inlaat (01:09:52)		12		
35,50	B		X1	Prefab inlaat (01:10:23)		12		
36,80	B		Y3	Inspectieput (Nr R101:10:41)				
36,80	B		Z2	Einde inspectie (01:10:43)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
3,90	B	Prefab inlaat	12
6,40	B	Prefab inlaat	12
9,50	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
15,20	B	Prefab inlaat	12
30,00	B	Prefab inlaat	12
35,50	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 35 -

Begin put:
R3

Eind put
R56

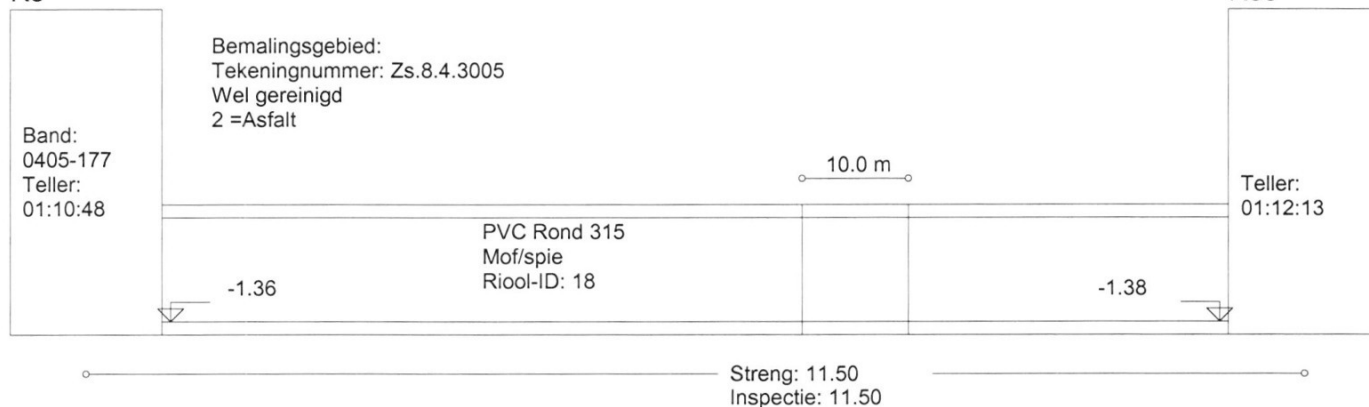
**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 18
Stroombeek
R3 - R56

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:10:48)				
2,90	B	7,10	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:10:59)	2			
7,10	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:11:14)	1			
11,50	B		Y3	Inspectieput (Nr R5601:12:09)				
11,50	B		Z2	Einde inspectie (01:12:11)				




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 36 -

Begin put:
R56

Eind put
K1

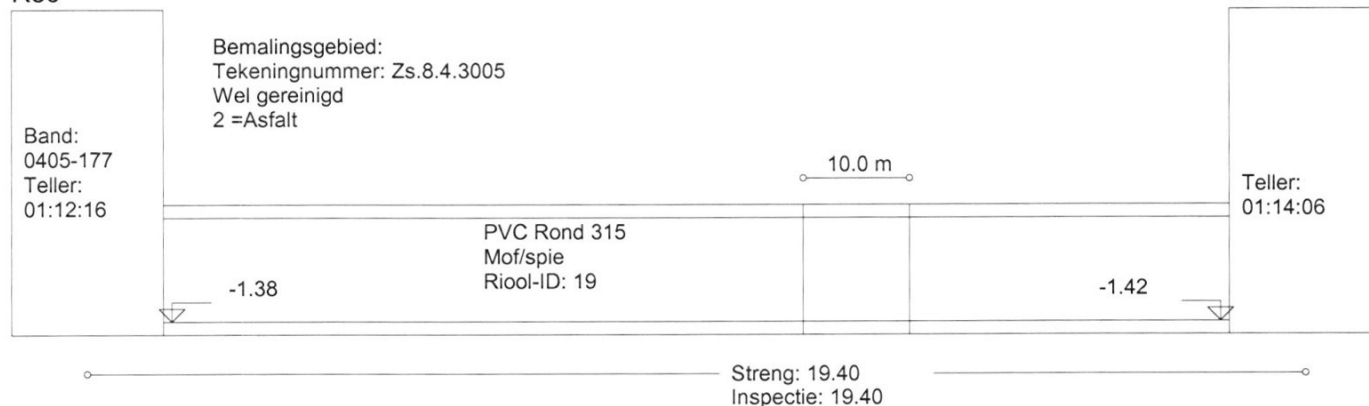**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 19
Stroombeek
R56 - K1

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (01:12:16)				
3,00	B		X1	Prefab inlaat (01:12:33)		12		
19,40	B		Y3	Inspectieput (Nr K101:14:02)				
19,40	B		Z2	Einde inspectie (01:14:04)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
3,00	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 37 -

Begin put:
K1

Eind put
R16

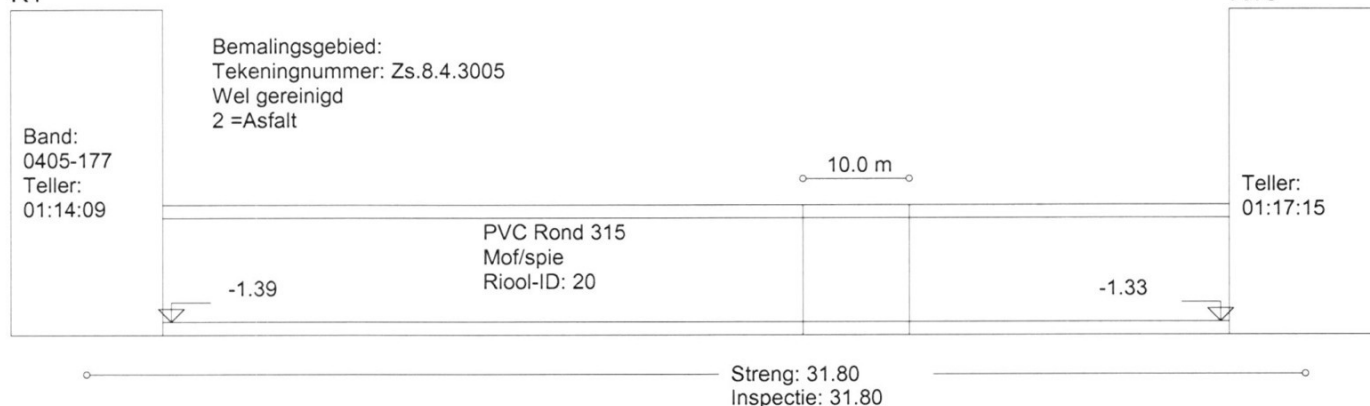**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 20
Stroombeek
K1 - R16

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (01:14:09)				
4,80	B		X1	Prefab inlaat (01:14:44)		12		
8,70	B	19,70	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:14:58)	2			
19,70	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:15:44)	1			
26,50	B		X1	Prefab inlaat (01:16:19)		12		
31,80	B		Y3	Inspectieput (Nr R1601:17:10)				
31,80	B		Z2	Einde inspectie (01:17:12)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
4,80	B	Prefab inlaat	12
26,50	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Slingerbeek
08 november 2004

- 38 -

Begin put:
V26

Eind put
V16

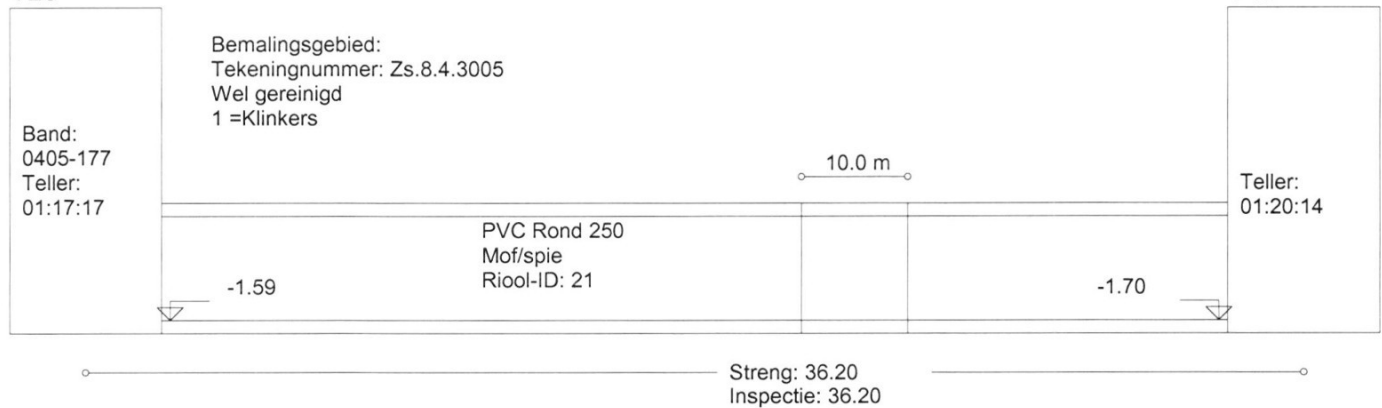**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 21
Slingerbeek
V26 - V16

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,60	B		Z1	Begin inspectie (01:17:17)				
3,70	B		X1	Prefab inlaat (01:17:29)		12		
12,40	B		X1	Prefab inlaat (01:18:09)		12		
17,30	B	34,40	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:18:37)	2			
25,10	B		X1	Prefab inlaat (01:19:00)		12		
34,40	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:19:38)	1			
35,80	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (01:19:47)	2			
36,20	B		Y3	Inspectieput (nr V1601:20:10)				
36,20	B		Z2	Einde inspectie (01:20:11)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
3,70	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
12,40	B	Prefab inlaat	12
25,10	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Slingerbeek
08 november 2004

- 40 -


Begin put:
R16

Eind put
R25

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
1 =Klinkers

Band:
0405-177
Teller:
01:20:17

Teller:
01:22:48



Streng: 35.40
Inspectie: 35.40

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 22
Slingerbeek
R16 - R25

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,10	B		Z1	Begin inspectie (01:20:17)				
3,00	B	21,20	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:20:25)	2			
13,50	B		X1	Prefab inlaat (01:21:06)		12		
21,20	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:21:40)	1			
35,40	B		Y3	Inspectieput (nr R2501:22:44)				
35,40	B		Z2	Einde inspectie (01:22:45)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
13,50	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Slingerbeek
08 november 2004

- 41 -

Begin put:
R16

Eind put
R17

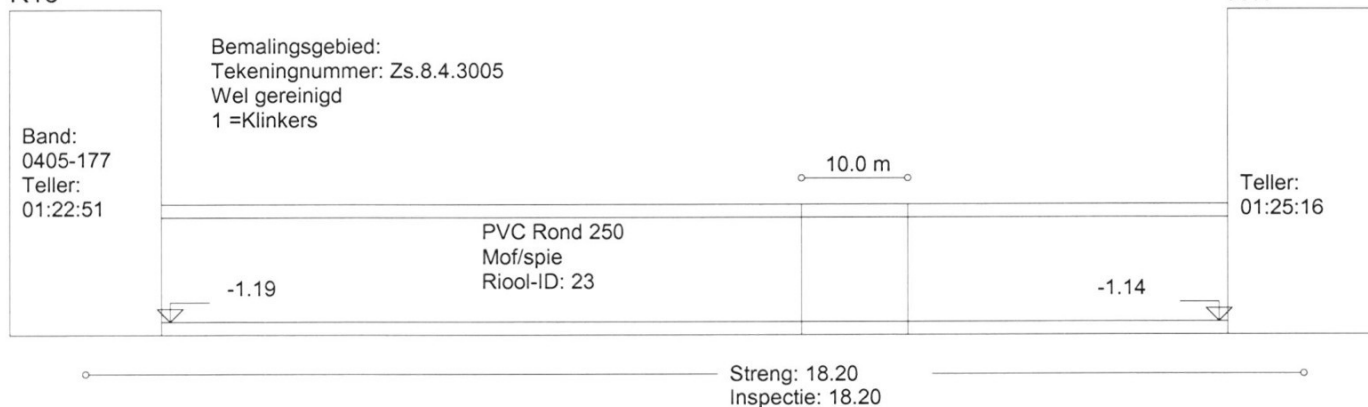**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 23
Slingerbeek
R16 - R17

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:22:51)				
7,00	B		X1	Prefab inlaat (01:23:15)		12		
10,50	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (01:23:46)	3			
10,60	B		A1	Lekkage Zwetende lekkage (Via voegen tussen buizen01:23:52)	2			
17,00	B		X1	Prefab inlaat (01:24:13)		12		
18,20	B		K6	Bocht (bocht schuin links naar beneden		01:24:40)		
18,20	B	18,20	C7	Waterdiepte Buisvulling > 75% buishoogte (begin van een zinker01:25:03)	5			
18,20	B		Z5	Commentaar (Camera niet verder01:25:05)				
18,20	B		Z5	Commentaar (Gedeelte streng gedaan01:25:08)				
18,20	B		Z5	Commentaar (Verder inspectie andere zijde01:25:12)				
18,20	B		Z3	Inspectie afgebroken (01:25:14)				



INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
7,00	B	Prefab inlaat	12
17,00	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 43 -


Begin put:
R20

Eind put
R19

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:25:20

Teller:
01:29:12


**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 24
Stroombeek
R20 - R19

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:25:20)				
1,60	B		X4	Blinde inlaat (01:25:24)		12		
7,50	B		X1	Prefab inlaat (01:25:57)		12		
12,20	B		X1	Prefab inlaat (01:26:13)		12		
15,70	B		X1	Prefab inlaat (01:26:27)		12		
22,70	B		X1	Prefab inlaat (01:27:00)		12		
28,10	B		X1	Prefab inlaat (01:27:32)		12		
33,90	B		X1	Prefab inlaat (01:27:51)		12		
40,80	B		X1	Prefab inlaat (01:28:25)		12		
44,20	B		X1	Prefab inlaat (01:28:37)		12		
46,60	B		Y3	Inspectieput (Nr R1901:29:09)				
46,60	B		Z2	Einde inspectie (01:29:10)				



INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
1,60	B	Blinde inlaat	12
7,50	B	Prefab inlaat	12
12,20	B	Prefab inlaat	12
15,70	B	Prefab inlaat	12
22,70	B	Prefab inlaat	12
28,10	B	Prefab inlaat	12
33,90	B	Prefab inlaat	12
40,80	B	Prefab inlaat	12
44,20	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 45 -


Begin put:
V20

Eind put
V19

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:29:15

Teller:
01:32:59



Streng: 46.60
Inspectie: 46.60

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf


Riool-ID: 25
Stroombeek
V20 - V19

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:29:15)				
1,30	B		X1	Prefab inlaat (01:29:24)		12		
9,90	B		X1	Prefab inlaat (01:30:05)		12		
16,60	B		X1	Prefab inlaat (01:30:41)		12		
28,00	B		X1	Prefab inlaat (01:31:27)		12		
33,90	B		X1	Prefab inlaat (01:31:48)		12		
45,70	B		X1	Prefab inlaat (01:32:37)		12		
46,60	B		Y3	Inspectieput (Nr V1901:32:56)				
46,60	B		Z2	Einde inspectie (01:32:57)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
1,30	B	Prefab inlaat	12
9,90	B	Prefab inlaat	12
16,60	B	Prefab inlaat	12

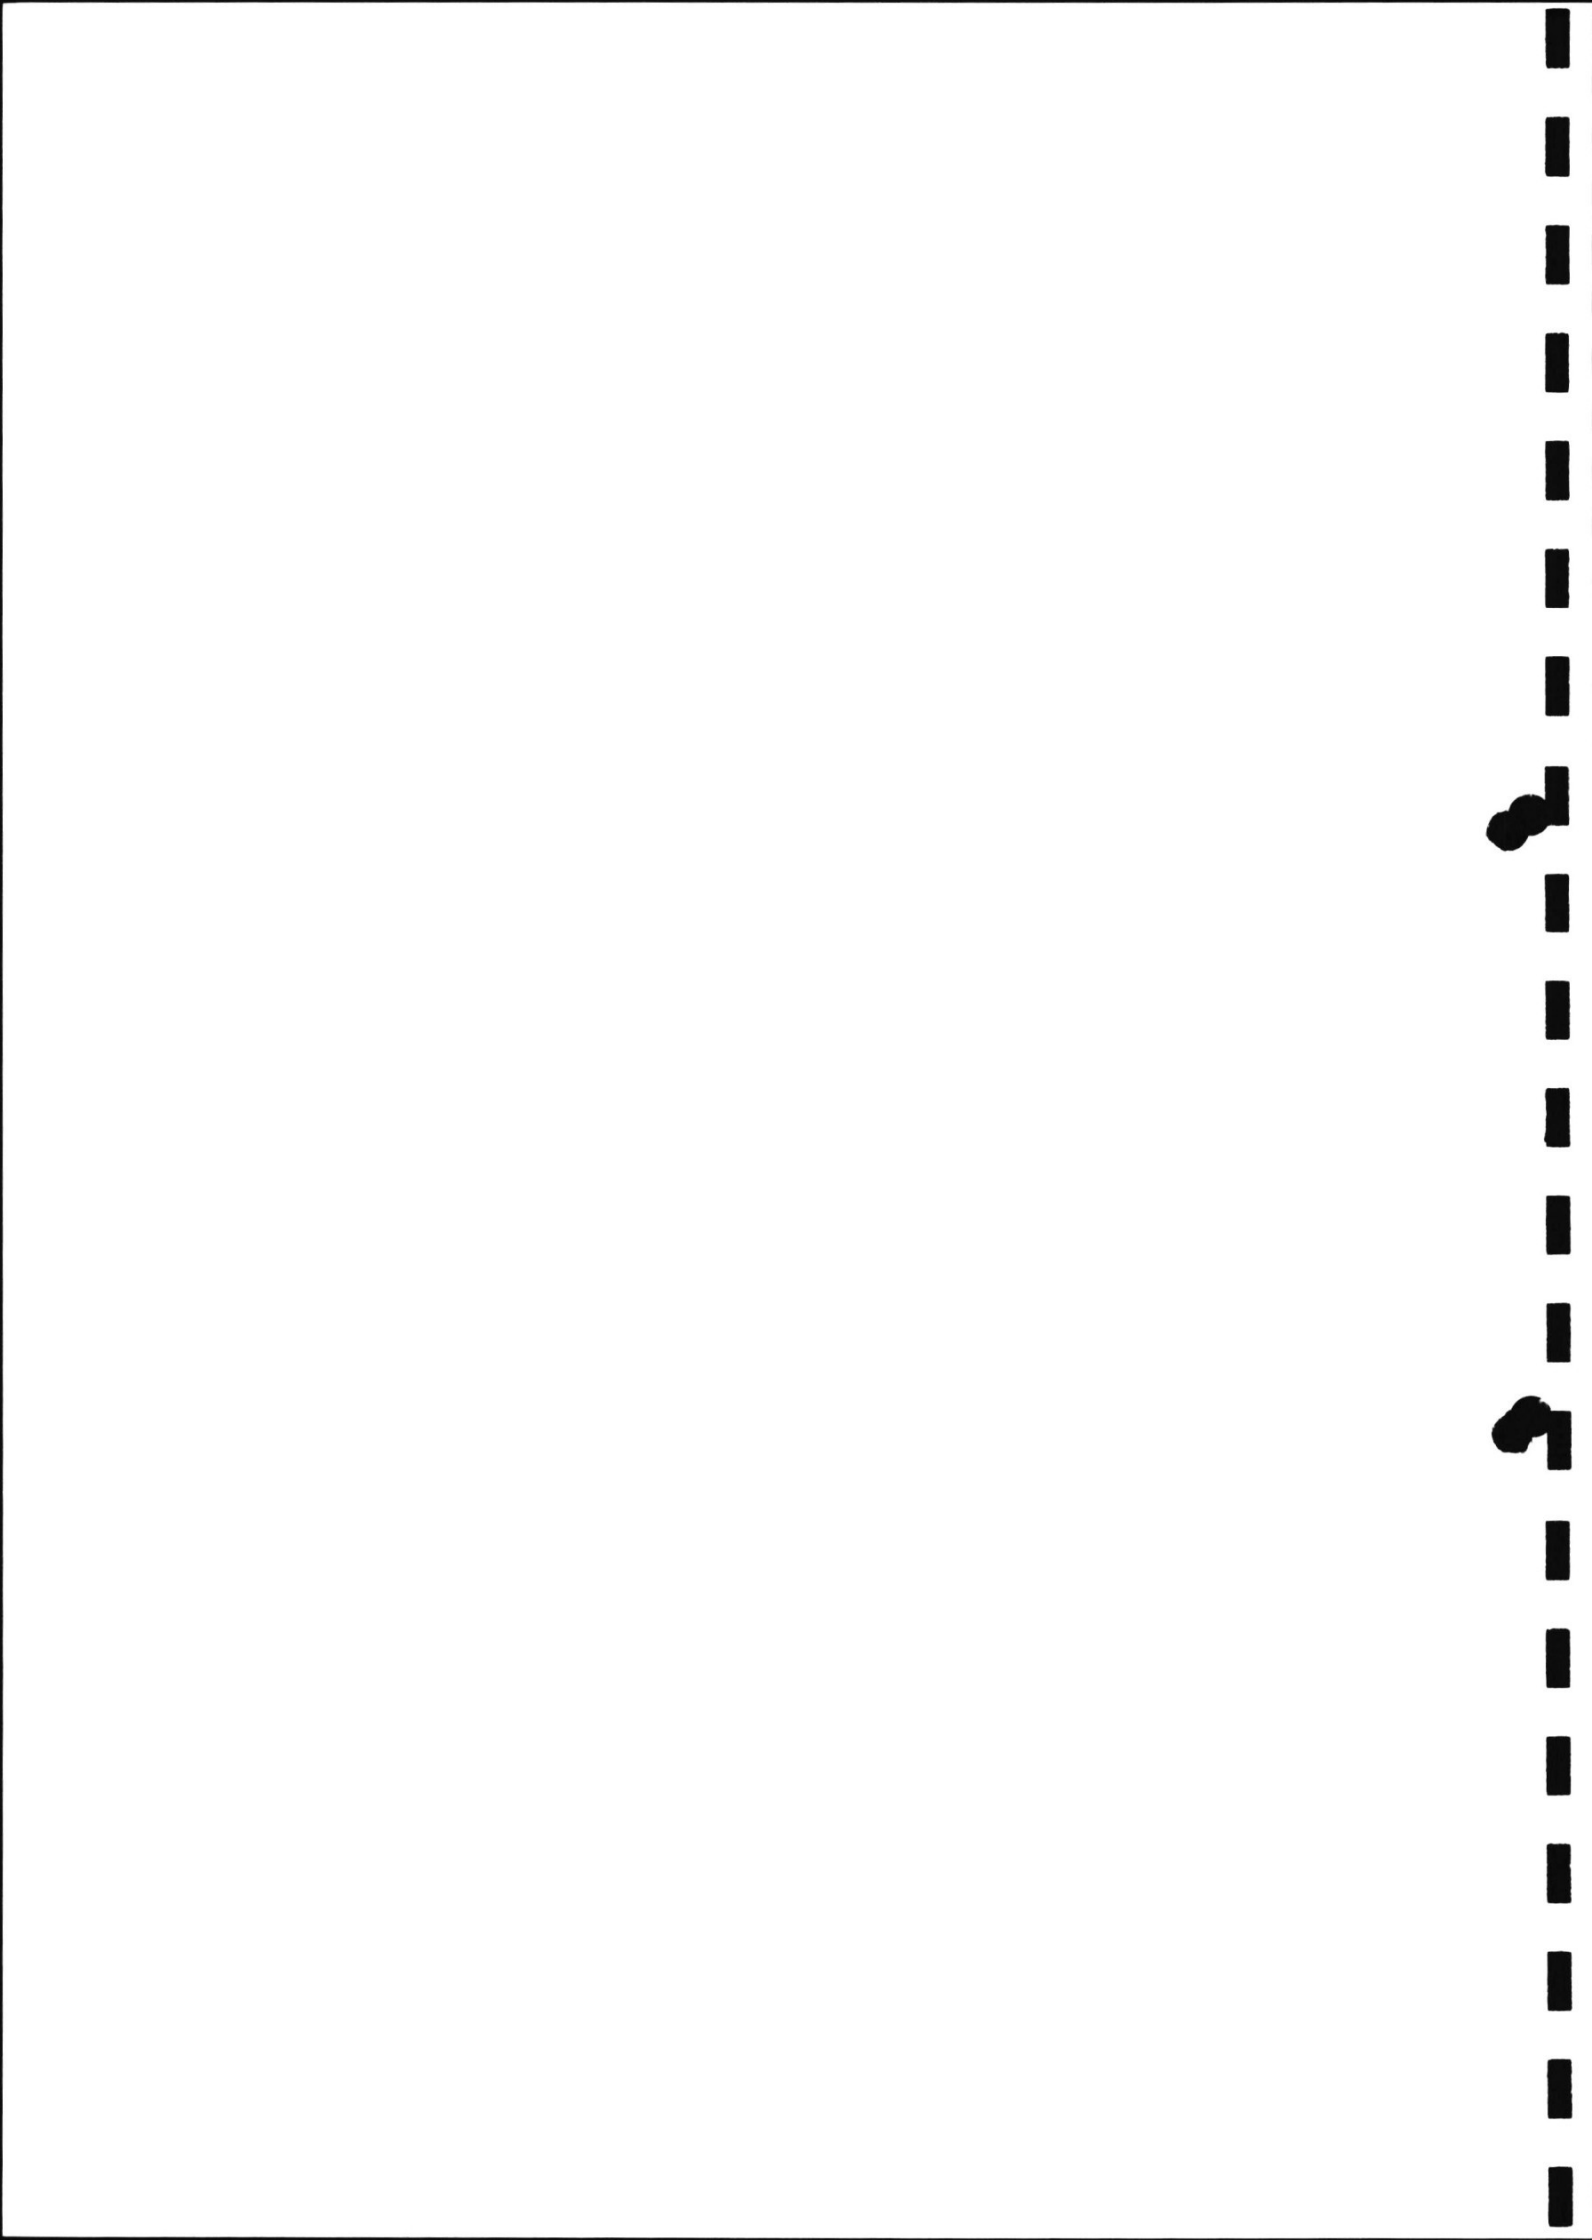

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
28,00	B	Prefab inlaat	12
33,90	B	Prefab inlaat	12
45,70	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 47 -

Begin put:
V19

Eind put
V18

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:33:02

Teller:
01:42:25

10.0 m

PVC Rond 250
Mof/spie
Riool-ID: 26

Streng: 61.00
Inspectie: 61.00


ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 26
Stroombeek
V19 - V18

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (01:33:02)				
1,50	B	5,80	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:33:20)	2			
5,30	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (01:33:37)	2			
5,80	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:33:48)	1			
8,20	B		X1	Prefab inlaat (01:33:59)		12		
19,70	B		X1	Prefab inlaat (01:35:03)		12		
26,20	B		X1	Prefab inlaat (01:36:02)		12		
38,50	B		X1	Prefab inlaat (01:37:54)		12		
45,00	B		X1	Prefab inlaat (01:39:25)		12		
57,10	B		X1	Prefab inlaat (01:41:14)		12		
61,00	B		Y3	Inspectieput (01:42:11)				



Afstand begin	Uit put eind	Afstand Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
61,00	B	Z2	Einde inspectie (01:42:23)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
8,20	B	Prefab inlaat	12
19,70	B	Prefab inlaat	12
26,20	B	Prefab inlaat	12
38,50	B	Prefab inlaat	12
45,00	B	Prefab inlaat	12
57,10	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 49 -


Begin put:
R19

Eind put
R18

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:42:29

Teller:
01:46:50



Streng: 51.60
Inspectie: 51.60

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 27
Stroombeek
R19 - R18

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:42:29)				
6,40	B	51,60	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:42:46)	2			
7,20	B		X1	Prefab inlaat (01:42:51)		12		
14,70	B		X1	Prefab inlaat (01:43:36)		12		
15,90	B		X1	Prefab inlaat (01:43:42)		12		
15,90	B		A1	Lekkage Zwetende lekkage (Via inlaat standpijp 01:43:44)	2			
20,00	B		X1	Prefab inlaat (01:43:59)		12		
25,80	B		X1	Prefab inlaat (01:44:30)		12		
31,80	B		X1	Prefab inlaat (01:45:04)		12		
32,60	B		X1	Prefab inlaat (01:45:10)		12		
38,00	B		X1	Prefab inlaat (01:45:28)		12		
44,00	B		X1	Prefab inlaat (01:45:58)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
50,00	B		X4	Blinde inlaat (01:46:18)		12		
50,60	B		X1	Prefab inlaat (01:46:25)		12		
51,60	B		Y3	Inspectieput (Nr R1801:46:47)				
51,60	B		Z2	Einde inspectie (01:46:48)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
7,20	B	Prefab inlaat	12
14,70	B	Prefab inlaat	12
15,90	B	Prefab inlaat	12
20,00	B	Prefab inlaat	12
25,80	B	Prefab inlaat	12
31,80	B	Prefab inlaat	12
32,60	B	Prefab inlaat	12
38,00	B	Prefab inlaat	12
44,00	B	Prefab inlaat	12
50,00	B	Blinde inlaat	12
50,60	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
------------------	------------	-------------	------



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
4,20	B	Prefab inlaat	12
10,40	B	Prefab inlaat	12
17,40	B	Prefab inlaat	12
18,00	B	Prefab inlaat	12
22,60	B	Prefab inlaat	12
28,60	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Slingerbeek
08 november 2004

- 53 -


Begin put:
R17

Eind put
R16

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
1 =Klinkers

Band:
0405-177
Teller:
01:50:42

Teller:
01:53:03



Streng: 8.90
Inspectie: 8.90


ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 23a
Slingerbeek
R17 - R16

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,30	B		A3	Axiale verplaatsing Zie bijlage B NEN 3399 (01:50:52)	2			
0,60	B		Z1	Begin inspectie (01:50:42)				
5,60	B	6,40	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:51:19)	2			
6,10	B		X1	Prefab inlaat (01:51:24)		12		
6,40	B	7,20	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (01:51:30)	3			
7,20	B	7,50	C7	Waterdiepte 50% <= buisvulling <= 75% buishoogte (01:51:39)	4			
7,50	B	8,90	C7	Waterdiepte Buisvulling > 75% buishoogte (01:51:45)	5			
7,50	B		Z4	Onder water (01:51:46)				
8,00	B		X1	Prefab inlaat (01:51:59)		12		
8,70	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal 01:52:17)	5			



Afstand begin	Uit put eind	Afstand Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
8,70	B	K6	Bocht (01:52:33)				
8,90	B	Z5	Commentaar (Camera niet verder01:52:56)				
8,90	B	Z5	Commentaar (Gedeelte streng gedaan01:52:58)				
8,90	B	Z2	Einde inspectie (01:53:01)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
6,10	B	Prefab inlaat	12
8,00	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 55 -


Begin put:
V18

Eind put
V17

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
01:53:06

Teller:
01:55:32



Streng: 28.90
Inspectie: 28.90

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 29
Stroombeek
V18 - V17

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:53:06)				
2,20	B		X4	Blinde inlaat (01:53:13)		12		
13,20	B		X1	Prefab inlaat (01:53:57)		12		
19,70	B	27,50	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (01:54:28)	2			
27,50	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (01:54:54)	1			
28,90	B		Y3	Inspectieput (nr V1701:55:29)				
28,90	B		Z2	Einde inspectie (01:55:30)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
2,20	B	Blinde inlaat	12
13,20	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 56 -

Begin put:
V18

Eind put
V18a

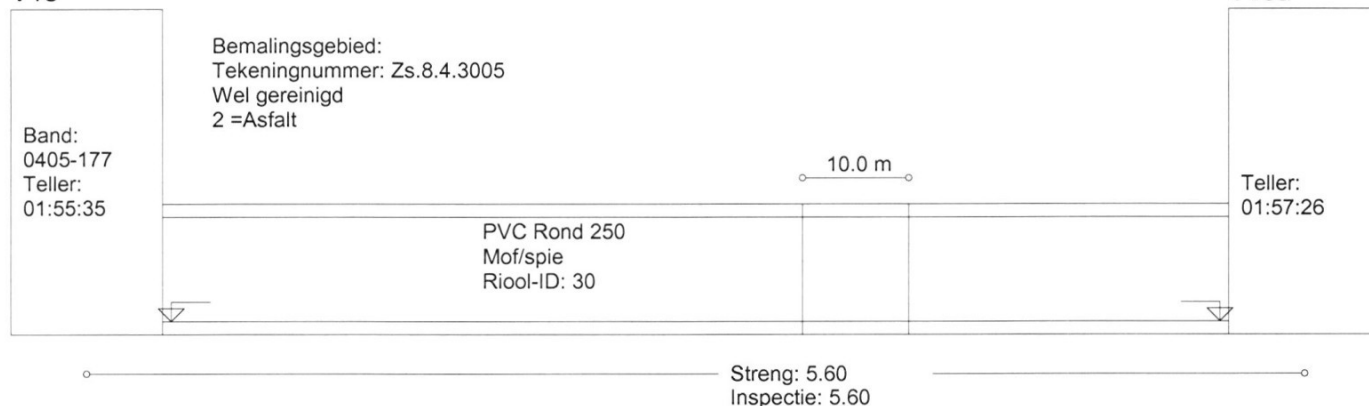**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 30
Stroombeek
V18 - V18a

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:55:35)				
2,00	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal'01:55:54)	5			
2,30	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal01:56:04)	5			
2,30	B	5,60	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (01:56:14)	3			
5,20	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal01:56:33)	5			
5,20	B		A1	Lekkage Zwetende lekkage (Via voegen tussen buizen01:56:40)	2			
5,20	B	5,60	B4	Deformatie Deformatie <= 5% van de middellijn (01:56:50)	2			
5,20	B		K8	Bocht rechts (01:56:57)				
5,60	B		Y3	Inspectieput (Nr 18a01:57:22)				
5,60	B		Z2	Einde inspectie (01:57:24)				




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 57 -

Begin put:
R26

Eind put
R27

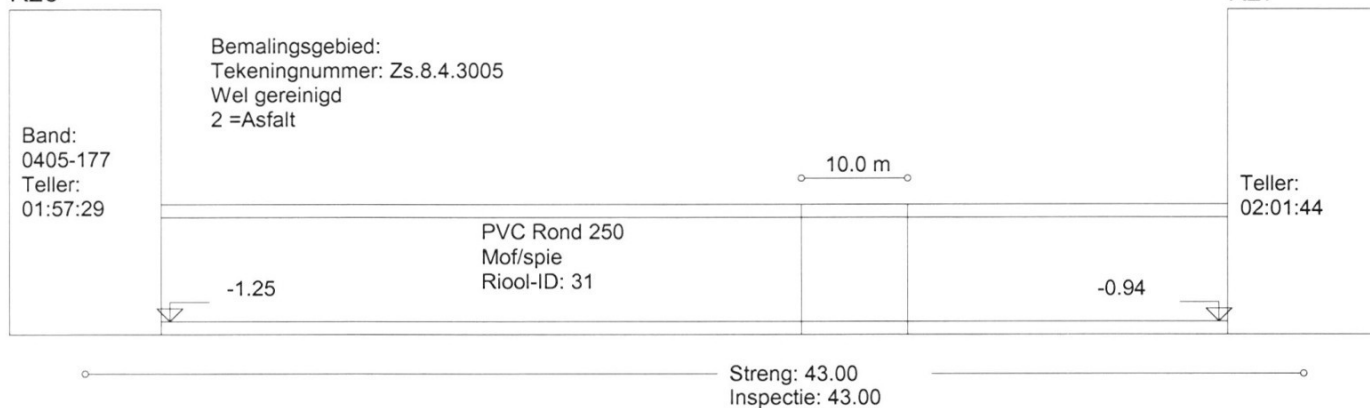**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 31
Stroombeek
R26 - R27

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (01:57:29)				
2,10	B		X1	Prefab inlaat (01:57:37)		12		
2,10	B		B1	Beschadiging Wel geconstateerd (t-stuk gescheurd 01:57:52)	5	12		
7,60	B		X1	Prefab inlaat (01:58:22)		12		
19,50	B		X1	Prefab inlaat (01:59:23)		02		
19,90	B		X4	Blinde inlaat (01:59:30)		12		
26,40	B		X1	Prefab inlaat (02:00:04)		12		
28,60	B		X1	Prefab inlaat (02:00:16)		12		
31,70	B		X1	Prefab inlaat (02:00:27)		12		
34,90	B		X1	Prefab inlaat (02:00:54)		12		
41,50	B		X1	Prefab inlaat (02:01:16)		12		
43,00	B		Y3	Inspectieput (Nr R2702:01:39)				



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
43,00	B		Z2	Einde inspectie (02:01:41)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
2,10	B	Prefab inlaat	12
7,60	B	Prefab inlaat	12
19,50	B	Prefab inlaat	02
19,90	B	Blinde inlaat	12
26,40	B	Prefab inlaat	12
28,60	B	Prefab inlaat	12
31,70	B	Prefab inlaat	12
34,90	B	Prefab inlaat	12
41,50	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 59 -

Begin put:
R27

Eind put
R28

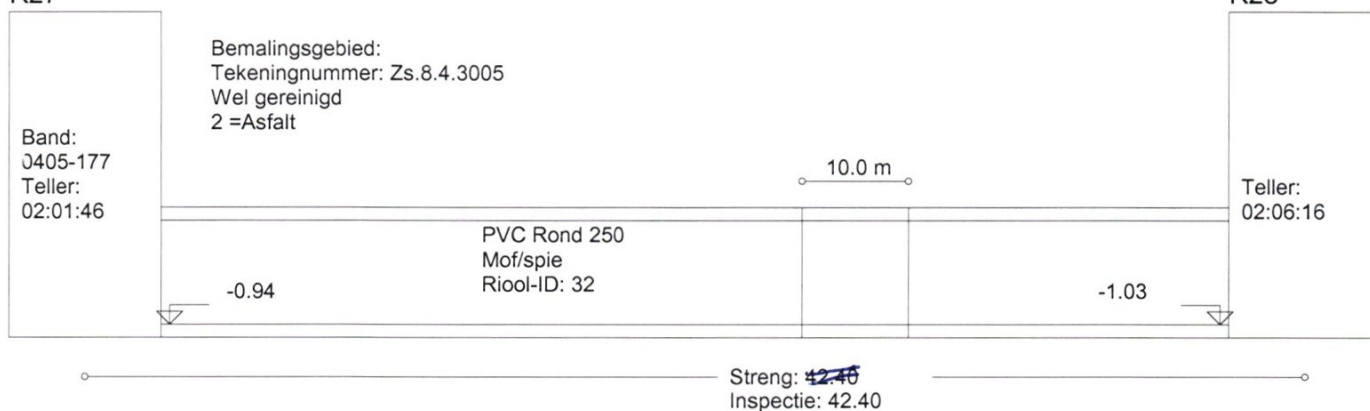**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf


Riool-ID: 32
Stroombeek
R27 - R28

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (02:01:46)				
5,10	B		X1	Prefab inlaat (02:02:20)		12		
10,80	B		X1	Prefab inlaat (02:02:40)		12		
11,70	B		X1	Prefab inlaat (02:02:46)		12		
13,50	B		X1	Prefab inlaat (02:03:09)		12		
17,10	B		X4	Blinde inlaat (02:03:24)		12		
20,40	B		X1	Prefab inlaat (02:03:39)		12		
27,10	B		X1	Prefab inlaat (02:04:17)		12		
32,30	B		X1	Prefab inlaat (02:04:37)		12		
33,10	B		X1	Prefab inlaat (02:04:57)		12		
34,70	B		X1	Prefab inlaat (02:05:07)		12		
42,10	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal 02:05:38)	5			

(zinker i.v.m. waterleiding)


zie blz 65



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
42,40	B		K6	Bocht (02:06:06)				
42,40	B		Z5	Commentaar (Camera niet verder02:06:09)				
42,40	B		Z5	Commentaar (Gedeelte streng gedaan02:06:10)				
42,40	B		Z5	Commentaar (Verder inspectie andere zijde02:06:13)				
42,40	B		Z3	Inspectie afgebroken (02:06:15)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,10	B	Prefab inlaat	12
10,80	B	Prefab inlaat	12
11,70	B	Prefab inlaat	12
13,50	B	Prefab inlaat	12
17,10	B	Blinde inlaat	12
20,40	B	Prefab inlaat	12
27,10	B	Prefab inlaat	12
32,30	B	Prefab inlaat	12
33,10	B	Prefab inlaat	12
34,70	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 61 -

Begin put:
R30

Eind put
R29

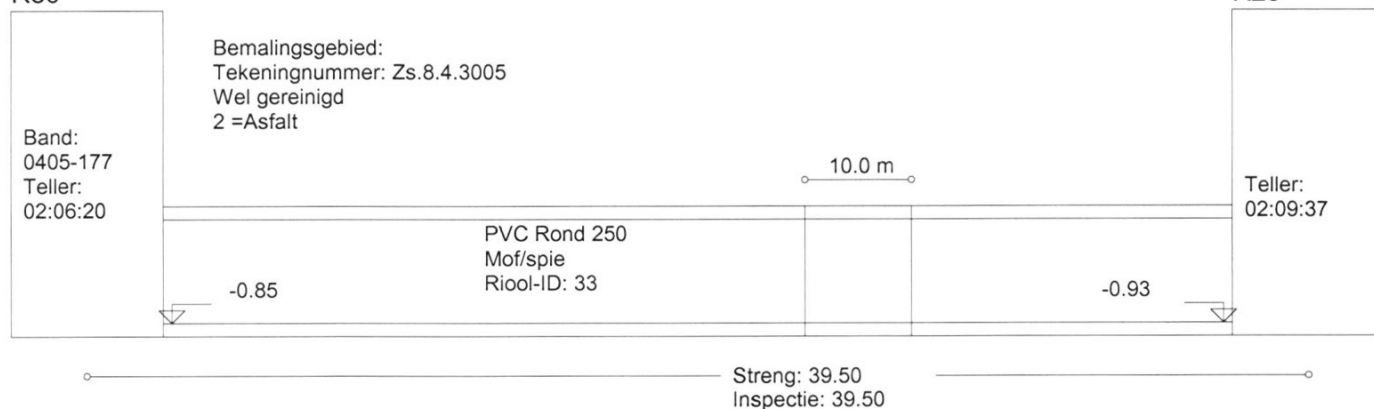**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 33
Stroombeek
R30 - R29

DETAIL GEGEVENS


Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,40	B		Z1	Begin inspectie (02:06:20)				
4,20	B	5,50	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (02:06:31)	2			
5,50	B	10,50	C7	Waterdiepte 25% <= buisvulling <= 50% buishoogte (02:06:38)	3			
10,20	B		X1	Prefab inlaat (02:06:55)		12		
10,50	B	11,70	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (02:07:13)	2			
10,80	B		X1	Prefab inlaat (02:07:18)		12		
11,70	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (02:07:24)	1			
16,40	B		X1	Prefab inlaat (02:07:39)		12		
22,90	B		X1	Prefab inlaat (02:08:13)		12		
33,40	B		X1	Prefab inlaat (02:08:57)		12		
36,40	B		X1	Prefab inlaat (02:09:09)		12		



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
39,50	B		Y3	Inspectieput (Nr R2902:09:34)				
39,50	B		Z2	Einde inspectie (02:09:35)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
10,20	B	Prefab inlaat	12
10,80	B	Prefab inlaat	12
16,40	B	Prefab inlaat	12
22,90	B	Prefab inlaat	12
33,40	B	Prefab inlaat	12
36,40	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 63 -


Begin put:
R29

Eind put
R28

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
02:09:41

Teller:
02:14:23



Streng: 40.50
Inspectie: 40.50

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 34
Stroombeek
R29 - R28

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (02:09:41)				
0,60	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaalc02:09:51)	5			
0,60	B		A6	Inhangende rubberring Rubberring zichtbaar in voeg (02:09:57)	3	03 - 05		
1,20	B		X1	Prefab inlaat (02:10:12)		12		
1,80	B		A5	Hoekverdraaiing Wel geconstateerd (Verticaal02:10:21)	5			
6,10	B		X1	Prefab inlaat (02:10:43)		12		
16,70	B		X1	Prefab inlaat (02:11:26)		12		
21,60	B		X1	Prefab inlaat (02:11:42)		2		
23,20	B		X1	Prefab inlaat (02:12:04)		12		
29,10	B		X1	Prefab inlaat (02:12:23)		12		
40,40	B		Z5	Commentaar (in put/buisverbinding richtingput R34 ring inhange 02:14:07)				



Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
40,40	B		Y3	Inspectieput (nr R2802:14:19)				
40,40	B		Z2	Einde inspectie (02:14:21)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
1,20	B	Prefab inlaat	12
6,10	B	Prefab inlaat	12
16,70	B	Prefab inlaat	12
21,60	B	Prefab inlaat	2
23,20	B	Prefab inlaat	12
29,10	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 65 -

Begin put:
R28

Eind put
R27

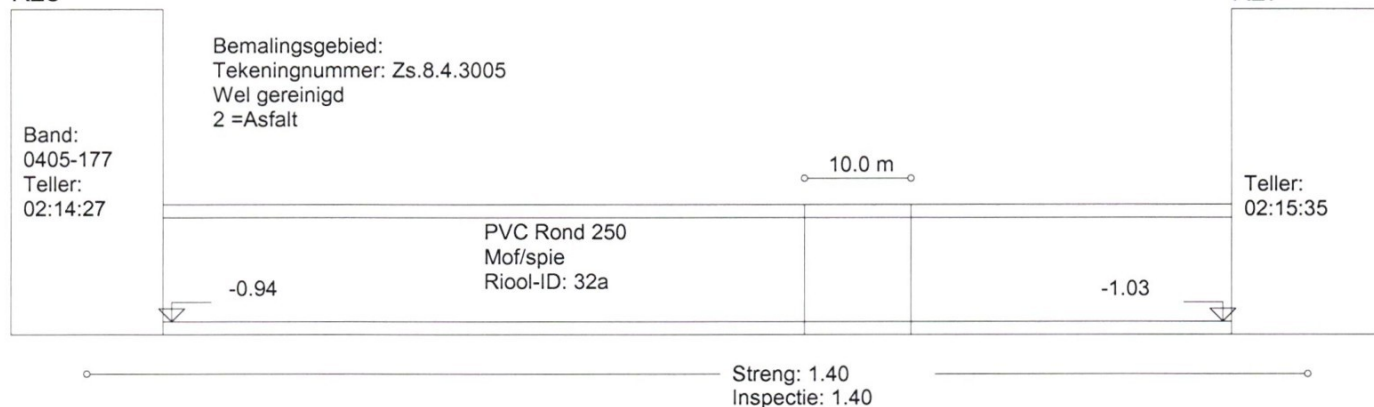**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 32a
Stroombeek
R28 - R27

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (02:14:27)				
1,40	B		K6	Bocht (02:15:25)				
1,40	B		A1	Lekkage Zwetende lekkage (Via voegen tussen buizen02:15:28)	2			
1,40	B		Z5	Commentaar (Camera niet verder02:15:30)				
1,40	B		Z5	Commentaar (Gedeelte streng gedaan02:15:32)				
1,40	B		Z3	Inspectie afgebroken (02:15:33)				






STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 66 -

Begin put:
V29

Eind put
V28

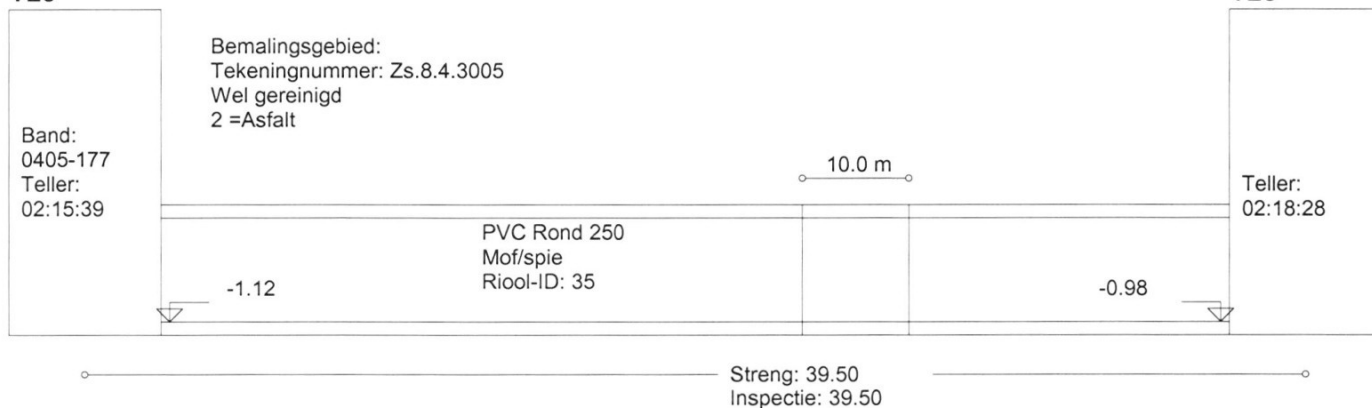**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf


Riool-ID: 35
Stroombeek
V29 - V28

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (02:15:39)				
1,30	B	7,20	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (02:15:40)	2			
7,20	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (02:15:59)	1			
9,90	B		X1	Prefab inlaat (02:16:12)		12		
22,70	B		X1	Prefab inlaat (02:17:15)		12		
32,10	B		X1	Prefab inlaat (02:17:56)		12		
39,50	B		Y3	Inspectieput (Nr V2802:18:25)				
39,50	B		Z2	Einde inspectie (02:18:27)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
9,90	B	Prefab inlaat	12
22,70	B	Prefab inlaat	12
32,10	B	Prefab inlaat	12



STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 67 -


Begin put:
V28

Eind put
V27

Bemalingsgebied:
Tekeningnummer: Zs.8.4.3005
Wel gereinigd
2 =Asfalt

Band:
0405-177
Teller:
02:18:33

Teller:
02:21:39



Streng: 39.30
Inspectie: 39.30

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf


Riool-ID: 36
Stroombeek
V28 - V27

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (02:18:32)				
4,10	B	11,40	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (02:18:55)	2			
5,00	B		X1	Prefab inlaat (02:19:01)		12		
11,40	B		C7	Waterdiepte Buisvulling <= 10% buishoogte (02:19:35)	1			
14,40	B		X1	Prefab inlaat (02:19:47)		12		
26,40	B		X1	Prefab inlaat (02:20:39)		10		
27,10	B		X4	Blinde inlaat (02:20:45)		12		
39,30	B		Y3	Inspectieput (Nr V2702:21:36)				
39,30	B		Z2	Einde inspectie (02:21:37)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
5,00	B	Prefab inlaat	12



Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
14,40	B	Prefab inlaat	12
26,40	B	Prefab inlaat	10
27,10	B	Blinde inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 69 -

Begin put:
V29

Eind put
V30

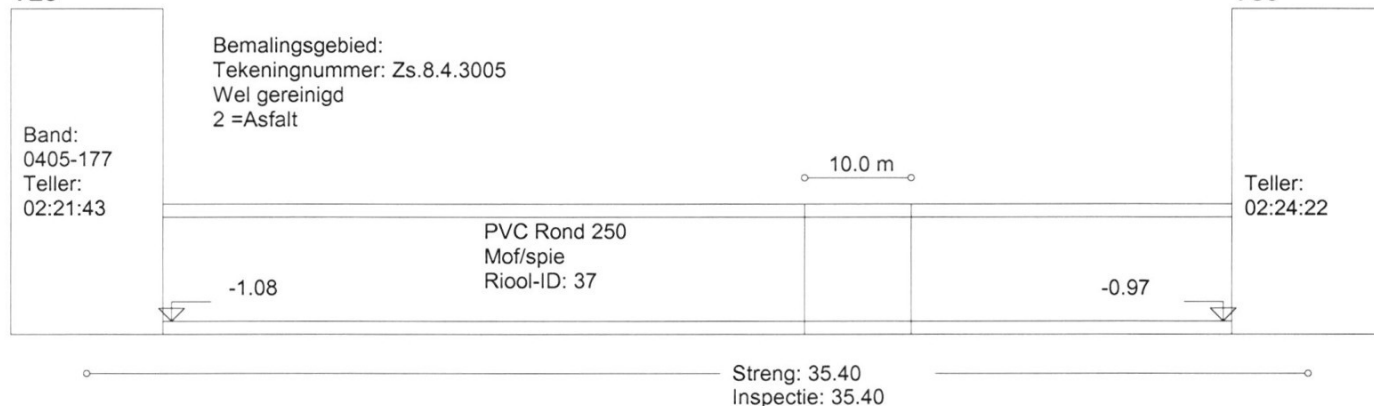**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 37
Stroombeek
V29 - V30

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
1,30	B		Z1	Begin inspectie (02:21:43)				
13,00	B		X1	Prefab inlaat (02:22:41)		12		
25,90	B		X1	Prefab inlaat (02:23:30)		12		
35,40	B		Y3	Inspectieput (Nr V3002:24:19)				
35,40	B		Z2	Einde inspectie (02:24:20)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
13,00	B	Prefab inlaat	12
25,90	B	Prefab inlaat	12




STRENG GEGEVENS

Zwartsluis
Barsbekerbinnenpolder
Stroombeek
08 november 2004

- 70 -

Begin put:
V30

Eind put
V31

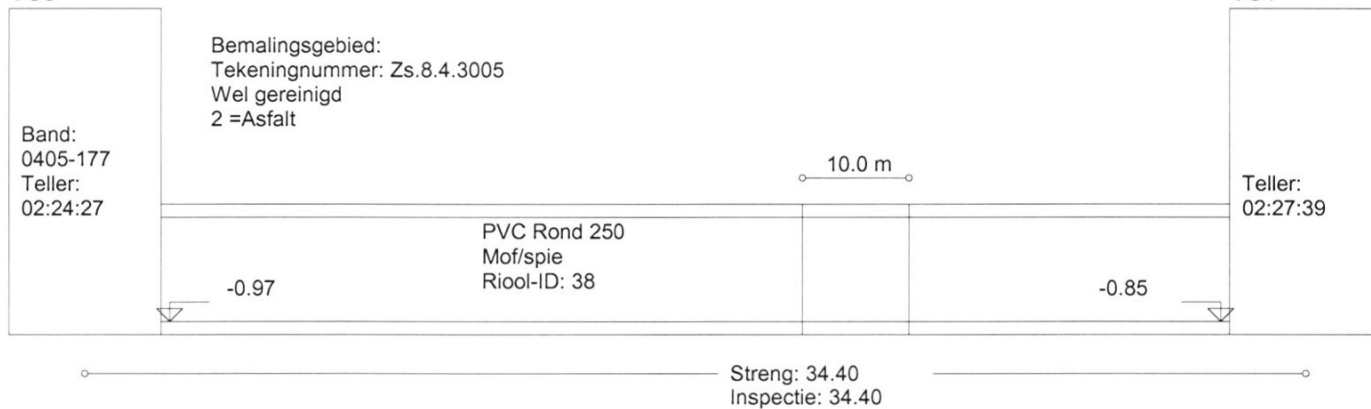**ALGEMENE GEGEVENS**

Opdracht-ID: P17
Inspecteur: ML
Opdrachtgever: Induron bv
Soort inspectie: TV vanuit riool
Commentaar:
Bestand: zwartsluis.suf

Riool-ID: 38
Stroombeek
V30 - V31

DETAIL GEGEVENS

Afstand begin	Uit put	Afstand eind	Co- de	Omschrijving	Klasse	Klok	Video- teller	Foto(*) Clip(ç)
0,00	B		Z1	Begin inspectie (02:24:26)				
0,70	B		X1	Prefab inlaat (02:24:35)		12		
13,50	B		X1	Prefab inlaat (02:25:25)		12		
23,60	B		X1	Prefab inlaat (02:26:10)		12		
26,10	B	34,40	C7	Waterdiepte 10% <= buisvulling <= 25% buishoogte (02:26:34)	2			
33,40	B		X1	Prefab inlaat (02:27:10)		12		
34,40	B		Y3	Inspectieput (Nr V3102:27:34)				
34,40	B		Z2	Einde inspectie (02:27:37)				

INLATEN

Afstand begin	Uit put	Type inlaat	Klok
0,70	B	Prefab inlaat	12
13,50	B	Prefab inlaat	12
23,60	B	Prefab inlaat	12
33,40	B	Prefab inlaat	12



CLASSIFICATIE TABEL

Code	Klasse	Verklaring
------	--------	------------

A= WATERDICHTHEID

A1		Lekkage
	0	Niet waarneembaar
	1	Geen intredend grondwater
	2	Zwetende lekkage
	3	Druppende lekkage
	4	Instromend grondwater
	5	Grondwater spuit in riool
A2		Zandinloop
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	2	Belemmering buisdoorsnede $\leq 5\%$
	3	$5\% \leq$ belemmering buisdoorsnede $\leq 15\%$
	4	$15\% \leq$ belemmering buisdoorsnede $\leq 25\%$
	5	Belemmering buisdoorsnede $> 25\%$
A3		Axiale verplaatsing
	0	Niet waarneembaar
	1	Zie bijlage B NEN 3399
	2	Zie bijlage B NEN 3399
	3	Zie bijlage B NEN 3399
	4	Zie bijlage B NEN 3399
	5	Zie bijlage B NEN 3399
A4		Radiale verplaatsing
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	2	Verplaatsing ≤ 10 mm
	5	Verplaatsing > 10 mm
A5		Hoekverdraaiing
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	5	Wel geconstateerd
A6		Inhangende rubberring
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	3	Rubberring zichtbaar in voeg
	5	Inhangende rubberring geconstateerd
A7		Inhangend voegmateriaal
	0	Niet waarneembaar
	1	Belemmering buisdsn. $\leq 5\%$
	2	Belemmering buisdsn. $> 5\%$ en voegomtrek 0 - 25%
	3	Belemmering buisdsn. $> 5\%$ en voegomtrek 26 - 50%
	4	Belemmering buisdsn. $> 5\%$ en voegomtrek 51 - 75%



Code	Klasse	Verklaring
	5	Belemmering buisdsn. > 5% en voegomtrek >75%

B= STABILITEIT

B1		Beschadiging
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	5	Wel geconstateerd
B2		Aantasting
	0	Niet waarneembaar
	1	Geen grind zichtbaar / PVC:niet geconstateerd.
	2	Grind zichtbaar
	3	Uitstekend grind / zich aftekenende wapening
	4	Uitvallend grind / wapening zichtbaar
	5	Gaten / doorger.wap. / PVC: wel geconstateerd
B3		Scheuren
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	2	Haarscheuren
	3	Niet-openstaande scheur
	4	Openstaande scheur
	5	Buisdelen tov elkaar verschoven/instorting
B4		Deformatie
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	2	Deformatie <= 5% van de middellijn
	3	5% < deformatie <= 10% van de middellijn
	4	10% < deformatie <= 15% van de middellijn
	5	Deformatie > 15% van de middellijn

C= AFSTROMING

C1		Instekende inlaat
	0	Niet waarneembaar
	1	Insteeklengte <= 10% van de rioolhoogte
	3	10% < insteeklengte <= 25% van de rioolhoogte
	5	Insteeklengte > 25% van de rioolhoogte
C2		Wortelingroei
	0	Niet waarneembaar
	1	Niet geconstateerd
	2	Plaatselijk haarwortels
	3	Plaatselijk wortels of wortelscherm <= 25% buisdsn.
	4	25% < wortelscherm <= 50% buisdsn.
	5	Wortelscherm > 50% buisdsn.



Code	Klasse	Verklaring
C3		Aangroei
	0	Niet waarneembaar
	1	Belemmering buisdoorsnede $\leq 5\%$
	2	$5\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 10\%$
	3	$10\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 25\%$
	4	$25\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 50\%$
	5	Belemmering buisdoorsnede $> 50\%$
C4		Afzetting
	0	Niet waarneembaar
	1	Belemmering buisdoorsnede $\leq 5\%$
	2	$5\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 10\%$
	3	$10\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 25\%$
	4	$25\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 50\%$
	5	Belemmering buisdoorsnede $> 50\%$
C5		Zand- vuilophoping
	0	Niet waarneembaar
	1	Belemmering buisdoorsnede $\leq 5\%$
	2	$5\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 10\%$
	3	$10\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 25\%$
	4	$25\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 50\%$
	5	Belemmering buisdoorsnede $> 50\%$
C6		Obstakels
	0	Niet waarneembaar
	1	Belemmering buisdoorsnede $\leq 5\%$
	2	$5\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 10\%$
	3	$10\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 25\%$
	4	$25\% < \text{belemmering buisdoorsnede} \leq 50\%$
	5	Belemmering buisdoorsnede $> 50\%$
C7		Waterdiepte
	0	Niet waarneembaar
	1	Buisvulling $\leq 10\%$ buishoogte
	2	$10\% \leq \text{buisvulling} \leq 25\%$ buishoogte
	3	$25\% \leq \text{buisvulling} \leq 50\%$ buishoogte
	4	$50\% \leq \text{buisvulling} \leq 75\%$ buishoogte
	5	Buisvulling $> 75\%$ buishoogte
C8		Voormalige slibdikte
	0	Niet waarneembaar
	1	Buisvulling $\leq 10\%$ buishoogte
	2	$10\% \leq \text{buisvulling} \leq 25\%$ buishoogte
	3	$25\% \leq \text{buisvulling} \leq 50\%$ buishoogte
	4	$50\% \leq \text{buisvulling} \leq 75\%$ buishoogte
	5	Buisvulling $> 75\%$ buishoogte

K= BOCHTEN E.D.

K1	Verloop diameter
----	------------------

K2	Verloop materiaal
----	-------------------



Code	Klasse	Verklaring
------	--------	------------

K3		Bocht haaks
K4		Bocht haaks links
K5		Bocht haaks rechts
K6		Bocht
K7		Bocht links
K8		Bocht rechts

L= HULPSTUKKEN

L1		Ontstoppingsstuk
L2		Spruitstuk
L3		T-stuk

R= RESTCODES

R1		Reparatie buiswand
R2		Voormalige vervuilingsgr.
R3		Afzetting bodemdeeltjes

X= INLATEN

X1		Prefab inlaat
X2		Ingehakte inlaat
X3		Inlaat
X4		Blinde inlaat
X5		Schroefinlaat
X6		Klikinlaat
X7		Geboorde inlaat
X8		Knevelinlaat
X9		Opzetinlaat

Y= PUTTEN

Y1		Blinde put
----	--	------------



Code	Klasse	Verklaring
------	--------	------------

Y2		Tussenput
----	--	-----------

Y3		Inspectieput
----	--	--------------

Y4		Schildmuur
----	--	------------

Y5		Afsluiter
----	--	-----------

Z= START / EINDE

Z1		Begin inspectie
----	--	-----------------

Z2		Einde inspectie
----	--	-----------------

Z3		Inspectie afgebroken
----	--	----------------------

Z4		Onder water
----	--	-------------

Z5		Commentaar
----	--	------------

I= RELINING

I1		Scheuren
----	--	----------

I2		Plooien
----	--	---------

I3		Deformatie
----	--	------------

D= REPARATIES

D1		Reparatie
----	--	-----------



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
