



Conceptplanning, voortgang afhankelijk van weeromstandigheden en onvoorzien ondergrondse omstandigheden.

Fasering & logistiek

- Uitvoering in verschillende fasen
- Start: 3 november 2025
- Oplevering: mei 2026
- Werkzaamheden 1^e Binnenhavenweg en Visserijkade (oost)

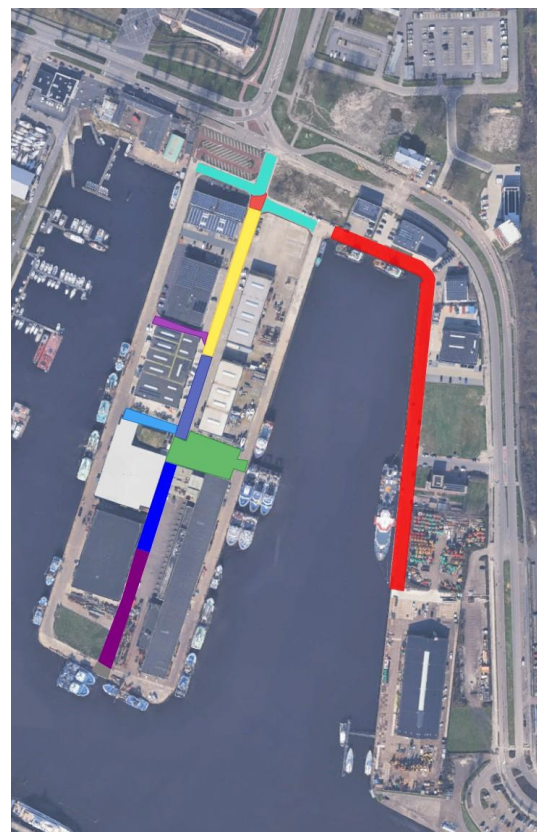


planning

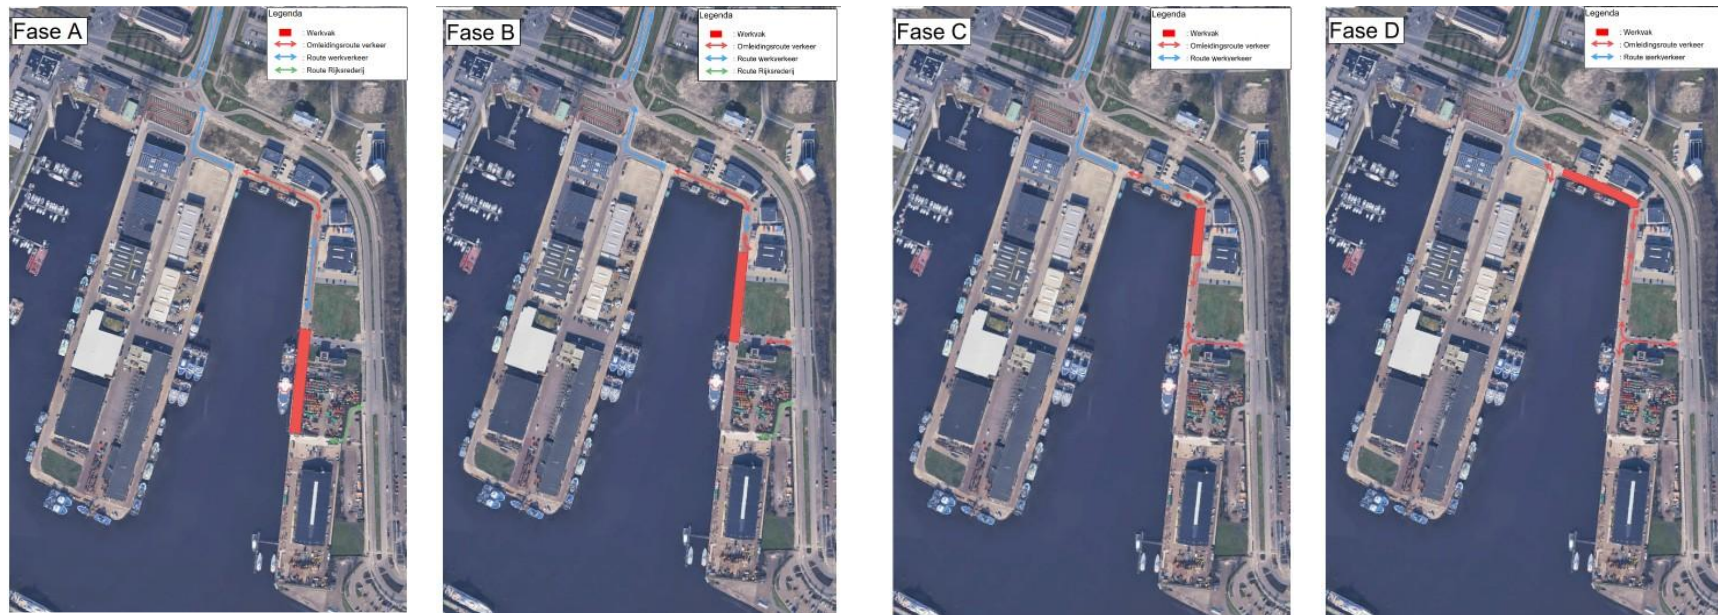

- Uitvoering: Week 46 t/m 51 (10 november t/m 19 december)



planning

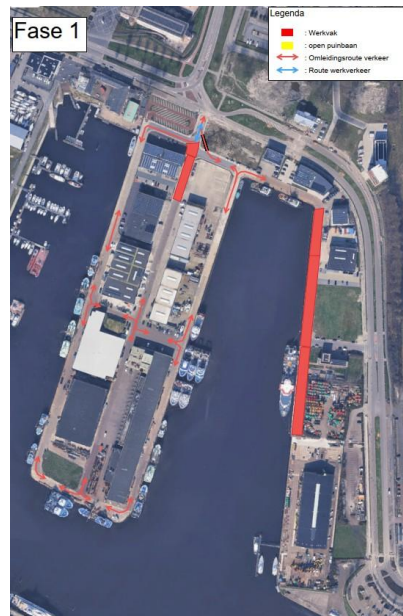

- Verwijderen verharding;
- Aanbrengen riolering;
- Aanbrengen fundering;
- Aanbrengen verharding;
- Aanbrengen eerste laag asfalt
- Tijdens kerstvakantie: 20 december tot 12 januari 2026 bereikbaar.



- Uitvoering: Week 47 t/m 51 (17 november t/m 19 december)

planning

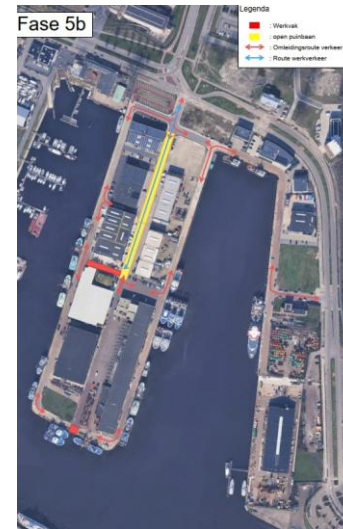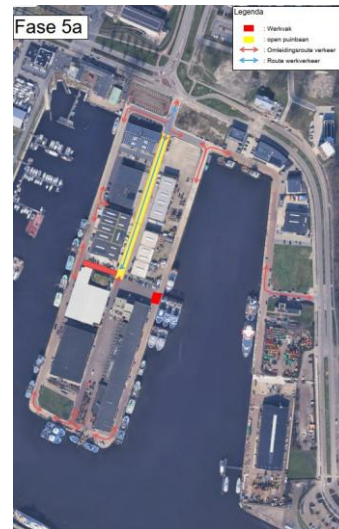


- Fase 3: week 3 t/m 5 (12 januari t/m 30 januari)
- Fase 4: week 5 t/m 7 (26 januari t/m 13 februari)
- Fase 5: week 7 t/m 9 (9 februari t/m 27 februari) – Altijd één route Binnenvaartweg of Visserijkade beschikbaar

planning

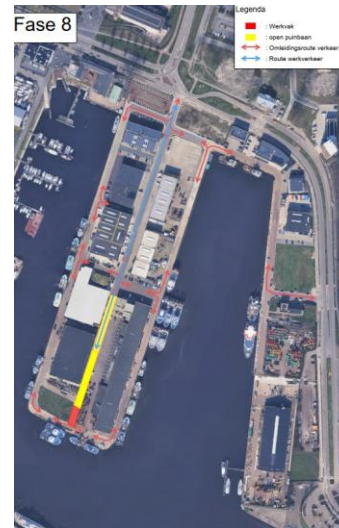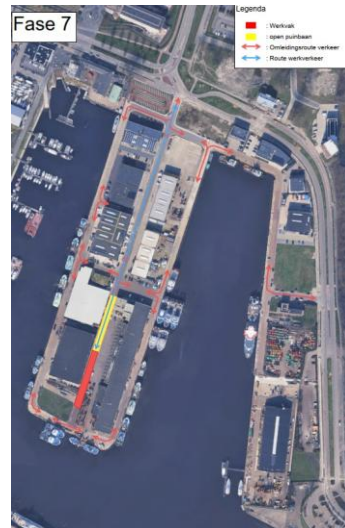

- Fase 6: week 9 t/m 11 (23 februari t/m 13 maart)
- Fase 7: week 11 t/m 13 (9 maart t/m 27 maart)
- Fase 8: week 13 t/m 15 (23 maart t/m 3 april)

planning

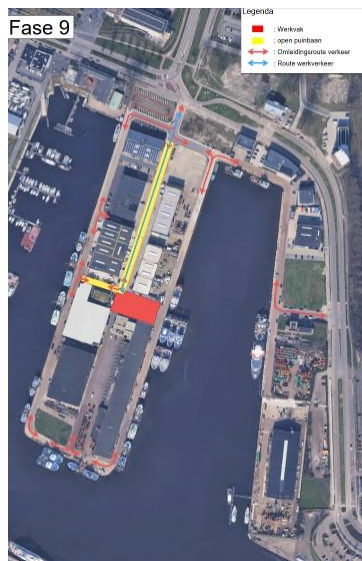

- Fase 9: week 15 t/m 17 (6 april t/m 24 april)
- Fase 10: Aanbrengen goten en asfalt (week 17 t/m 19) – 1^e Binnenhavenweg
