

## HERINRICHTING VAN DE BLESSE: SAMENWERKEN EN DOEN!



### **Beste inwoners en ondernemers van De Blesse,**

**De herinrichting van De Blesse loopt vertraging op. In deze nieuwsbrief informeren we jou daarover.**

Tijdens de werkzaamheden in fase 1 bleek dat de bodem plaatselijk vervuild is. Ook troffen we onbekende kabels en leidingen aan. Deze onvoorziene uitdagingen zijn inmiddels opgelost. Daarnaast bleek dat we het vrijkomende zand niet kunnen hergebruiken. Daarom moet het afgevoerd en nieuw aangevoerd worden. Deze werkwijze kost meer tijd.

In de digitale nieuwsbrief van 24 februari schreven we dat dit vooralsnog geen invloed heeft op de einddatum van de totale herinrichting. We hebben samen met aannemer Roelofs opnieuw naar de aangepaste werkwijze en bijhorende planning gekeken. Helaas blijkt dat het niet haalbaar is om alle werkzaamheden voor de bouwvak gereed te hebben.

### **Planning en fasering wijzigt**

De werkzaamheden aan en de afsluiting van de Steenwijkerweg zorgen voor de meeste overlast. We willen graag dat deze weg zo snel mogelijk weer open kan, zodat het doorgaande verkeer weer kan doorrijden en er geen lange omleidingsroutes zijn. Ook is het belangrijk voor de bereikbaarheid van bedrijven. Daarom hebben we besloten de Steenwijkerweg eerst gereed te maken.


We doen er alles aan om de Steenwijkerweg voor de bouwvak klaar te hebben. Voor de korte termijn zetten we in om fase 1 en 2 zo snel mogelijk open te krijgen, zodat je de kortste route naar Wolvega weer kan gebruiken. De werkzaamheden zouden per fase afzonderlijk worden uitgevoerd. In de nieuwe planning overlappen de fasen elkaar. Hierdoor zijn de werkvakken groter en kunnen we sneller door.

Voordat de werkzaamheden bij jou voor de deur beginnen, word je door Roelofs geïnformeerd over onder andere de bereikbaarheid. Deze week ontvangen de aanwonenden en bedrijven van fase 2 en 4 hierover een brief.

Fase 3 (Spoorlaan) en fase 6 (Markeweg) worden na de bouwvak uitgevoerd. Als het mogelijk is, worden de werkzaamheden eerder uitgevoerd. We houden je hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief.



## Nieuwe planning

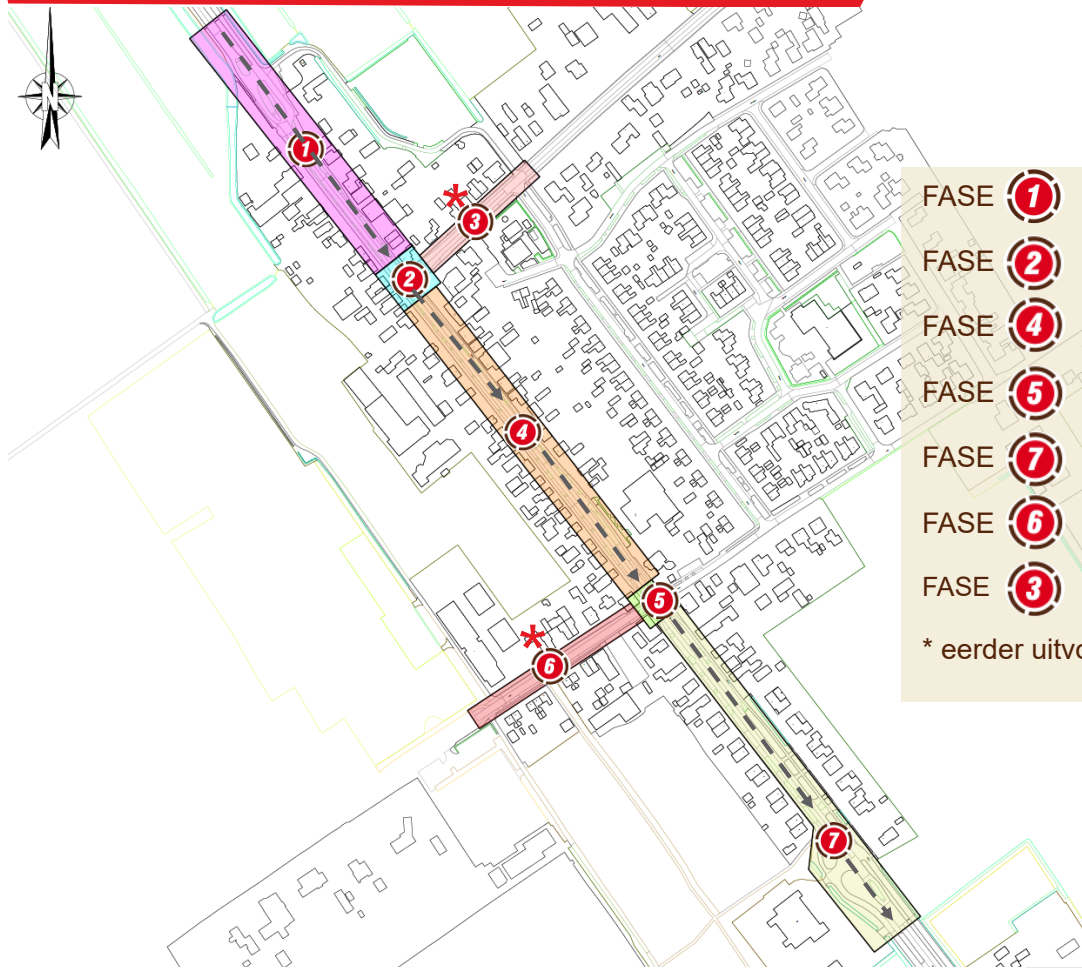

- FASE ① 23-01-23 t/m 25-04-23
- FASE ② 27-03-23 t/m 09-05-23
- FASE ④ 27-03-23 t/m 12-06-23
- FASE ⑤ 24-05-23 t/m 03-08-23
- FASE ⑦ 24-05-23 t/m 03-08-23
- FASE ⑥ uitvoering na de bouwvak\*
- FASE ③ uitvoering na de bouwvak\*

\* eerder uitvoeren indien mogelijk

## Inloopbijeenkomst

We begrijpen dat dit erg vervelend is en dat je vragen hebt.  
Daarom organiseren we op dinsdag 28 maart een inloopbijeenkomst.  
Er wordt tijdens deze bijeenkomst geen presentatie gehouden.  
Je kunt tussen 16.00 en 19.00 uur vrij inlopen en je vragen stellen.

**Datum:** dinsdag 28 maart, 16.00 – 19.00 uur

**Locatie:** dorpshuis 't Centrum (Nieuwstraat 2, De Blesse)

Ook kun je elke dinsdag van 15.00 – 16.00 uur met vragen terecht bij het inloopsprek uur van Roelofs in de kantoorunit ter hoogte van Spoorlaan 27.

### Blijf op de hoogte

Met deze nieuwsbrief en via [www.weststellingwerf.nl/deblesse](http://www.weststellingwerf.nl/deblesse) houden we je op de hoogte van de voortgang van de herinrichting. Je kunt je via deze website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

### Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met:

**Gemeente Weststellingwerf**  
Petra de Ruiter (projectassistent)  
✉ [deblesse@weststellingwerf.nl](mailto:deblesse@weststellingwerf.nl)  
☎ 140561

### Plaatselijk Belang

Erwin Bosma  
✉ [pbdeblesse.peperga@gmail.com](mailto:pbdeblesse.peperga@gmail.com)



gemeente  
**Weststellingwerf**
