

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 4 mei 2023 07:44
Aan: [REDACTED], [REDACTED]
CC: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
Onderwerp: RE: Voeg, reinigen balken en schuiframen Commanderij

Goedemorgen,

De andere voeger laat zich niet uit over de werkzaamheden, hij beaamt enkel het geconstateerde verschil. Ik vind dat wel een nette reactie eerlijk gezegd.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Van: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@doesburg.nl>

Verzonden: woensdag 3 mei 2023 18:18

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>; [REDACTED] <[REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED], [REDACTED]

<[REDACTED]@cultureelerfgoed.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]

laliq.nl>; [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@doesburg.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@geldersgenootschap.nl>

Onderwerp: Re: Voeg, reinigen balken en schuiframen Commanderij

Ik bekijk het op mijn iPhone, de beelden staan onder elkaar, maar ik denk dat je gelijk hebt. De onderste afbeelding is niet wat is afgesproken lijkt mij. Pas op de plaats om erger te voorkomen. Wat vindt de andere voeger ervan?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Met vriendelijke groet

[REDACTED]


Op 3 mei 2023 om 17:20 heeft [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag allen,

Vanochtend ben ik nog even op de bouwplaats geweest om de voegen te beoordelen. Zoals bekend werken er 2 verschillende partijen aan het voegwerk. Het is mij echter wel opgevallen dat er een wezenlijk verschil zit in de kwaliteit van het werk. Ik heb een aantal foto's genomen en deze zojuist nog even bekeken en voor jullie aan deze mail toegevoegd.

Linksboven is het geaccordeerde proefstuk weergegeven. Rechtsboven en linksonder is het voegwerk dat in dezelfde gevel als het proefstuk is uitgevoerd . Rechtsonder is het voegwerk weergegeven dat door een andere partij uitgevoerd wordt. Dit voegwerk wijkt af van het opgezette proefstuk. Gezien het feit dat wij aanstaande dinsdag bij elkaar zijn voor de bouwvergadering, lijkt het mij verstandig om een pas op de plaats te zetten en de werkzaamheden zoals rechtsonder is weergegeven te staken (tenzij er nu gereageerd kan worden dat het akkoord is).

De voeg oogt veel grover van structuur omdat het doorstrijken op een ander moment gebeurt. De opgezette voeg wordt niet afgewerkt waar deze aansluit op de kloostermoppen en het voegwerk is niet terug liggend uitgevoerd zoals dit wel is aangegeven. Daarnaast ontstaat er ook meer smet op de kloostermoppen. Wat gaan wij hier mee doen?

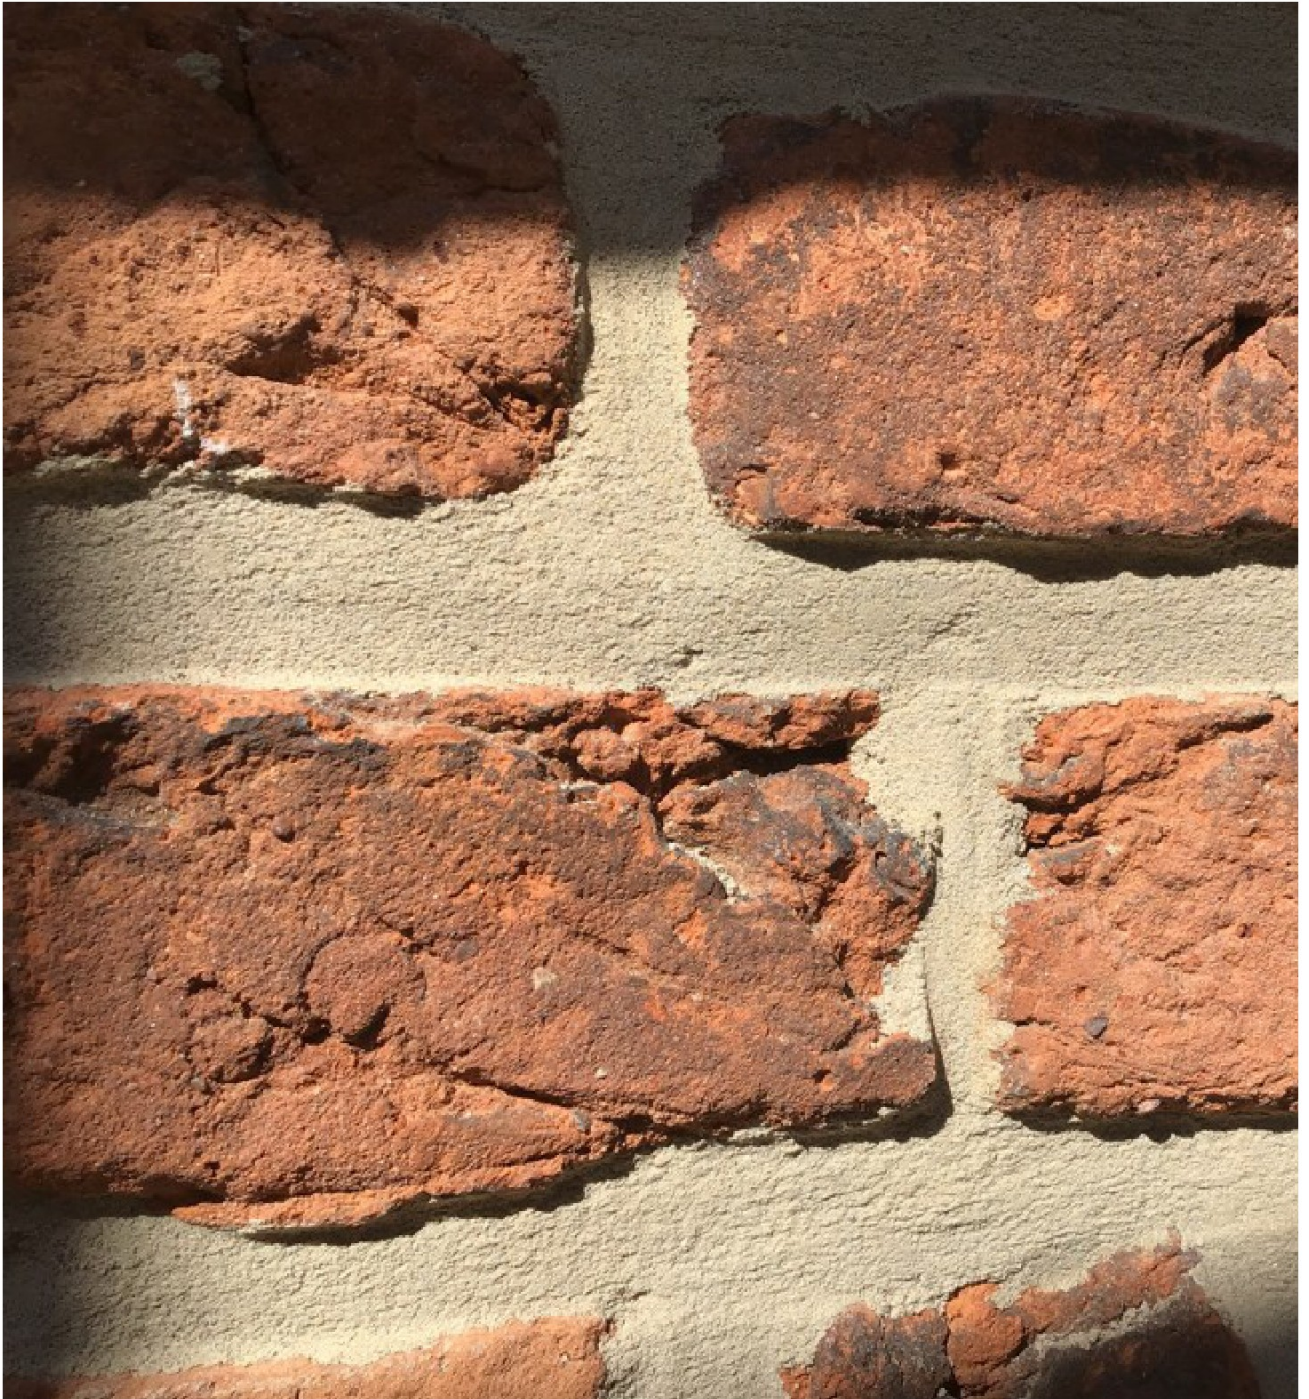



Proefstuk (Akkoord bevonden).

Reeds uitgevoerd door





Reeds uitgevoerd door [REDACTED]
vaklieden.

Uitgevoerd door andere

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem
Postbus 3066
6802 DB Arnhem



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>

Verzonden: vrijdag 3 maart 2023 10:23

Aan: [redacted] <[redacted]@odra.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>; [redacted], [redacted]

<[redacted]@cultureelerfgoed.nl>; [redacted] <[redacted]>; [redacted]

<[redacted]@musee-lalique.nl>

Onderwerp: Voeg, reinigen balken en schuiframen Commanderie

SK
VL

Dag [redacted],

Ik zou jou nog op de hoogte brengen van de uitkomst van het overleg met [redacted] en [redacted]

We hebben drie dingen besproken:

- Voeg

De proefvlakken zijn besproken en na uitgebreid overleg is er afgesproken nog een nieuw proefvlak op te zetten.

Ten behoeve van een juiste vochthuishouding van de gevel waarbij er voldoende evenwicht is tussen steen en voeg wordt nog een test gedaan met een iets grovere samenstelling waardoor de voeg iets 'opener' wordt.

Op zich is de samenstelling van het 2e proefvlak qua kleur en samenstelling goed maar dus te 'dicht'.

Monster 2 rechtsboven:

2 voegzand creme (aanpassen)
0,5 bergzand
0,5 grijs zand
0,75 otterbein 3.5
0,25 grijze cement

Het voorstel is nu om ipv 2 delen voegzand crème, 1 deel netterden en 1 deel brekerzand toe te passen. De voeg mag af en toe wat boller worden uitgevoerd naar de steen boven toe om scherpe delen te voorkomen.

Naderhand testen of de voeg licht kan worden geborsteld.

Volgende week wordt het nieuwe proefvlak opgezet en 22 maart om 16:00 met elkaar beoordeeld.

- reinigen balklaag

Na testen van handmatig reinigen van de moerbalken en kinderbinten is gebleken dat dit te tijdrovend, zwaar is.

Besproken is of er dmv luchtgommen of ijsstralen gereinigd zou mogen worden. Het luchtgommen is akkoord bevonden met de voorwaarden dat dit nog steeds terughoudend uitgevoerd wordt.

De gereinigde stukken uit de test waar met krabber en borstel is gewerkt geven wel het gewenste resultaat.

- vervangen 3 schuiframen

[redacted] heeft de 3 kozijnen uit de voorgevel die eerder zijn beoordeeld gerenoveerd.

De 3 schuiframen uit deze kozijnen zijn voor renovatie meegenomen naar de werkplaats.

De schuiframen bleken alle drie zodanig slecht dat herstel niet echt haalbaar is.

Op basis van de foto's is dit besproken met [redacted] en [redacted] en zij geven aan dat het vervangen inderdaad het beste is.

Onderstaand de pdf met de foto's van de schuiframen.

Verneem graag dat bovenstaande akkoord is.

Met vriendelijke groet,



 tentoonstelling interieur architectuur

