

Belanghebbenden Langestraat en Achterweg

Uw brief van	nvt	Behandeld door	M. Bonestroo	Hasselt, 7 oktober 2024
Uw kenmerk	nvt	Bijlage(n)	nvt	
Ons kenmerk		Onderwerp	werkzaamheden Langestraat en Achterweg	

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag informeer ik u in deze brief over de planning van de werkzaamheden in de Langestraat en omgeving. Deze planning is zeer sterk afhankelijk van diverse zaken zoals o.a. het weer en de aanwezigheid van (vaak onbekende) kabels en leidingen maar ook de bodemsamenstelling. Ondanks een uitgebreid vooronderzoek is het niet mogelijk alles goed in beeld te krijgen. Daarom lopen tijdens de werkzaamheden soms tegen onverwachte zaken aan die van invloed kunnen zijn op de planning.

Daarom wordt u de komende tijd regelmatig geïnformeerd over de planning die regelmatig ge-updatet wordt.

De planning

De verschillende werkzaamheden worden door twee aannemers uitgevoerd. Aannemer Siers voert de werkzaamheden uit met betrekking tot het vervangen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden als eerste uitgevoerd. We hebben daar nu plannings van beschikbaar t/m april 2025. In bijlage 1 zijn kaartbeelden opgenomen met de fasen en de uitvoeringsperiode per fase. Die zijn ook in de tabel 1 weergegeven.

Na deze werkzaamheden komt de tweede aannemer Roelofs. Zij voeren werkzaamheden aan de riolering uit. Na deze werkzaamheden wordt de weg volledig hersteld. We hebben voor deze werkzaamheden nu de plannings tot 1 januari 2025 in deze brief opgenomen. Zodra we nieuwe plannings hebben wordt u daar z.s.m. nader over geïnformeerd. Ook deze werkzaamheden zijn per fase weergegeven in bijlage 2 en tabel 1.

De werkzaamheden worden in verschillende fasen/delen uitgevoerd. Deze fasen zijn in de bijlagen voor beide aannemers weergegeven. In onderstaande tabel is nog e.e.a. verduidelijkt.

	Aannemer Siers kabels en leidingen	Aannemer Roelofs riolering
Fase 3; Langestraat; van huisnr 197 t/m huisnr 221		25 september 2024 t/m 13 november 2024
Fase 4: Langestraat Van huisnr. 185 t/m huisnr. 197		15 oktober t/m 1 november 2024
Fase 5: Langestraat: van huisnr. 167 t/m huisnr. 185		29 oktober t/m 22 november 2024
Fase 6: Langestraat: Van huisnr. 139 t/m 167	5 september t/m 15 november 2024	Van 12 november t/m 10 december 2024
Fase 6.2: Jaagpad; Van huisnr. 7 tot Schoolstraat	16 oktober 2024 t/m 8 november 2024	
Fase 7: Langestraat en Stadssteeg: van huisnr 139 t/m Stadssteeg	Van 6 november t/m 26 november 2024	
Fase 8: Langestraat tussen Stadssteeg en Molensteeg	Van 25 november t/m 20 december 2024	
Fase 9: Langestraat van Molensteeg t/m huisnr.: 61-65	Van 6 januari t/m 24 januari 2025	
Fase 10: Langestraat van nr.: 61-65 tot Simondsstraat	Van 27 januari t/m 14 februari 2025	
Fase 11: Simondsstraat van nr. 2 t/m nr. 12	Van 17 februari 2025 t/m 7 maart 2025	
Fase 12: Langestraat van Simondsstraat tot Bodemansteeg	Van 10 maart t/m 11 april 2025	
Fase 13: Langestraat van Bodemansteeg tot huisnr. 19	Van 14 april t/m 29 april 2025	

Tabel 1: overzicht werkzaamheden per aannemer per fase

We informeren u hierover via deze brieven maar u kunt hier ook kennis van nemen via de gemeentelijke website via www.zwartewaterlandinzicht.nl Daar wordt u ook nader geïnformeerd over zaken als parkeren, afzettingen en omleidingen en de aanbiedingspunten voor de afvalcontainers.

Inloopmoment

Naast deze informatiebrief en de informatie op de website bieden we u ook de gelegenheid om langs te komen met vragen, reacties of opmerkingen.

We gaan vanaf donderdag 17 oktober van 16-17 uur wekelijks een inloopmoment organiseren. U kunt ons dan in de keet van Roelofs (vooraan op parkeerterrein voetbalvereniging) vinden en vragen stellen aan de aanwezigen daar. Aanwezig zullen zijn vertegenwoordigers van gemeente en beide aannemers.

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot ondergetekende via m.bonestroo@zwartewaterland.nl

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mente Bonestroo
Omgevingsmanager
Gemeente Zwartewaterland

BIJLAGE 1: werkzaamheden aannemer Siers (kabels en leidingen) per fase

Planning / Fasering - Fase 6



LEGENDA



Fase 6: werkzaamheden van 05-09-2024 t/m 15-10-2024



Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer



Planning / Fasering - Fase 6.2




LEGENDA



Fase 6,2; werkzaamheden van 16-10-2024 t/m 08-11-2024




Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

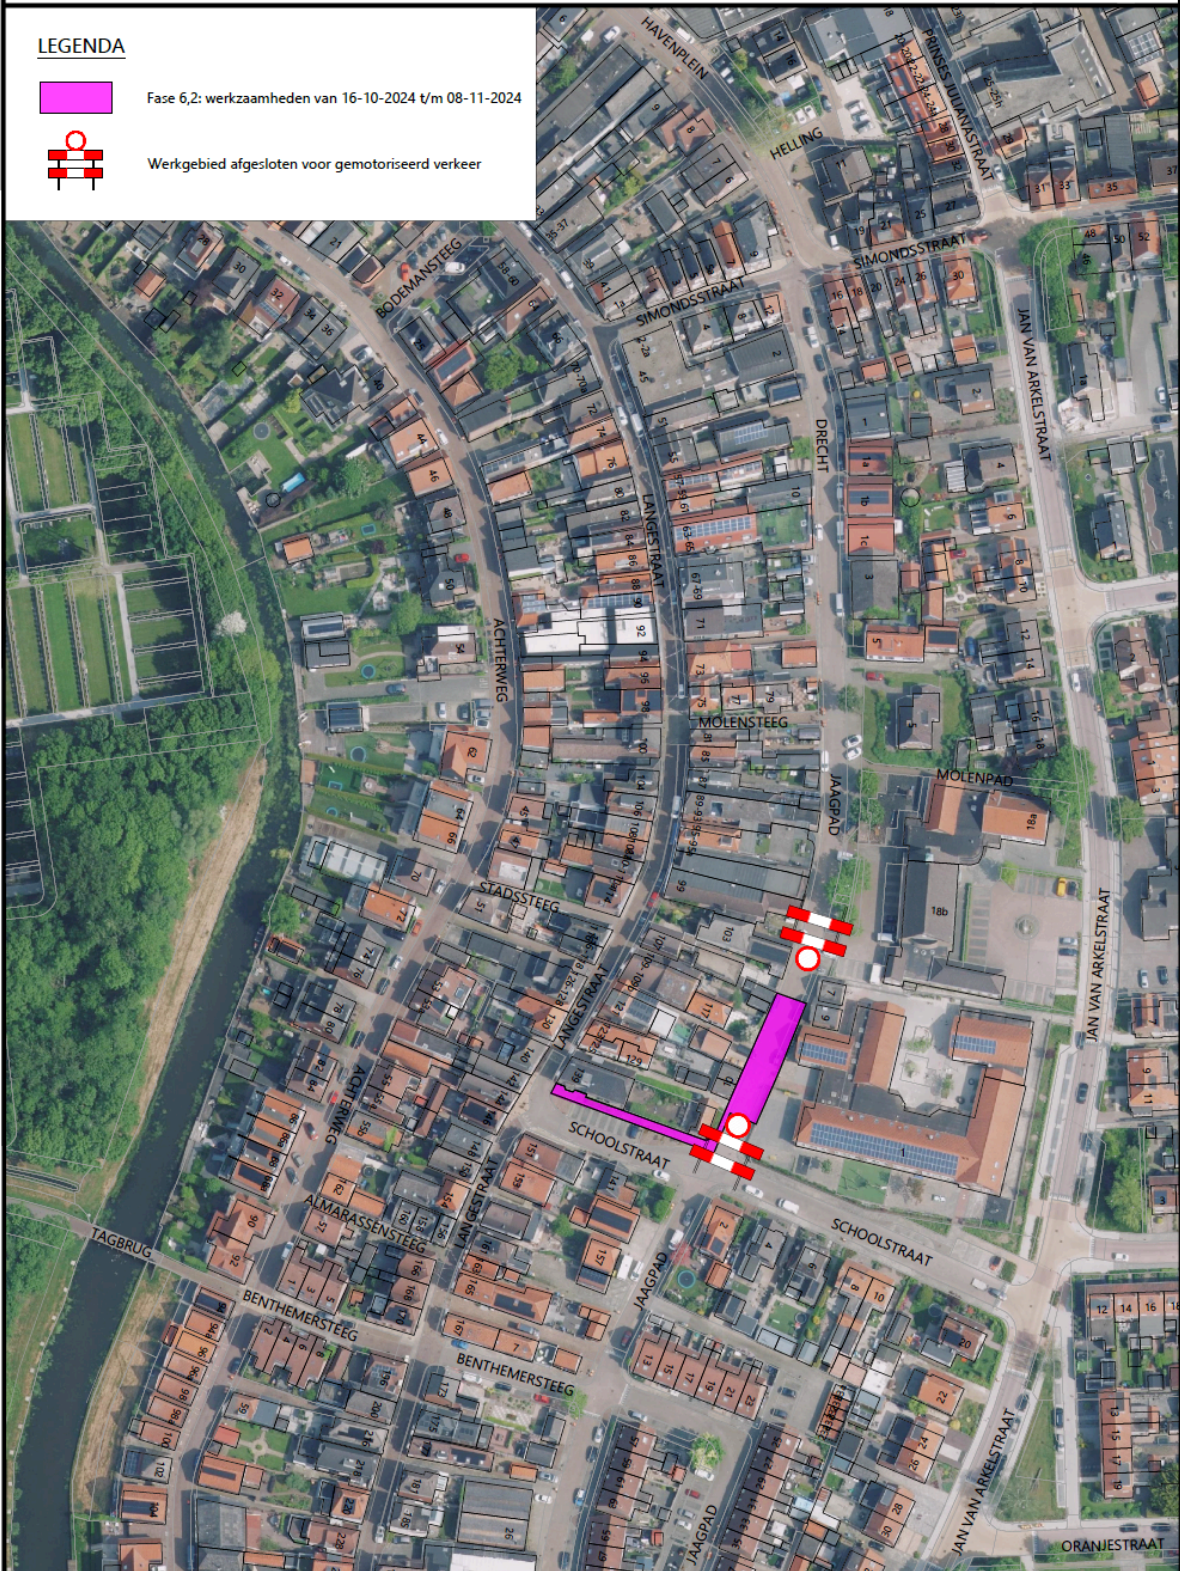



Planning / Fasering - Fase 7 en 8



LEGENDA

 Fase 7: werkzaamheden van 06-11-2024 t/m 26-11-2024

 Fase 8: werkzaamheden van 25-11-2024 t/m 20-12-2024




 Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer




Planning / Fasering - Fase 9 en 10



LEGENDA

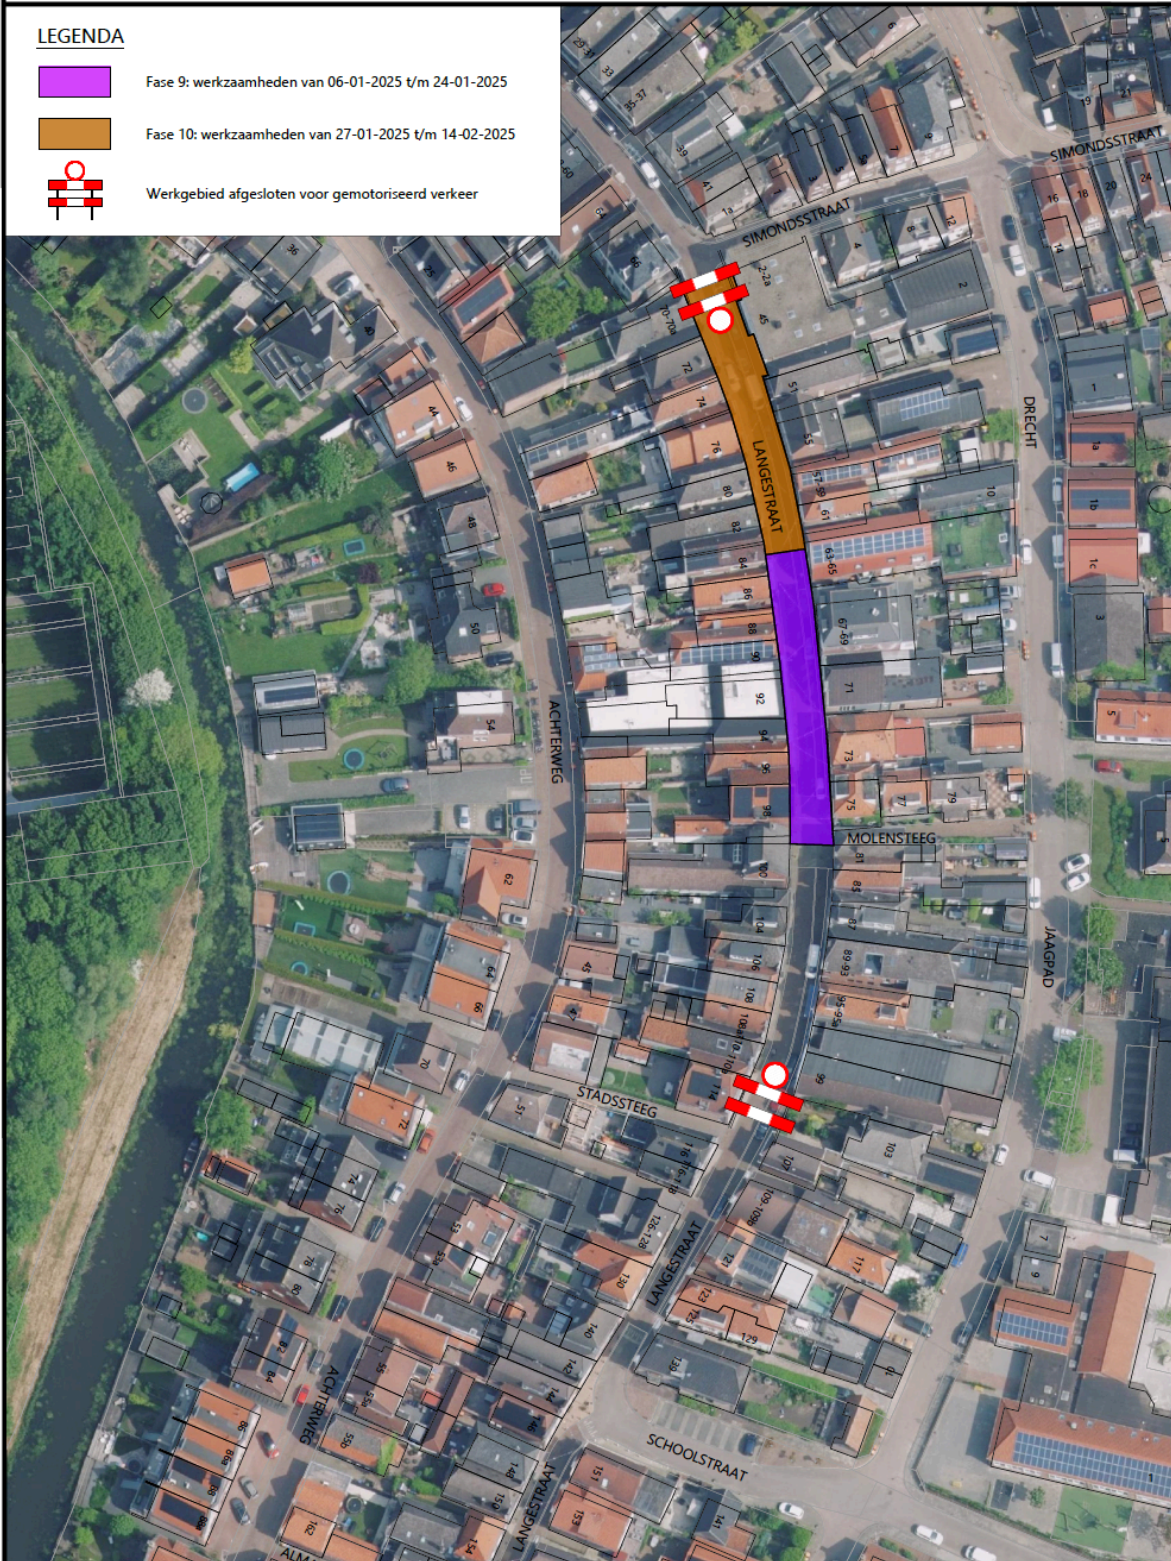

-  Fase 9: werkzaamheden van 06-01-2025 t/m 24-01-2025
-  Fase 10: werkzaamheden van 27-01-2025 t/m 14-02-2025
-  Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer




Planning / Fasering - Fase 11



LEGENDA

-  Fase 11: werkzaamheden van 17-02-2025 t/m 07-03-2025
-  Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

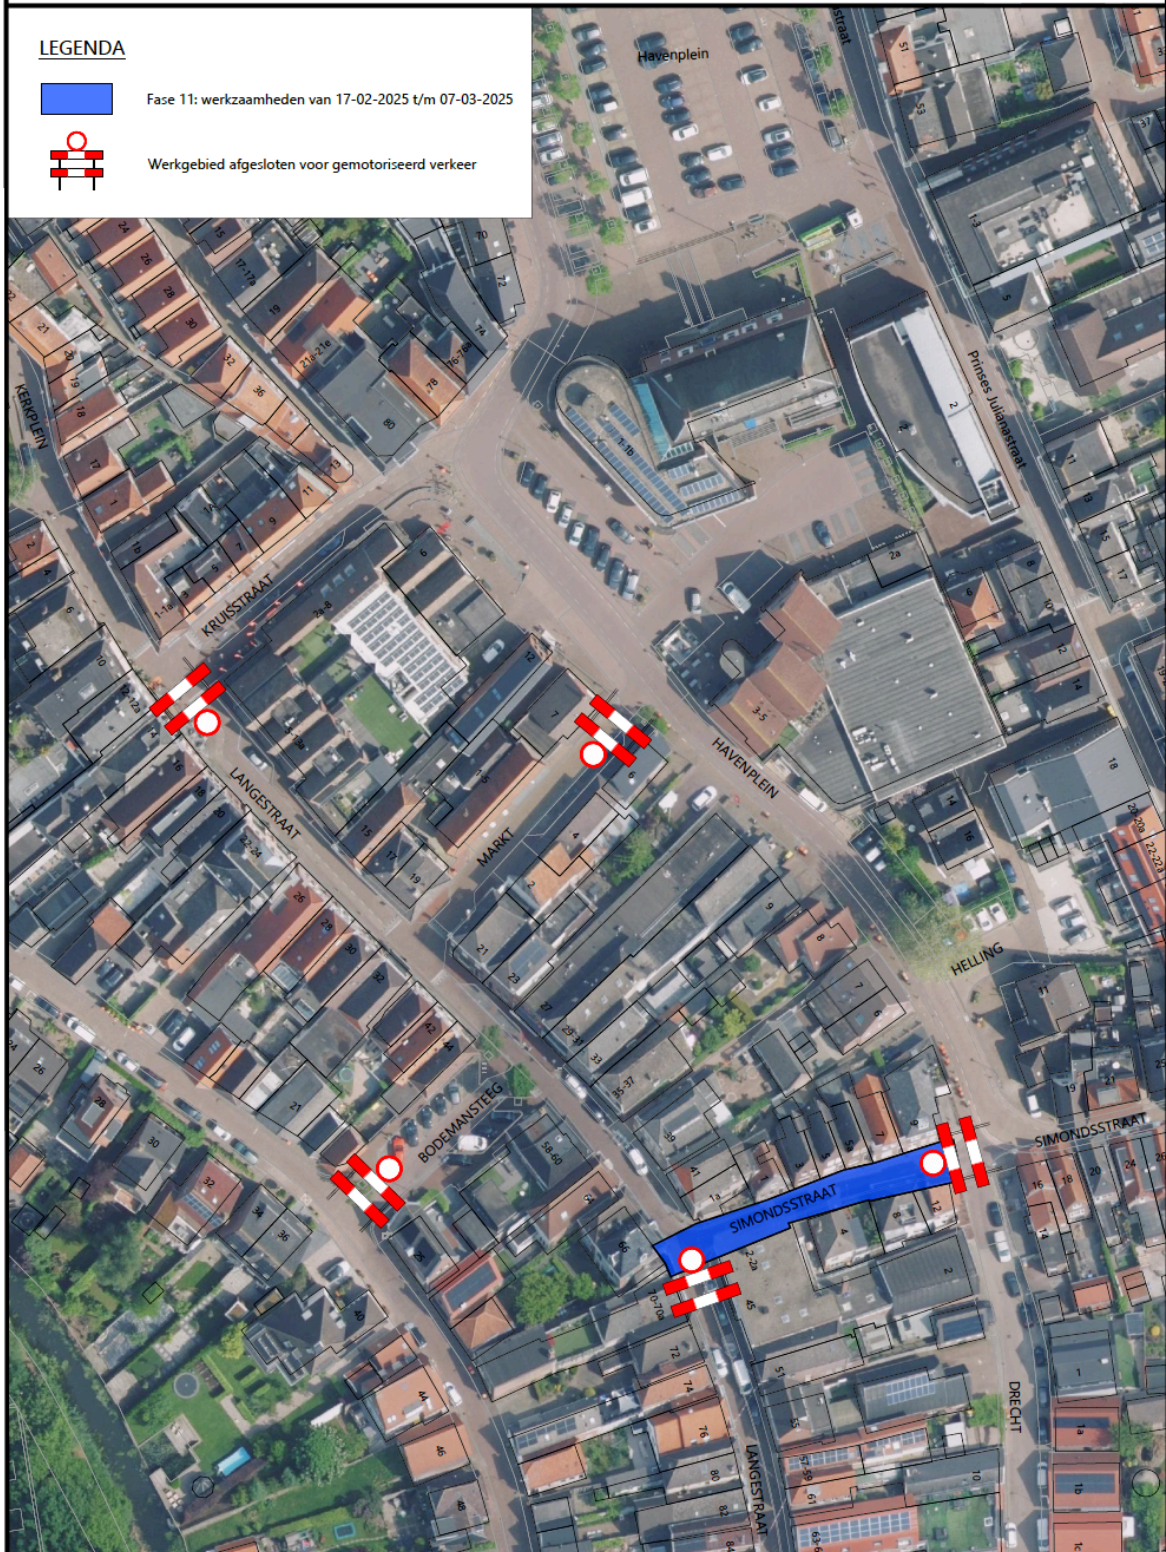

Planning / Fasering - Fase 12



LEGENDA



Fase 12: werkzaamheden van 10-03-2025 t/m 11-04-2025




Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer



Planning / Fasering - Fase 13



LEGENDA

 Fase 13: werkzaamheden van 14-04-2025 t/m 29-04-2025

 Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer



BIJLAGE 2: werkzaamheden aannemer Roelofs (riolering) per fase

Planning / Fasering - Fase 3 en 4

LEGENDA



Fase 3: werkzaamheden van 25-09-2024 t/m 13-11-2024



Fase 4: werkzaamheden van 15-10-2024 t/m 1-11-2024



Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer



Planning / Fasering - Fase 5



LEGENDA



Fase 5: werkzaamheden van 29-10-2024 t/m 22-11-2024



Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer



Planning / Fasering - Fase 6

LEGENDA



Fase 6: werkzaamheden van 12-11-2024 t/m 10-12-2024



Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

