




Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

Bestuurlijk overleg 380kV VVL-ENS

20 November 2025

KGG & TenneT

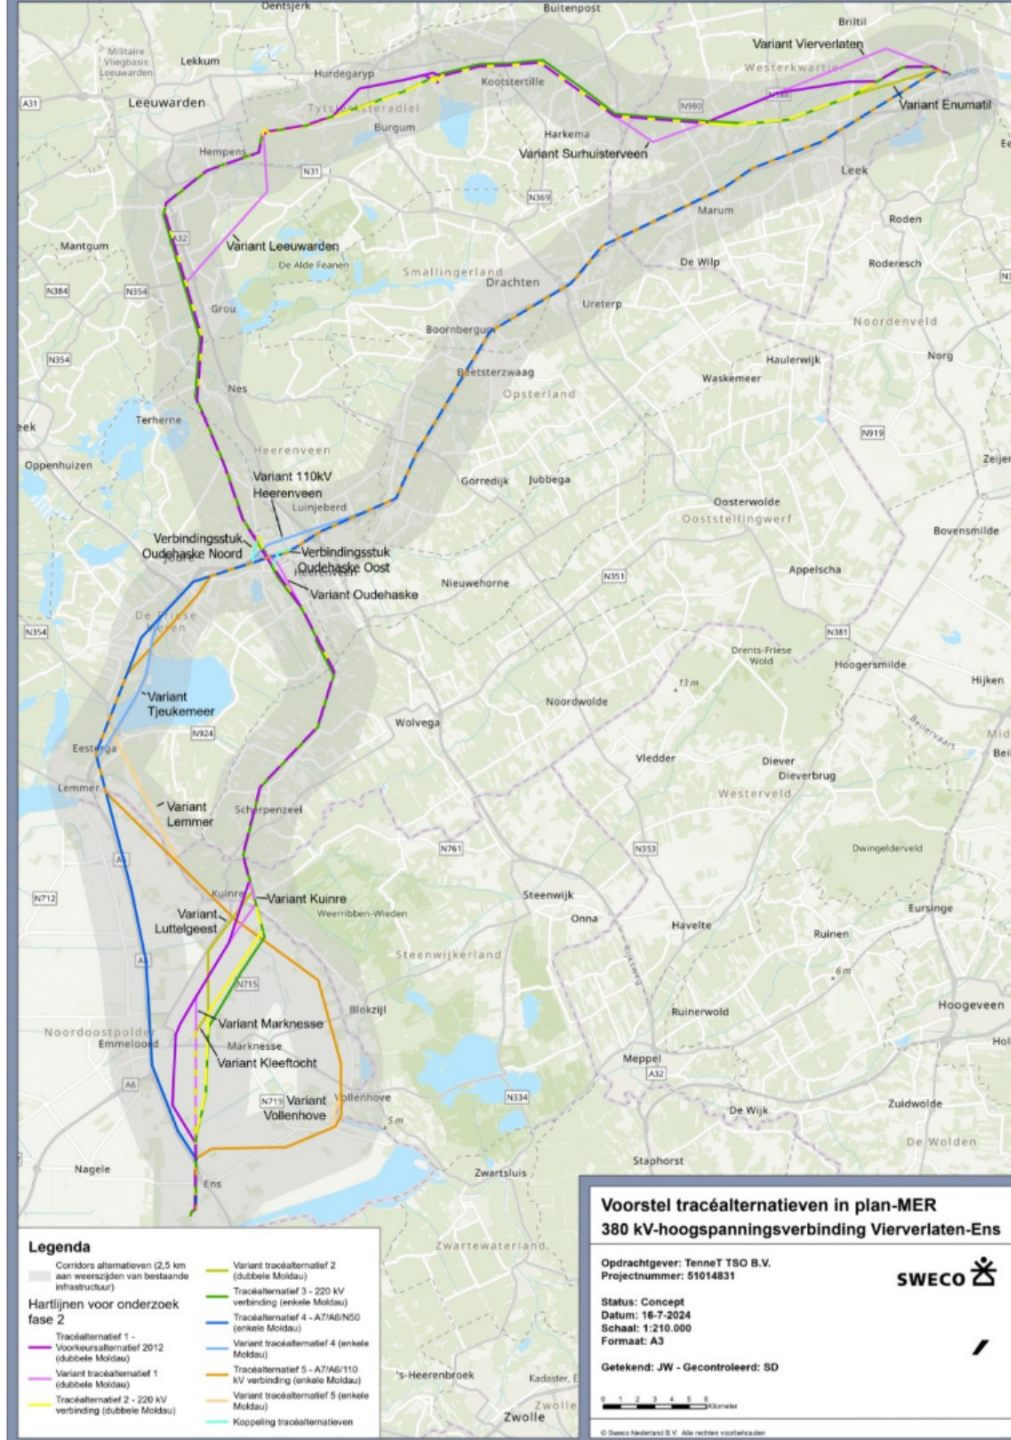



Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag overleg 10 juli 2025
4. Toelichting provincies op regioadvies
5. IP 2026 en toekomstvastheid
6. Kosten 220 kV opwaardering
7. Nadeelcompensatie en aankoopbeleid
8. Proces en planning richting ontwerp-Voorkeursbeslissing
9. Communicatie
10. Rondvraag en sluiting



Toelichting namens provincies op regioadvies



IP en Toekomstvastheid

- › Ontwerp investeringsplan is gepubliceerd
 - › Inbedrijfname (IBN) van het project is aangepast naar een bandbreedte van 2035 – 2038
 - › Streven is 2035, risico op uitloop wordt geschat op max. 3 jaar
- › Meer bouwen op 380kV net lastig te realiseren
 - › Landelijk 380kV net loopt tegen technische grenzen aan
 - › Toekomstige oplossingen vergen een andere aanpak
 - › Beter gebruik maken van het huidige net, bijvoorbeeld ombouw 220kV naar 380kV
 - › mogelijke gelijkstroomoplossingen van diepe aanlandingen wind op zee
 - › matchen van vraag en aanbod met een gebiedsgerichte aanpak
- › Nut en noodzaak voor dit project is groot
- › Vanuit toekomstvastheid is een dubbele mastenrij de meest logische keuze



Kosten 220kV opwaardering

- › In de IEA is gekozen vanuit de systematiek voor een index getal
- › De mogelijke kosten vallen ook binnen een bandbreedte
- › De kosten van de 220kV opwaardering hebben een hogere mate van onzekerheid
 - › De levensduur (inclusief stichtingskosten) van de dubbele mastenrij is makkelijker in te schatten
 - › Opwaardering van de 220kV zou parallel uitgevoerd moeten worden, startende vanaf 2030
 - › Daarbij zal de 220kV uitgezet moeten worden om de werkzaamheden uit te voeren
 - › Creëert afhankelijkheid met de bouw van dit project en vormt daardoor een risico
- › We verwachten een efficiëntie slag te kunnen behalen bij de aanleg van de dubbele mastenrij
 - › Dit is meegenomen in de analyse van de kosten



Nadeelcompensatie en aankoopbeleid

- Convenant TenneT & KGG
 - Update: Laatste stand van zaken
- Planschade
 - Toelichting
 - Werkwijze RVO: [Brochure Planschade.pdf](#)



Proces en planning richting ontwerp-Voorkeursbeslissing

Wanneer	Wat
20 november 2025	Bestuurlijk overleg – toelichting regioadvies
19 december 2025	Ambtelijk delen conceptversie ontwerp-VB
Januari 2026	Ambtelijke reactie op conceptversie
Begin februari 2026	Ambtelijk overleg
Eind februari 2026	Bestuurlijk overleg
Eind maart 2026	Publicatie ontwerp-VB
April-mei 2026	Terinzagelegging ontwerp-VB, integrale effectenanalyse en deelrapporten • vanaf medio april informatieavonden



Communicatie

- Webinar voor Raden en Staten georganiseerd op 22 september 2025
- Publieksvriendelijke samenvatting van de IEA in een hand-out en Storymaps
- Brede communicatie rondom terinzagelegging: informatieavonden, brieven aan direct belanghebbenden
- Doorlopende communicatie
 - In contact met inwoners via de projectatlas, e-mail en telefonisch
 - Dorpsbelangen informeren over publicatie regioadvies en concept-IEA
 - Update projectwebsites
 - Nieuwsbrief over publicatie regioadvies en concept-IEA



Rondvraag en sluiting

