


Bijlage 11. Verkeersplan

In deze bijlage zijn de verkeersplannen weergegeven. Hierin is opgenomen:

- Overzicht polder Katwoude met kaders waarvan verkeersplannen zijn
- Uitgangspuntenoverzicht voor uitvoering:
 - o Aanbrengen damwand vanaf werkbaan traject Oost
 - o Aanbrengen damwand vanaf werkbaan traject West
 - o Aanbrengen damwand vanaf weg traject Oost
 - o Aanbrengen damwand vanaf weg traject Midden
 - o Aanbrengen damwand vanaf weg traject West
- Verkeersplannen aangeleverd door BUKO:
 - o Damwand werkbaan Oost (23.21.0521.1)
 - o Damwand werkbaan Midden (23.21.0521.2)
 - o Damwand weg Oost (23.21.0524.1)
 - o Damwand weg Midden (23.21.0522.1)
 - o Damwand weg West (23.21.0535.1)

Let op, op het moment van het maken van de verkeersplannen was het nog niet mogelijk om i.p.v. het verkeersbord C01 op verkeersbord L10 te vervangen door verkeersbord L08. BUKO heeft aangegeven dat het wel mogelijk is dit bord er op te plaatsen, dit is een sterke wens vanuit de omgeving. Hier dient nog afstemming over plaats te vinden en komt er dan ongeveer als volgt uit te zien met daaronder nog de borden zoals in het verkeersplan al reeds aangegeven.



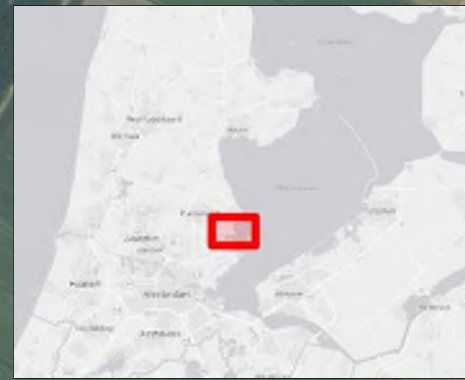

Volendam

N517

M11

N247

M11a

Katwoude

M12a traject oost

M12 Binnendijks

M12a traject West



M12a traject Midden

Hogedijk

Monnickendam

Marken



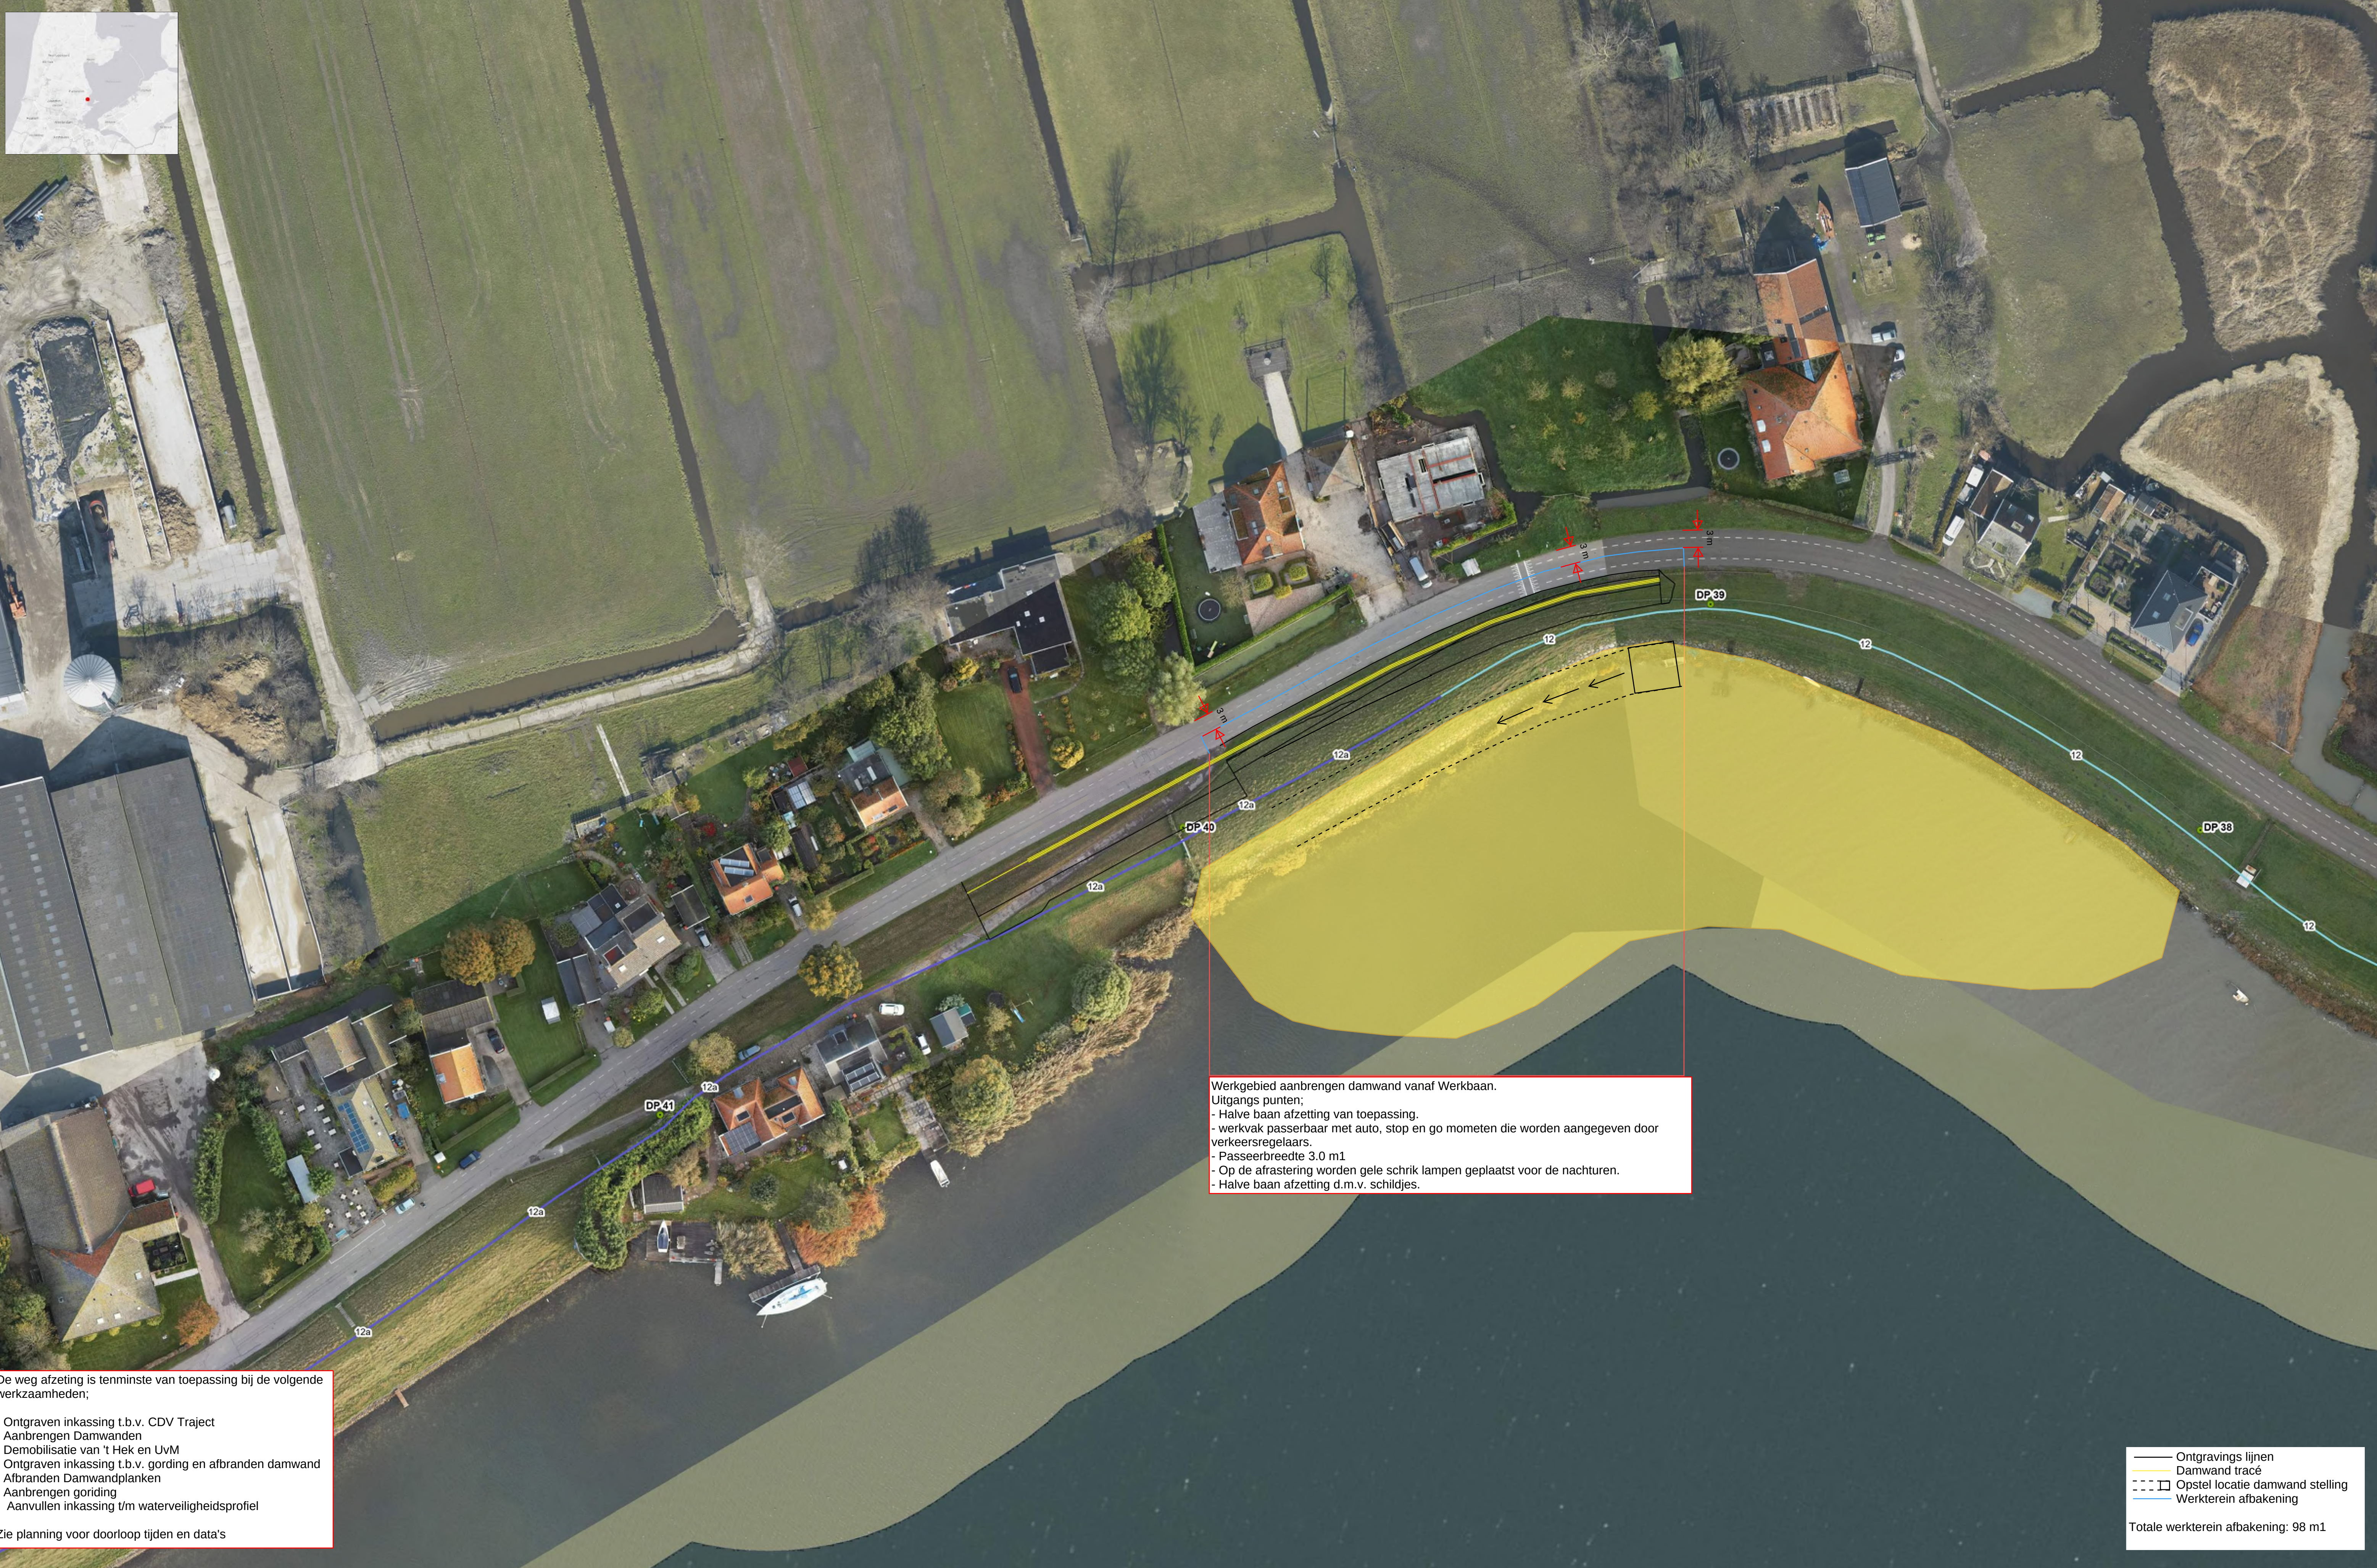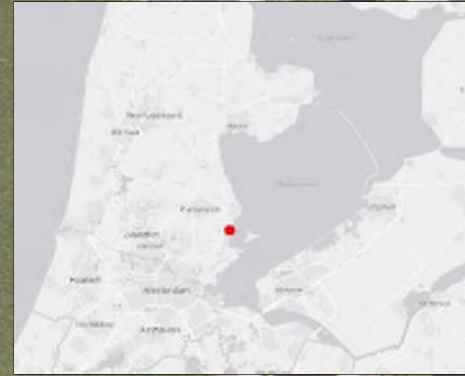

Werkgebied aanbrengen damwand vanaf Werkbaan.
Uitgangs punten;
- Halve baan afzetting van toepassing.
- werkvak passerbaar met auto, stop en go mometen die worden aangegeven door verkeersregelaars.
- Passeerbreedte 3.0 m1
- Op de afrastering worden gele schrik lampen geplaatst voor de nachturen.
- Halve baan afzetting d.m.v. schildjes.

De weg afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Ontgraven inkassing t.b.v. CDV Traject
- Aanbrengen Damwanden
- Demobilisatie van 't Hek en UvM
- Ontgraven inkassing t.b.v. gording en afbranden damwand
- Afbranden Damwandplanken
- Aanbrengen gording
- Aanvullen inkassing t/m waterveiligheidsprofiel


Zie planning voor doorloop tijden en data's

— Ontgravings lijnen
— Damwand tracé
- - - Opstel locatie damwand stelling
— Werkterrein afbakening

Totale werkterrein afbakening: 98 m1

Project:	Projectnaam Aanbrengen damwand vanaf werkbaan	Datum:	08-06-2023
Tekeningnummer:	-Tekeningnummer-	Schaal:	1:500
Tekeningomschrijving:	-Tekeningomschrijving-	Formaat:	A1 Liggend (841 x 594 mm)



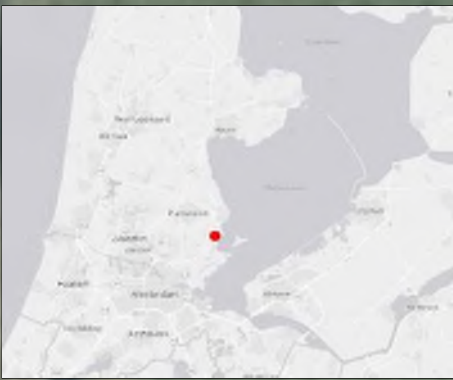

De weg afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Ontgraven inkassing t.b.v. CDV Traject
- Mobilisatie van t Hek
- Aanbrengen Damwanden
- Ontgraven inkassing t.b.v. gording en afbranden damwand
- Afbranden Damwandplanken
- Aanbrengen goriding
- Aanvullen inkassing t/m waterveiligheidsprofiel

Zie planning voor doorloop tijden en data's

Werkgebied aanbrengen damwand vanaf Werkbaan.
Uitgangs punten;
- Halve baan afzetting van toepassing.
- werkvak passerbaar met auto, stop en go mometen die worden aangegeven door verkeersregelaars.
- Paseer breedte: 3m1
- Op de afrastering worden gele schrik lampen geplaatst voor de nachturen.
- Halve baan afzetting d.m.v. schildjes

Ontgravings lijnen

Damwand tracé


Opstel locatie damwand stelling

Werkterrein afbakening

Totale werkterrein afbakening: 34 m1

Project:	Projectnaam Aanbrengen damwand vanaf werkbaan	Datum:	08-06-2023
Tekeningnummer:	-Tekeningnummer-	Schaal:	1:500
Tekeningomschrijving:	-Tekeningomschrijving-	Formaat:	A1 Liggend (841 x 594 mm)



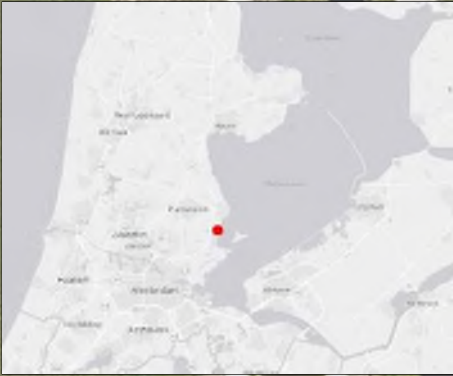

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Ontgraven inkassing
- Ontgraven cunet
- Aanvullen cunet met zand incl doek en drain

De weg volledige afsluiting (met uitzondering van fietsers en voetgangers)

- Aanbrengen zand fundatie op de openbare weg en draglineschotten plateau.
- Aanbrengen Damwanden
- Demobilisatie van 't Hek en UvM
- Ontgraven inkassing incl doek en drain t.b.v. gording en afbranden damwand

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;


- Afbranden Damwandplanken
- Aanbrengen gording
- Aanvullen inkassing t/m waterveiligheidsprofiel

Zie planning voor doorloop tijden en data's

Werkgebied. Aanbrengen damwand vanaf weg, traject oost. Aandachtspunten;
- Weg is afgesloten voor automobilisten. autos moeten omrijden via de N247, N517 en de Hogedijk.
- Fietsers en voetgangers mogen paseren doormiddel van stop en go momenten die worden aangegeven door verkeersregelaars.
- breedte passeer strook fietsers en voetgangers:1.5 m1
- Op de afstering worden gele schrik lampen geplaatst voor de nachturen.
- afstering d.m.v. hoge bouwhekken.
- Parkeer gelegenheden bewoners huisnr 36,37 in overleg OM. uitgangspunt westerlijk van werkvak.
- ten tijde van de weg afsluting is voor huisnrs. 34 en 35 een keerlus voorzien.

— Ontgravings lijnen
— Damwand tracé
- - - Opstel locatie damwand stelling
— Werkterrein afbakening
Totale werkterrein afbakening: 74 m1



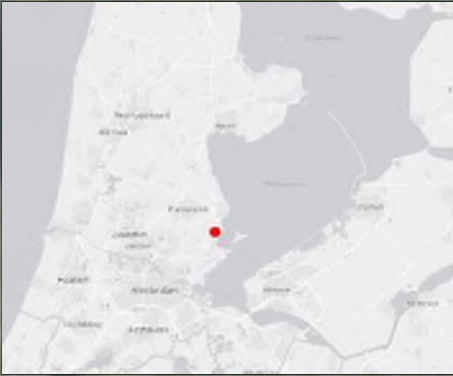

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Ontgraven inkassing
- Ontgraven cunet
- Aanvullen cunet met zand incl doek en drain

De weg volledige afsluiting (met uitzondering van fietsers en voetgangers);

- Aanbrengen zand fundatie op de openbare weg en draglineschotten plateau.
- Mobilisatie van t Hek
- Aanbrengen Damwanden
- Ontgraven inkassing incl doek en drain t.b.v. gording en afbranden damwand

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Afbranden Damwandplanken
- Aanbrengen gording
- Aanvullen inkassing t/m waterveiligheidsprofiel

Zie planning voor doorloop tijden en data's

Werkgebied, Aanbrengen damwand vanaf weg, traject oost.

Aandachtspunten;

- Weg is afgesloten voor automobilisten. autos moeten omrijden via de N247, N517 en de Hogedijk.
- Fietsers en voetgangers mogen paseren doormiddel van stop en go momenten die worden aangegeven door verkeersregelaars.
- Breedte paseerstrook fietsers en voetgangers; varieert tussen 1.5 m1 en 1.0 m1. Paseren mag met 1 richting, dit wordt aangegeven doormiddel van verkeersregelaars.
- Op de afrastering worden gele schrik lampen geplaatst voor de nachturen.
- Afrastering d.m.v. hoge bouwhekken.
- parkeergelegenheid, kliko's en postbus bewoners huisnr. 9 inoverleg met OM.

Afzetting voor werkzaamheden eerder geplaatste damwand, zelfde maatregelen als andere afzetting(tbv aanbrengen damwand vanaf weg).

- huisnummer 10 bereikbaar met auto.
- Huisnummer 9 parkeert auto aan de oosterlijke kant van het werkvak.

Ontgravings lijnen


Damwand tracé

Opstel locatie damwand stelling


Werkterin afbakening

Totale werkterin afbakening: 75 m1 (m1 zonder halve baan afzetting tijdens afbranden geplaatste damwand vanaf werkbaan)



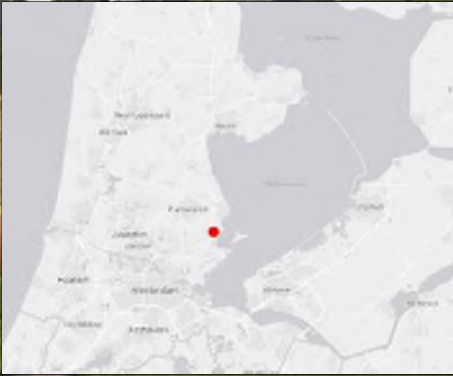

Voor toegang naar de jachthaven om rijden via N247, N517 en hoogedijk. Daar via de tijdelijke dijkovergang op de werkbaan en naar jachthaven (zie figuur rechts boven van tijdelijke dijkovergang).

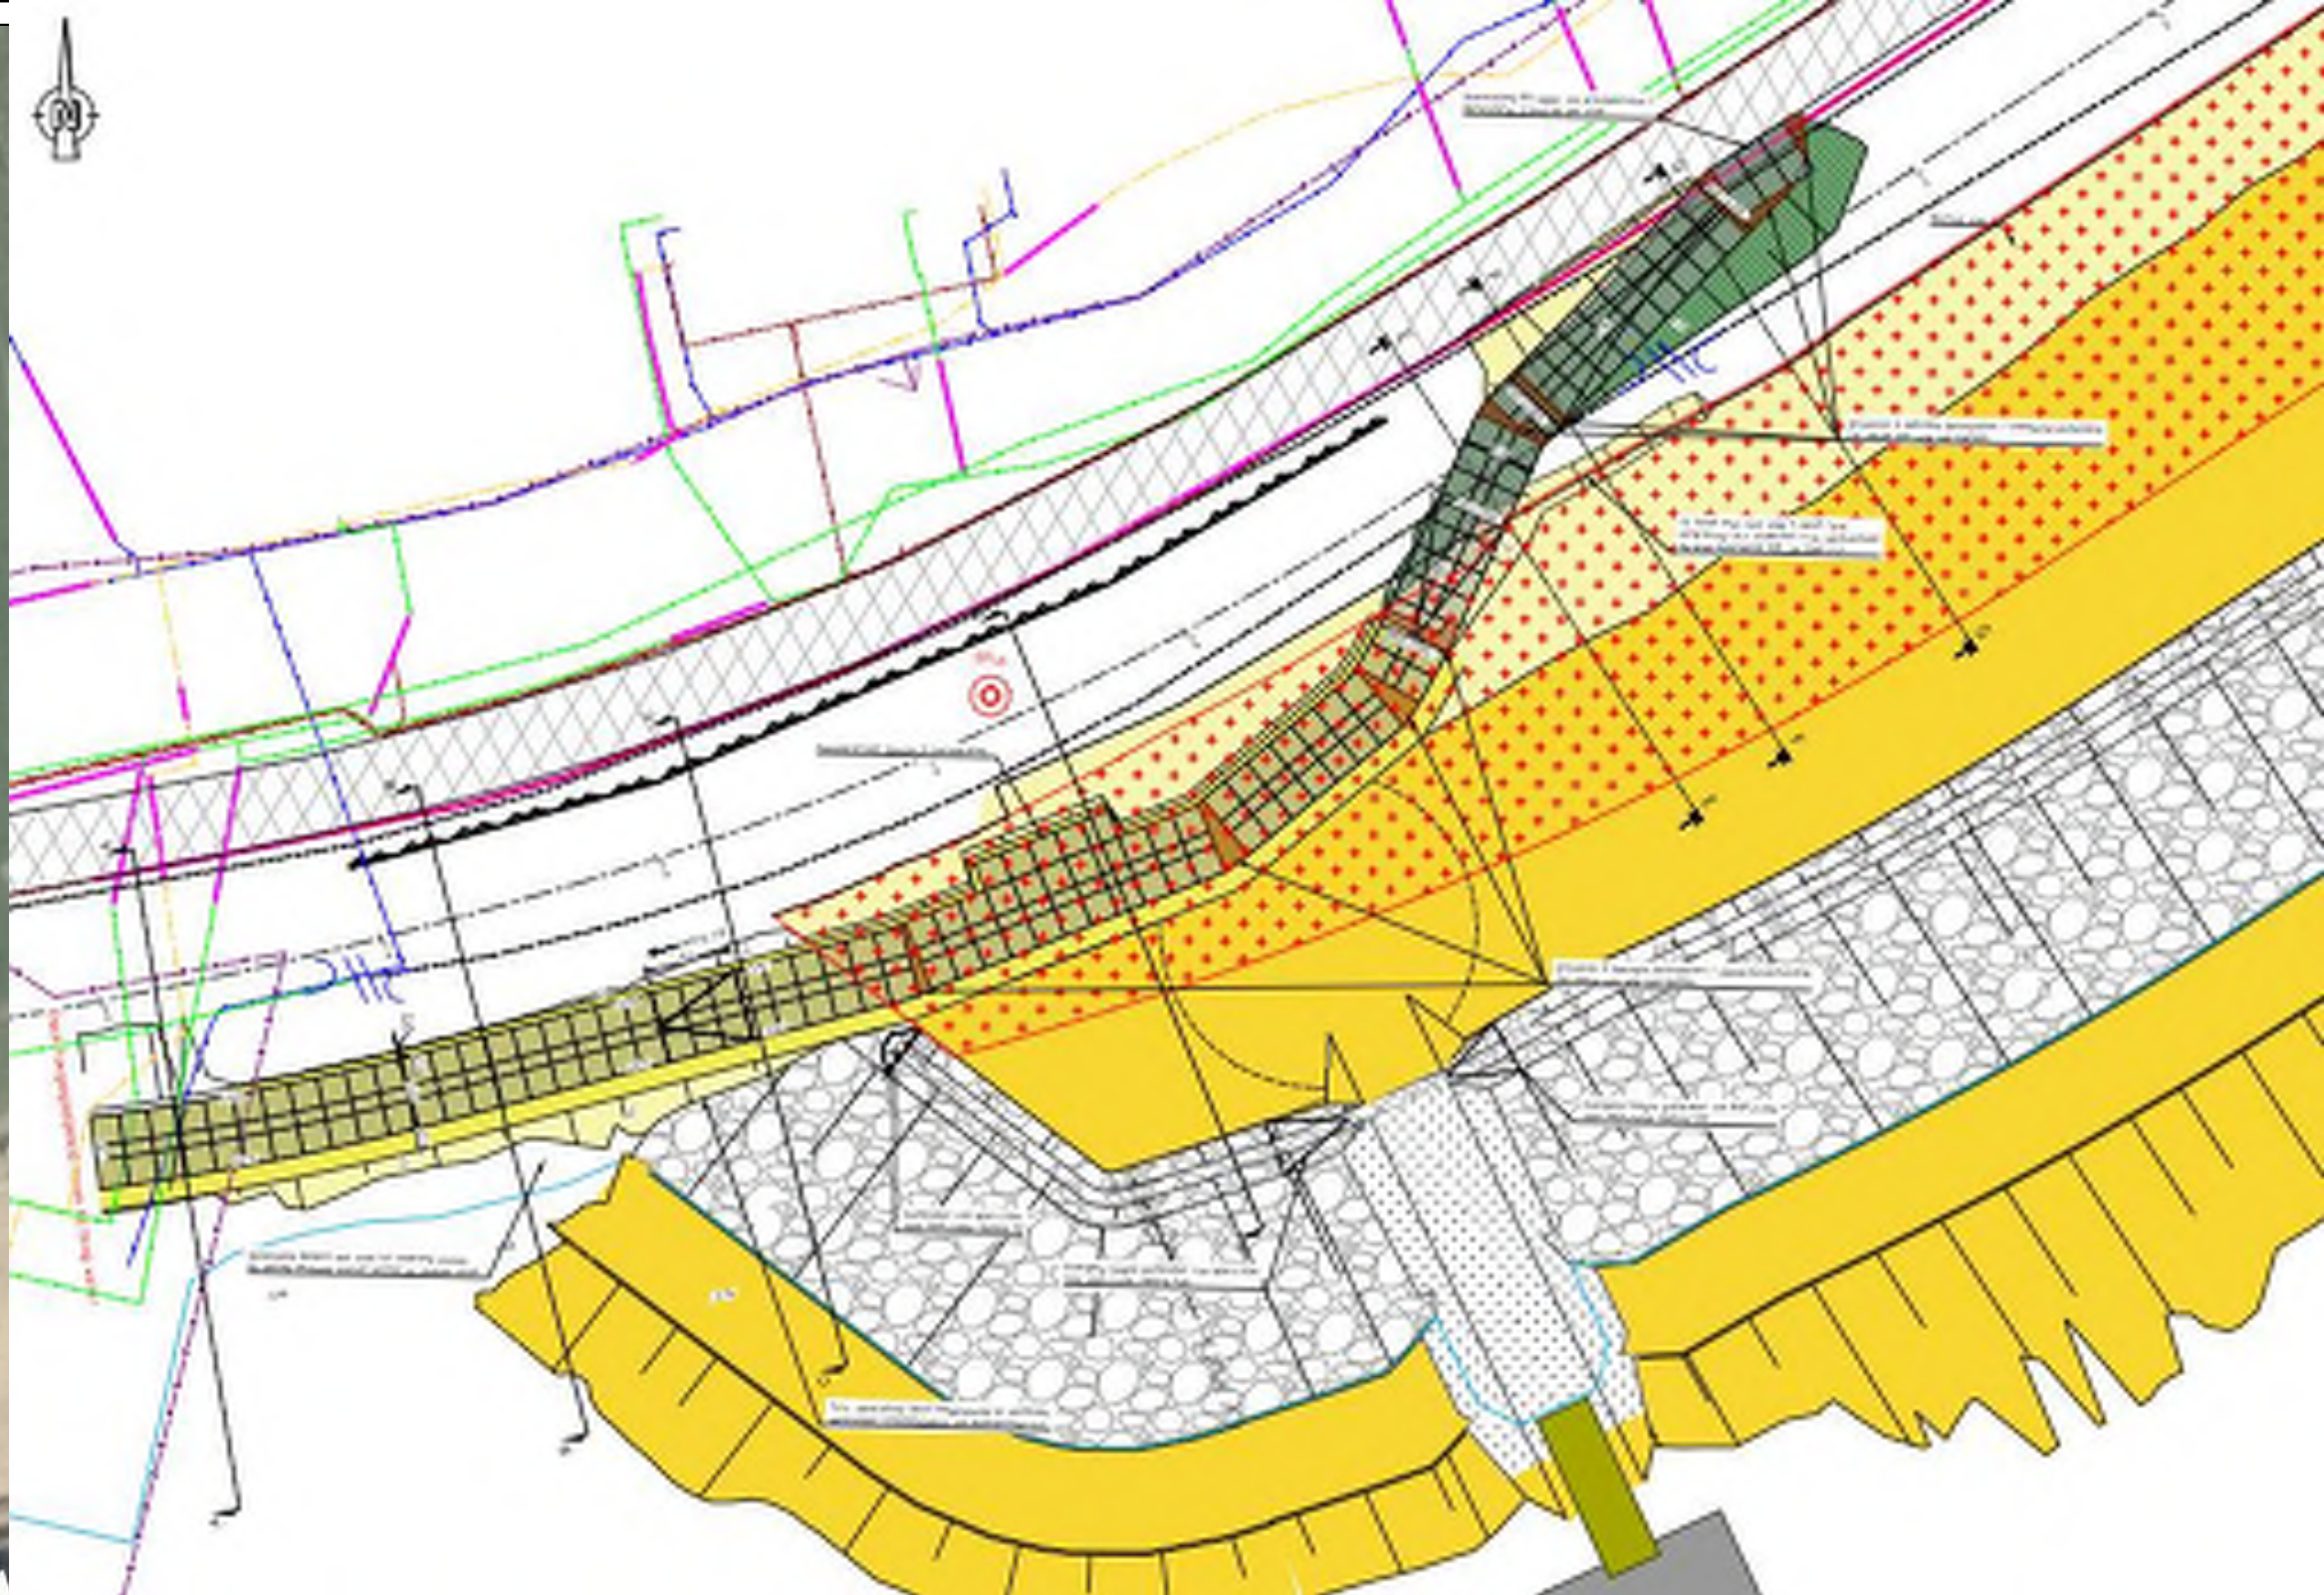

Dijkovergang tbv toegang jachthaven.

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Ontgraven inkassing
- Ontgraven cunet
- Aanvullen cunet met zand incl doek en drain

De weg volledige afsluiting(met uitzondering van fietsers en voetgangers) ;

- Aanbrengen zand fundatie op de openbare weg en draglineschotten plateau.
- Mobilisatie van t Hek
- Aanbrengen Damwanden
- Ontgraven inkassing incl doek en drain t.b.v. gording en afbranden damwand

De weg afzetting middels halve baan afzetting is tenminste van toepassing bij de volgende werkzaamheden;

- Afbranden Damwandplanken
- Aanbrengen gording
- Aanvullen inkassing t/m waterveiligheidsprofiel
- Aanvullen dijk tot oorspronkelijk profiel

Zie planning voor doorloop tijden en data's

- Werkterrein afbakening tbv aanbrengen damwand vanaf de weg,Traject west .
- uitgangspunten;
- De weg is afgesloten voor automobilisten. autos omrijden via N247, N517 en hogedijk .
 - Fietsers en voetgangers mogen het werkvak paseren met stop en go momenten die worden aangegeven door verkeersregelaars.
 - De passeerstrook is tussen de 1.5 en 1 m1 breed. 1 richtings weg
 - Op de afrastering worden gele schrik lampen geplaatst voor de nachturen.
 - Afrastering doormiddel van hoge bouwhekken.

Ontgravings lijnen

Damwand tracé


Opstel locatie damwand stelling

Werkterrein afbakening

Totale werkterrein afbakening: 210 m1

Project:	Projectnaam	Datum:	08-06-2023
Tekeningnummer:	-Tekeningnummer-	Schaal:	1:500
Tekeningomschrijving:	-Tekeningomschrijving-	Formaat:	A1 Liggend (841 x 594 mm)



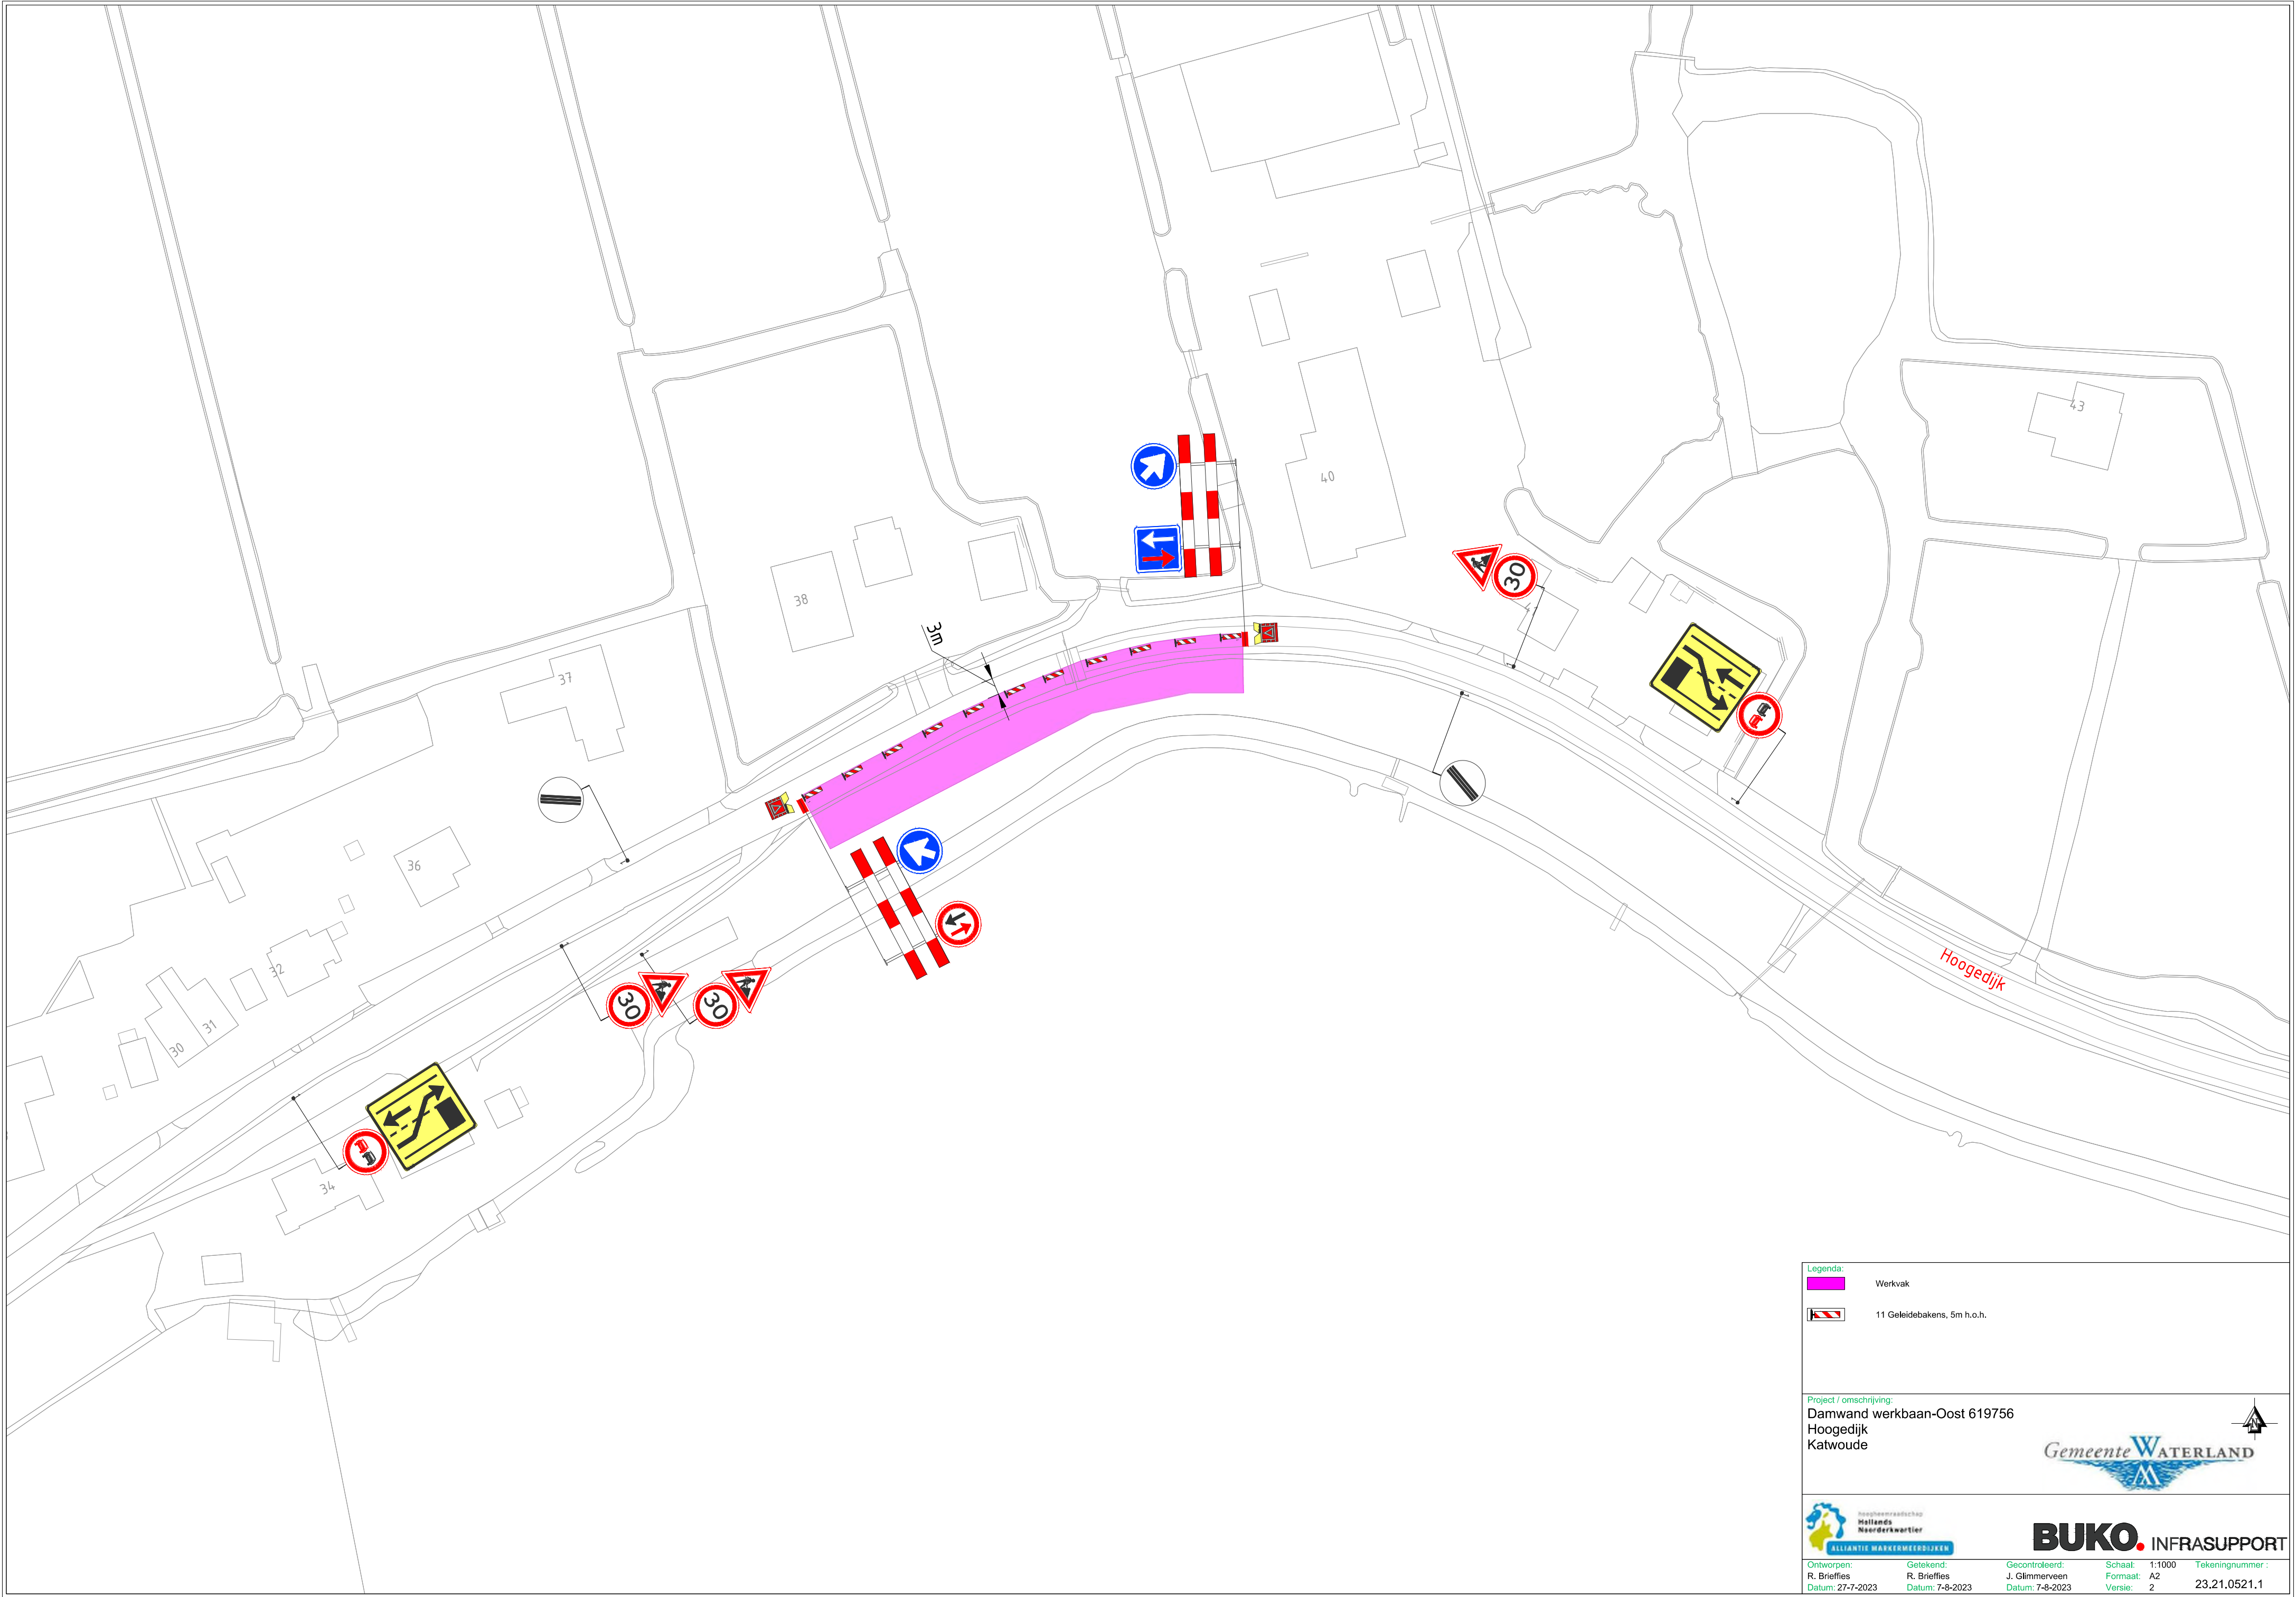

Legenda:

 Werkvak

 11 Geleidebakens, 5m h.o.h.

Project / omschrijving:

Damwand werkbaan-Oost 619756
Hoogedijk
Katwoude

Ontworpen:
R. Briefjes
Datum: 27-7-2023

Getekend:
R. Briefjes
Datum: 7-8-2023


Gecontroleerd:
J. Glimmerveen
Datum: 7-8-2023

Schaal: 1:1000
Formaat: A2
Versie: 2

Tekeningnummer:
23.21.0521.1


Gemeente WATERLAND


BUKO. INFRASUPPORT

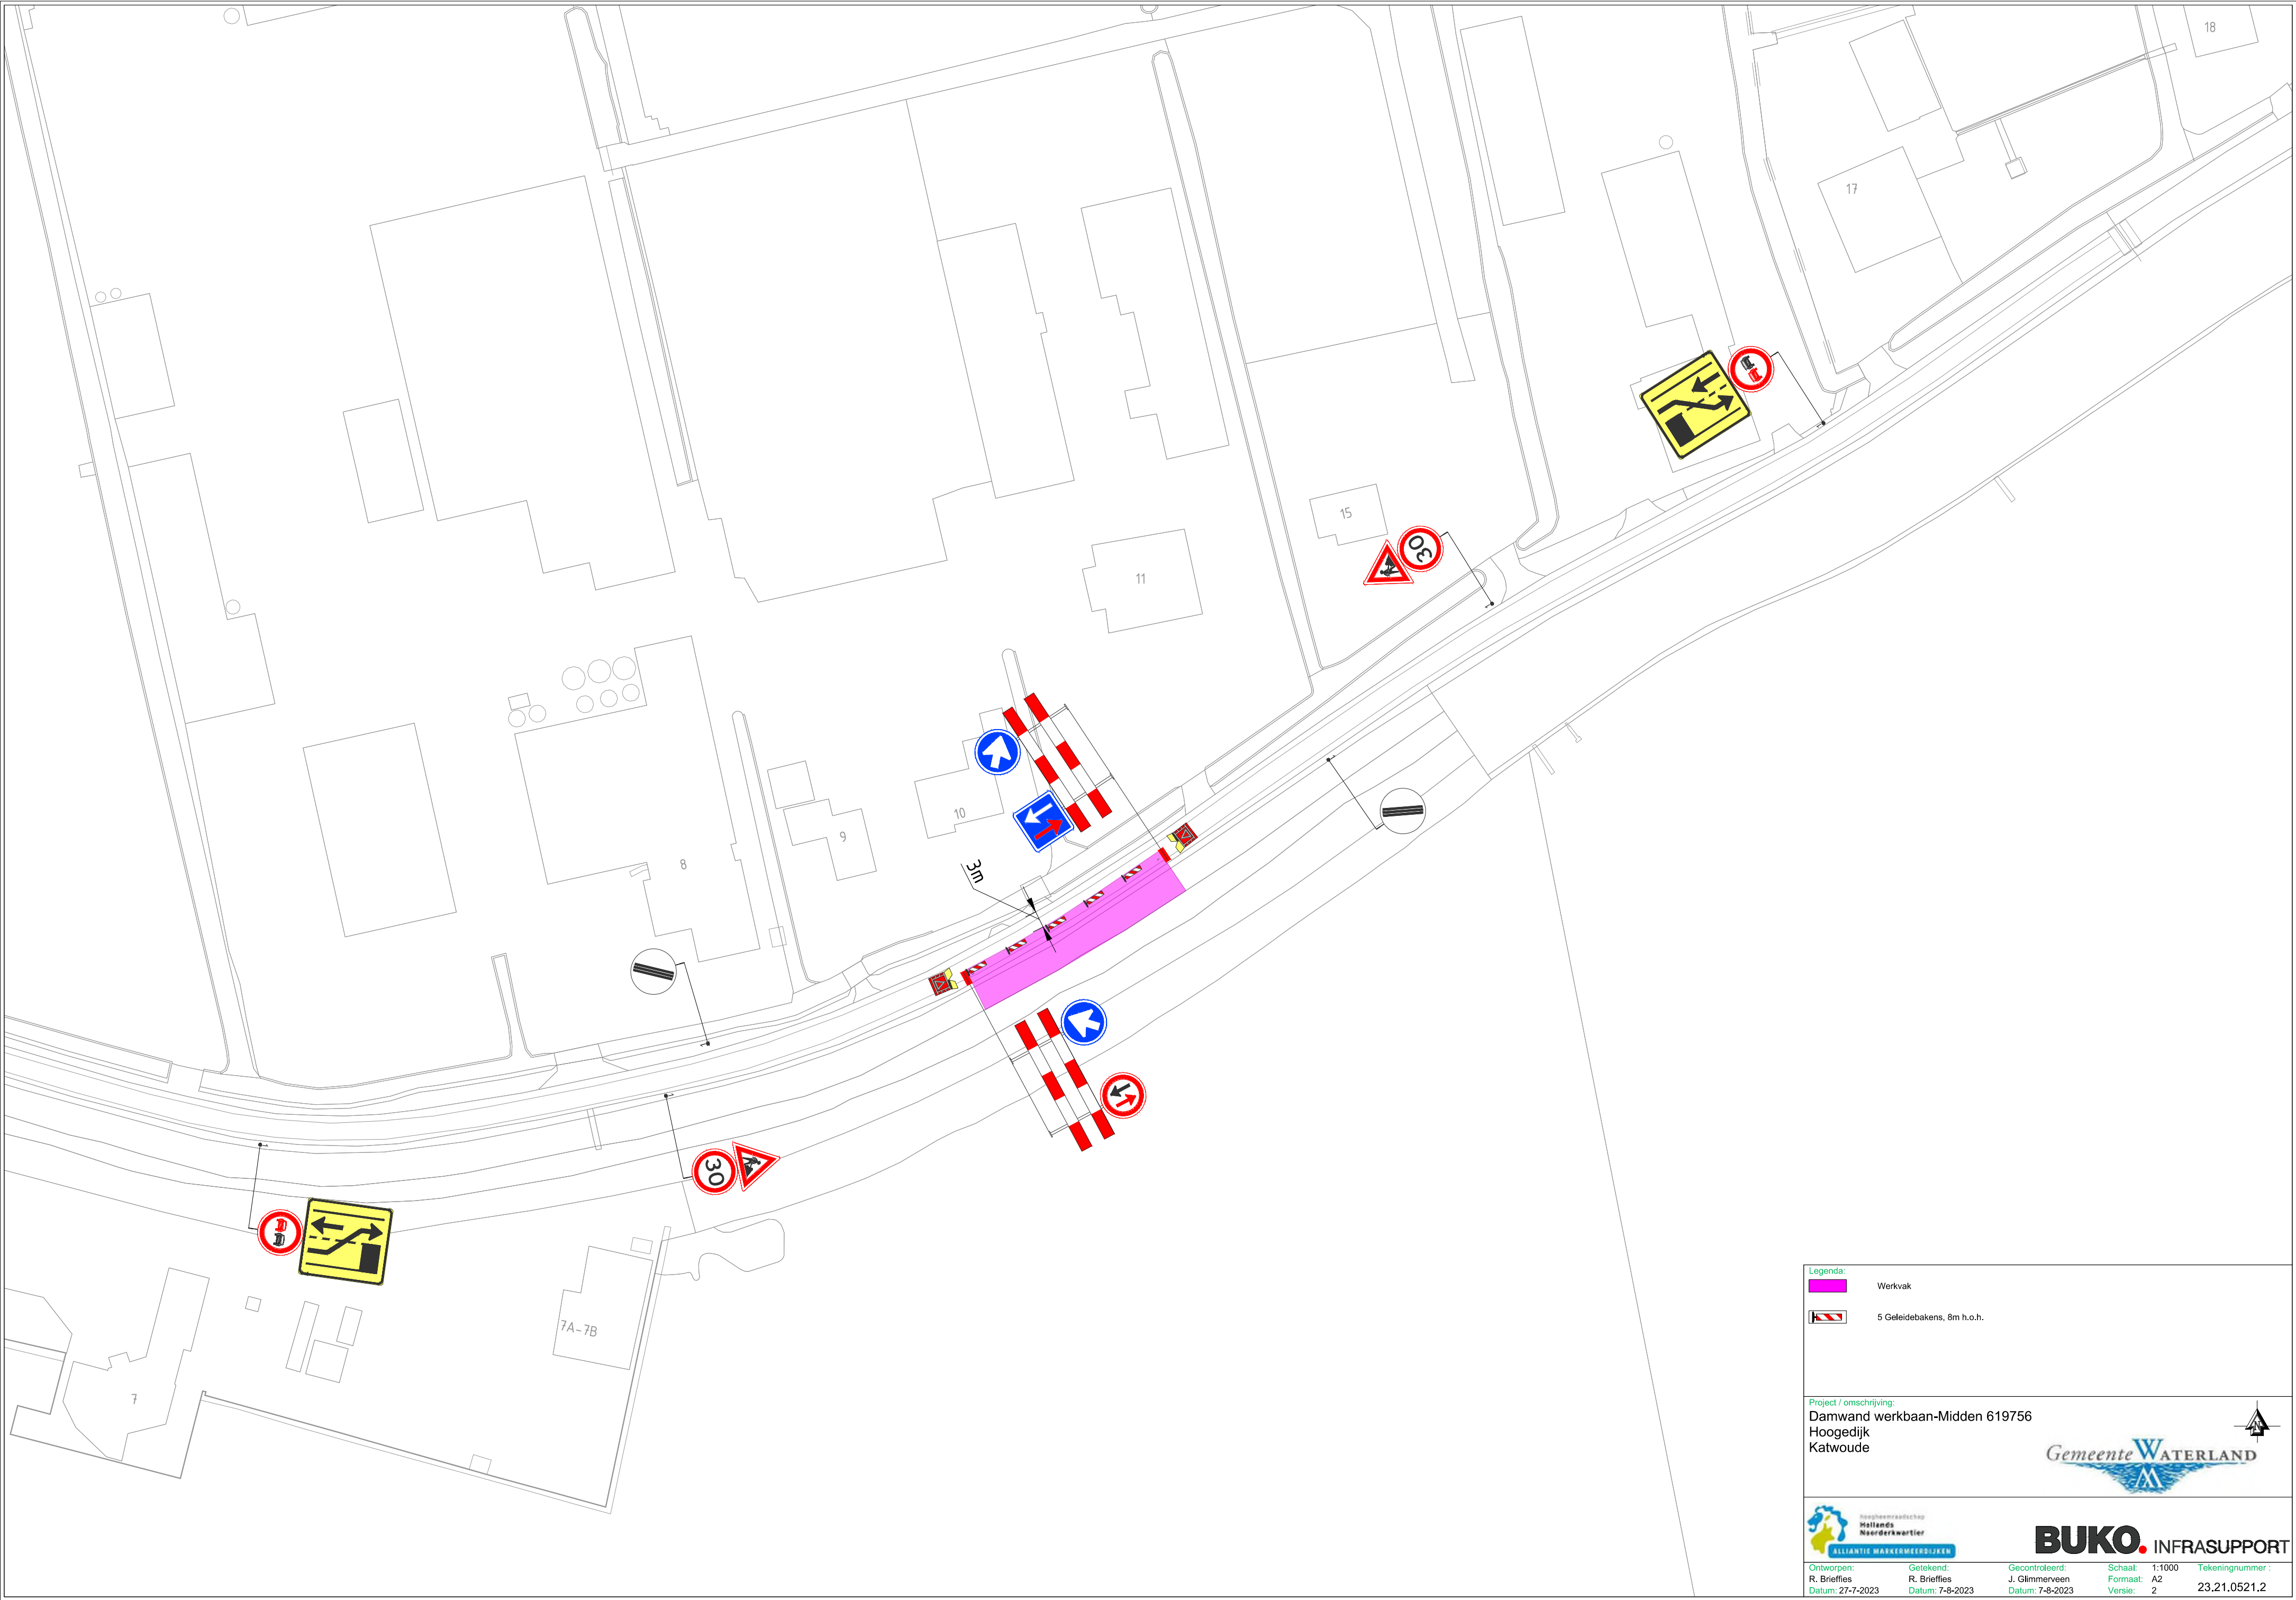

Legenda:

-  Werkvak
-  5 Geleidebakens, 8m h.o.h.

Project / omschrijving:
Damwand werkbaan-Midden 619756
Hoogedijk
Katwoude







Verkeersraad
Noorderkwartier



Ontworpen: R. Briefjes Datum: 27-7-2023	Getekend: R. Briefjes Datum: 7-8-2023	Gecontroleerd: J. Glimmerveen Datum: 7-8-2023	Schaal: Formaat: A2 Versie: 2	Tekeningnummer: 23.21.0521.2
---	---	---	-------------------------------------	---------------------------------

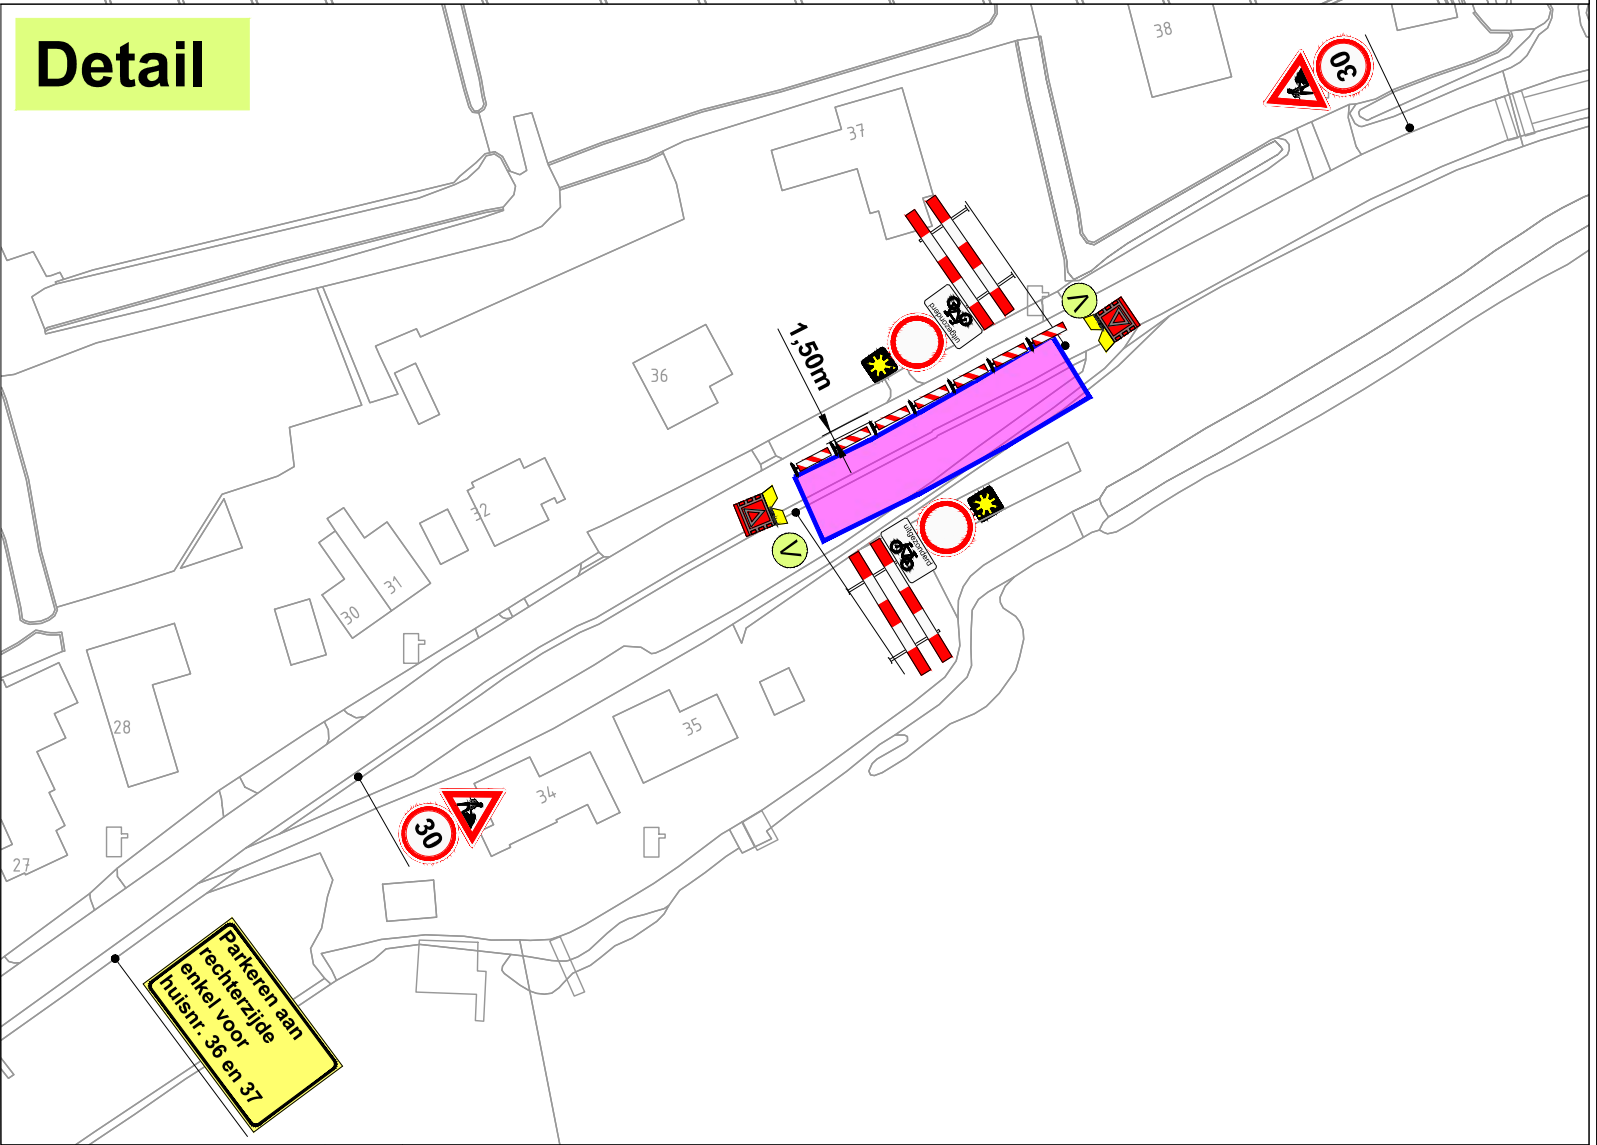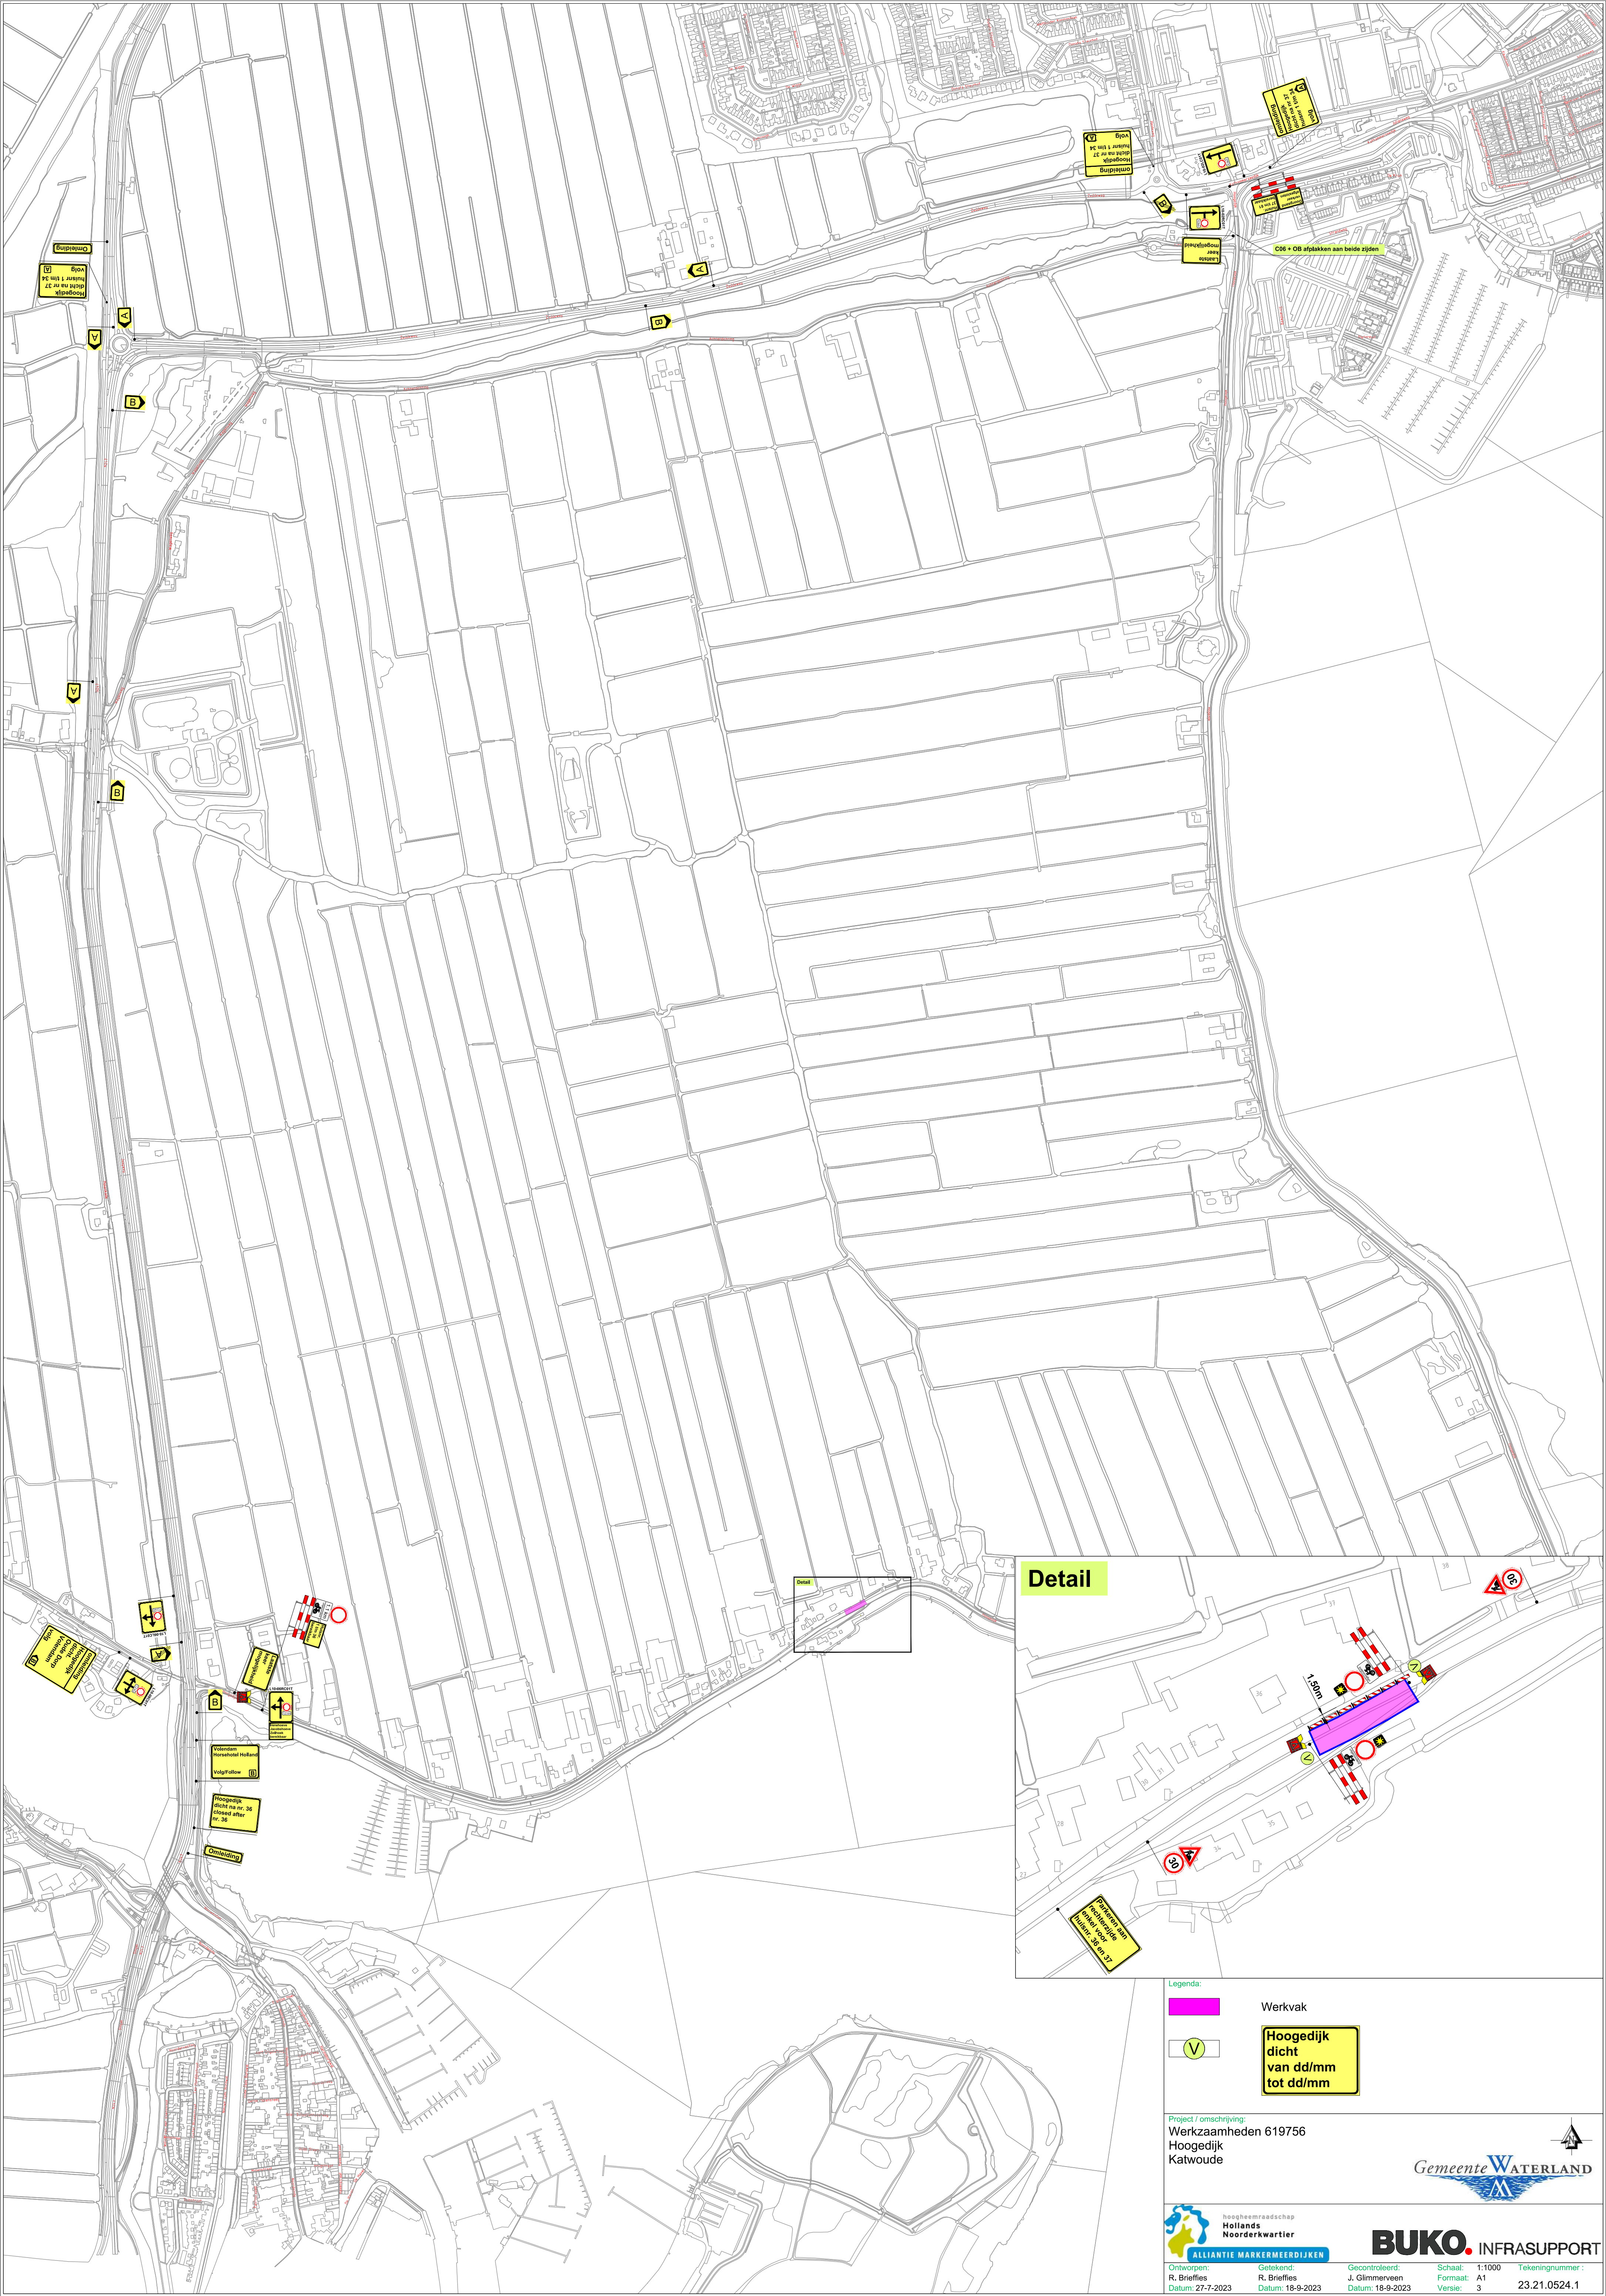

Werkvak

Hoogdijk
dicht
van dd/mm
tot dd/mm

Project / omschrijving:
Werkzaamheden 619756
Hoogdijk
Katwoude



ontworpen:
R. Briefjes
Datum: 27-7-2023

getekend:
R. Briefjes
Datum: 18-9-2023

gecontroleerd:
J. Glimmerveen
Datum: 18-9-2023

schaal:
Formaat: A1
Versie: 3

tekeningnummer:
23.21.0524.1

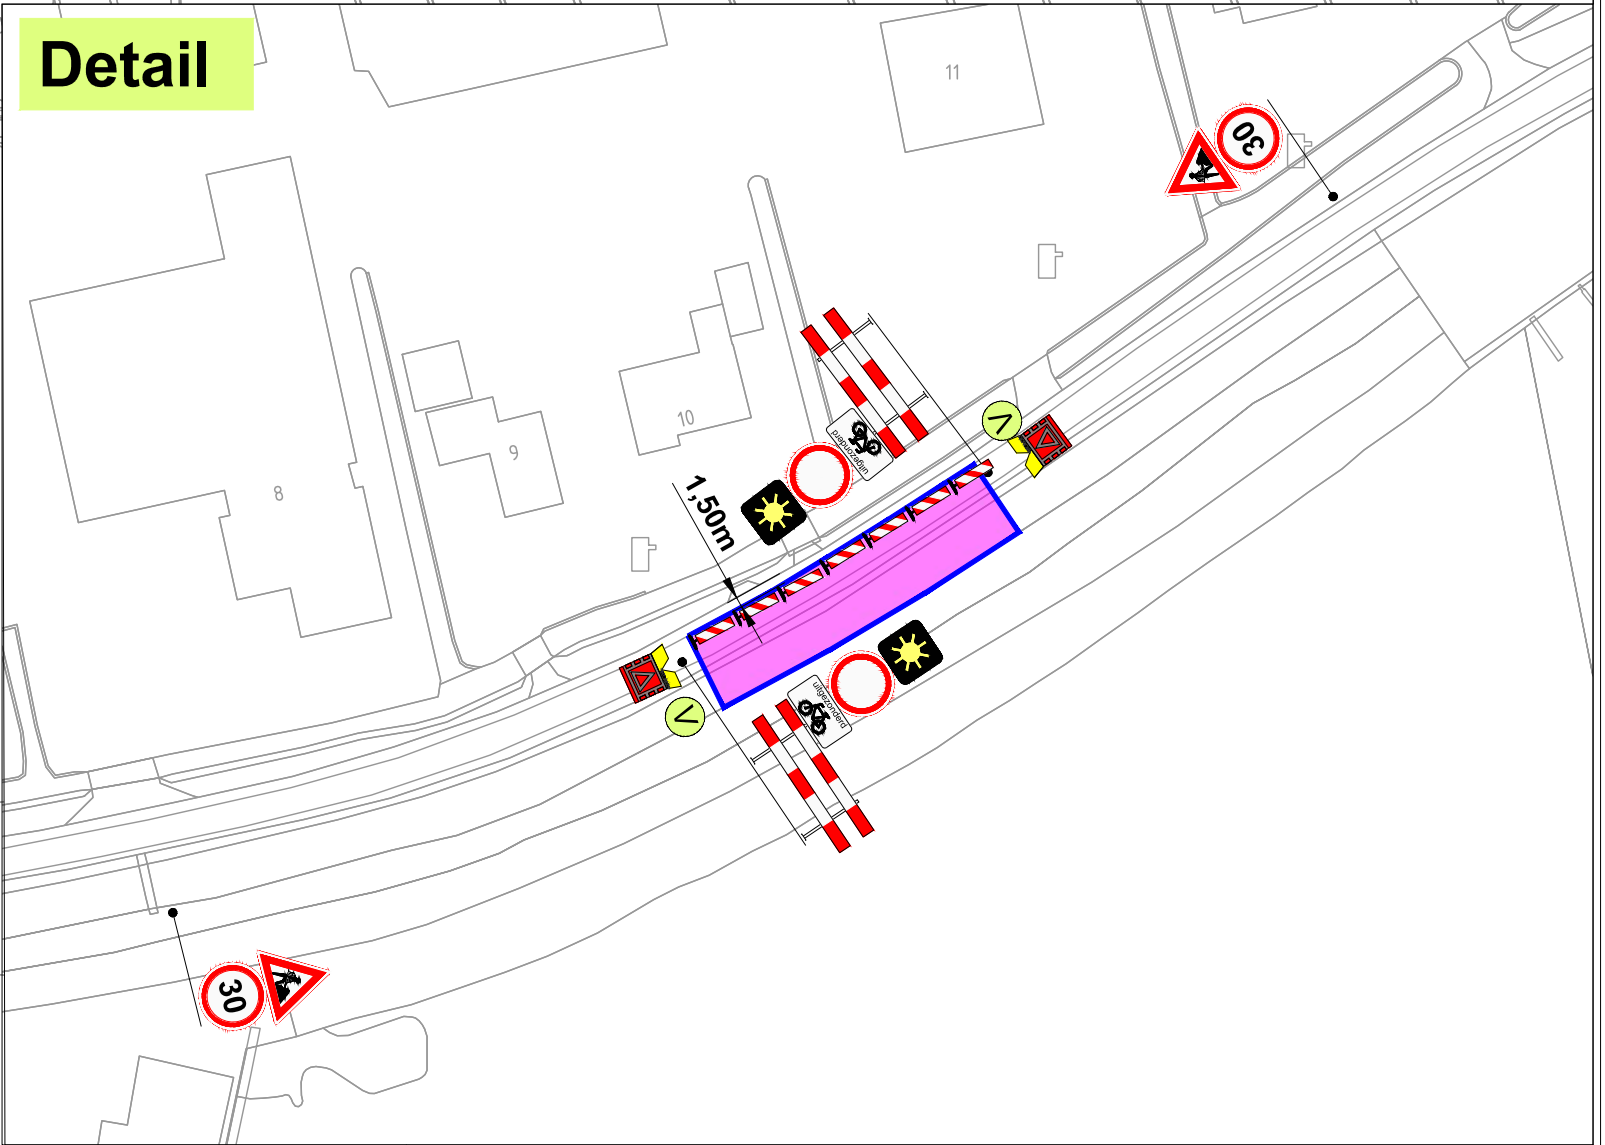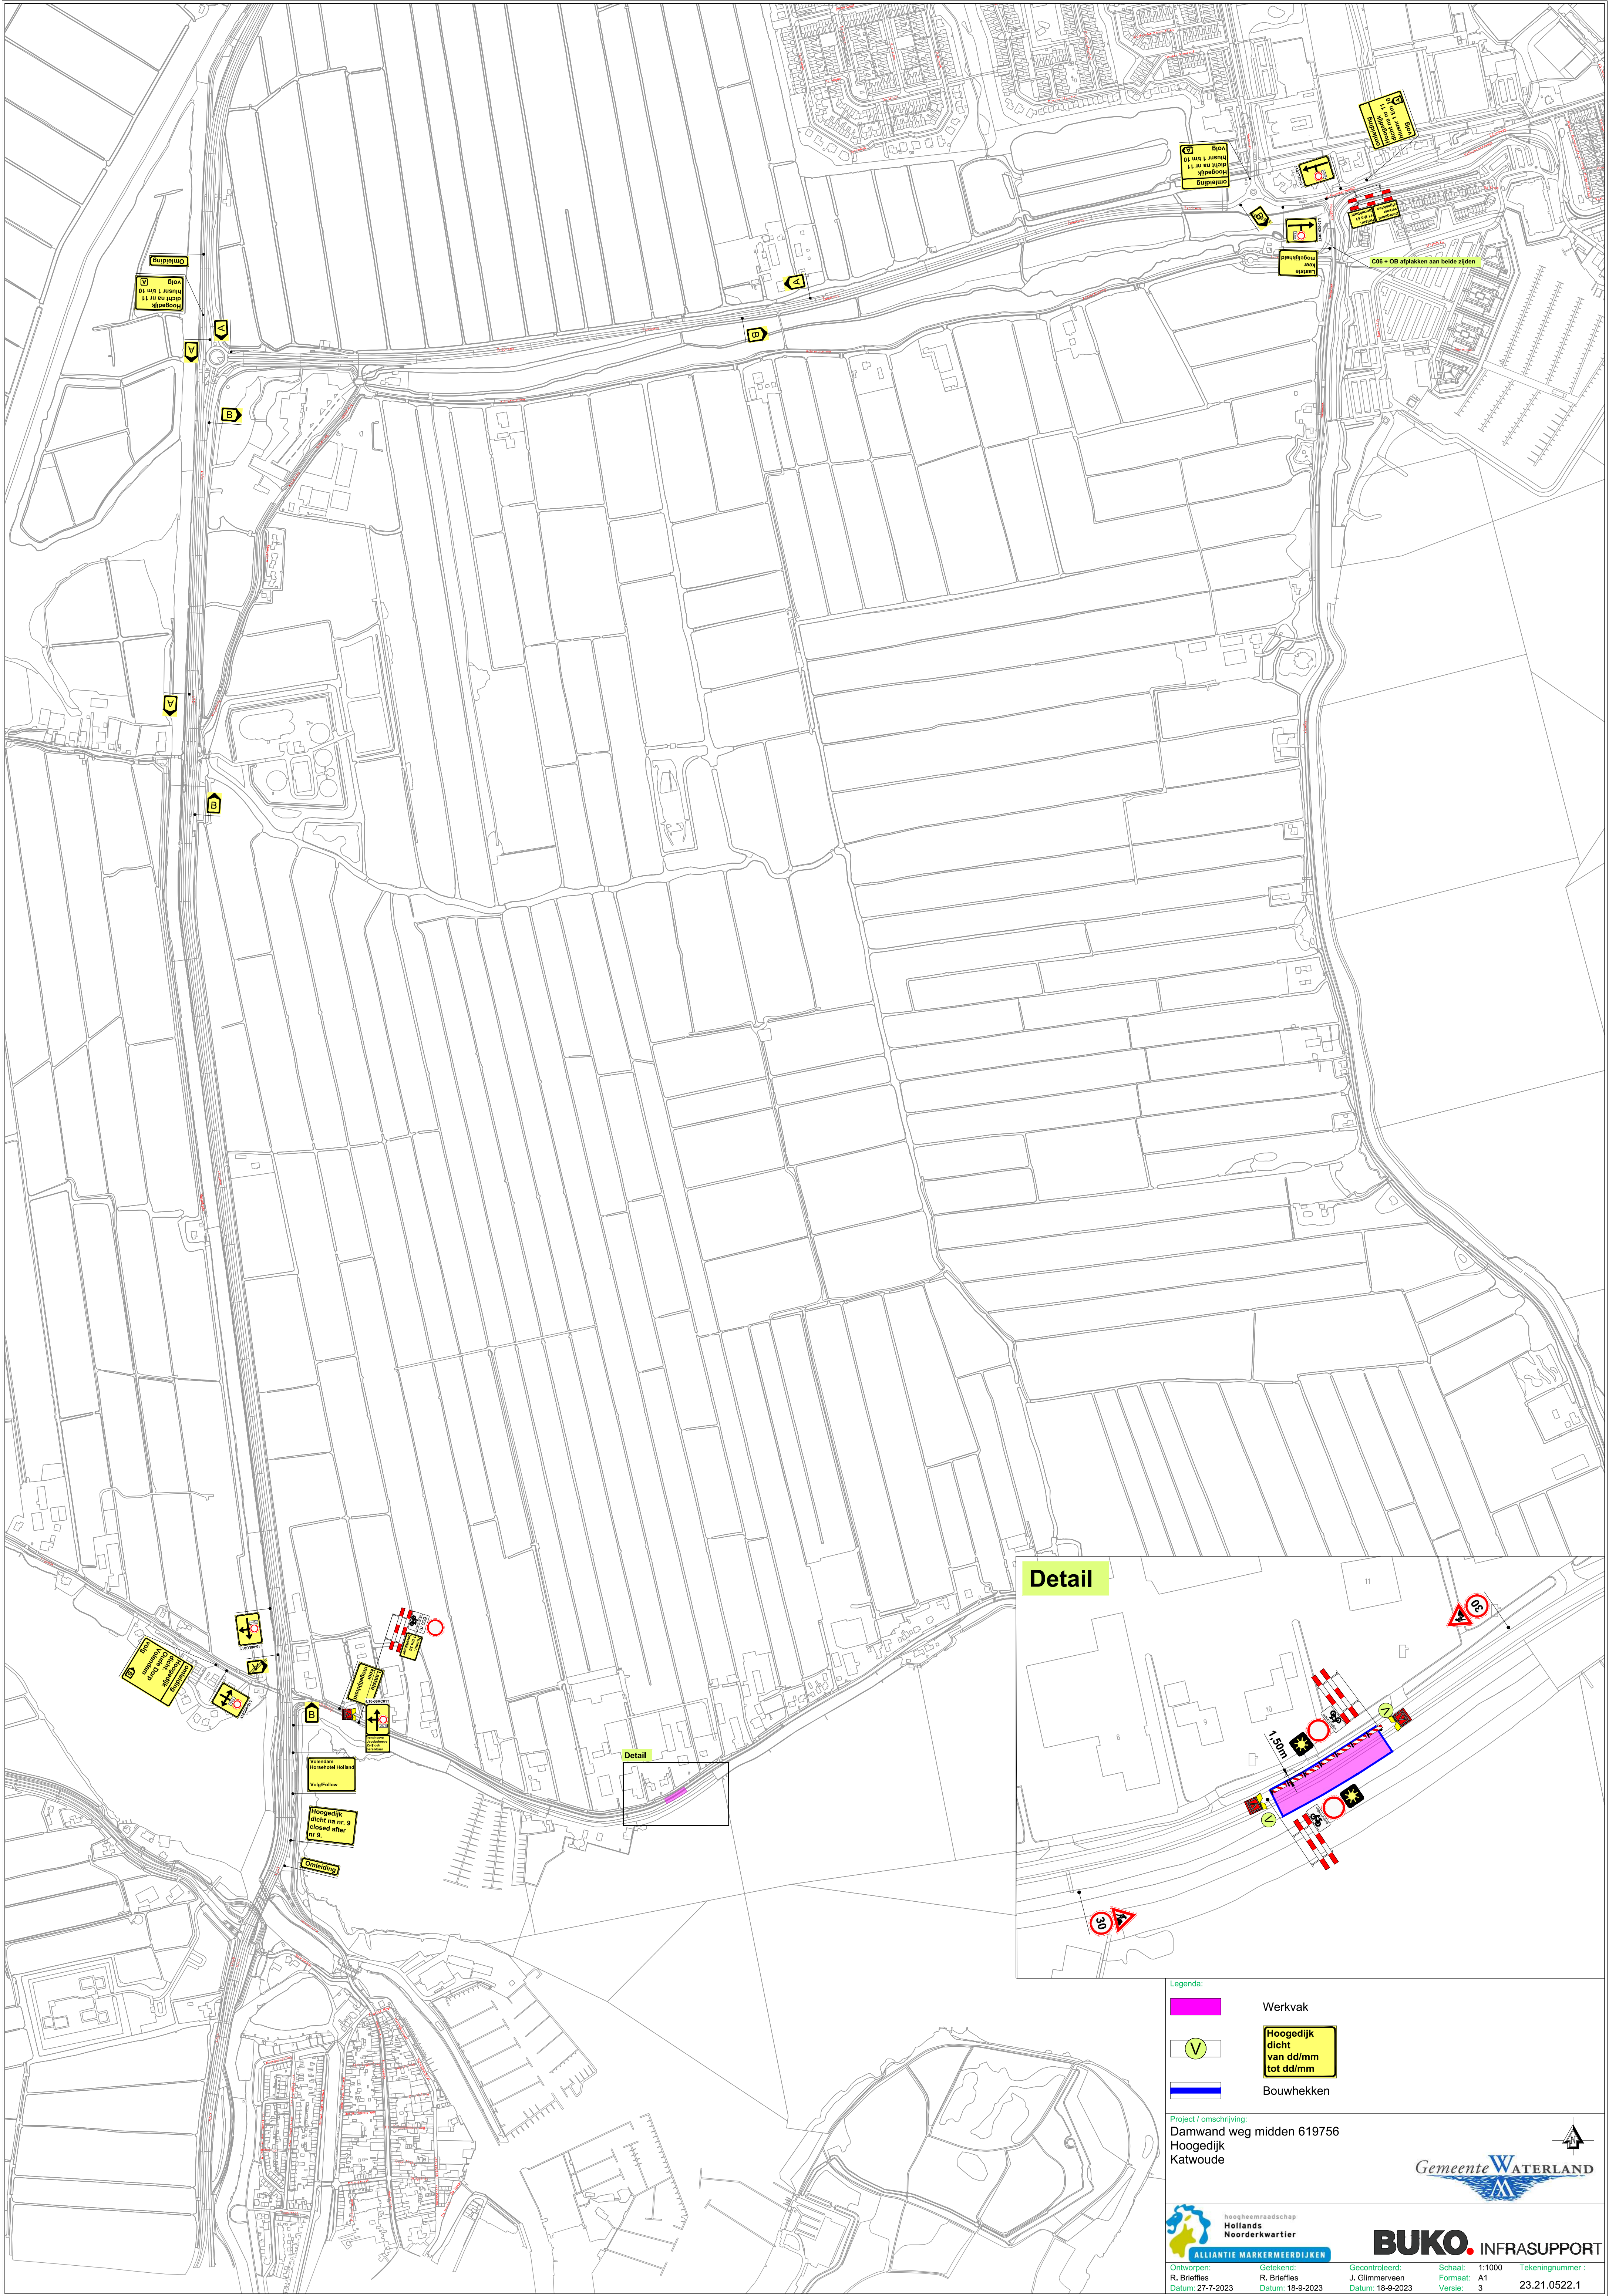

Legenda:

- Werkvak
- Hooggedijk dicht van dd/mm tot dd/mm
- Bouwhekken

Project / omschrijving:
Damwand weg midden 619756
Hooggedijk
Katwoude

Ontworpen: R. Briefjes
Datum: 27-7-2023

Getekend: R. Briefjes
Datum: 18-9-2023


Gecontroleerd: J. Glimmerveen
Datum: 18-9-2023

Schaal: 1:1000
Formaat: A1
Versie: 3

Tekeningnummer:
23.21.0522.1

Gemeente WATERLAND

BUKO. INFRASTRUCTUUR

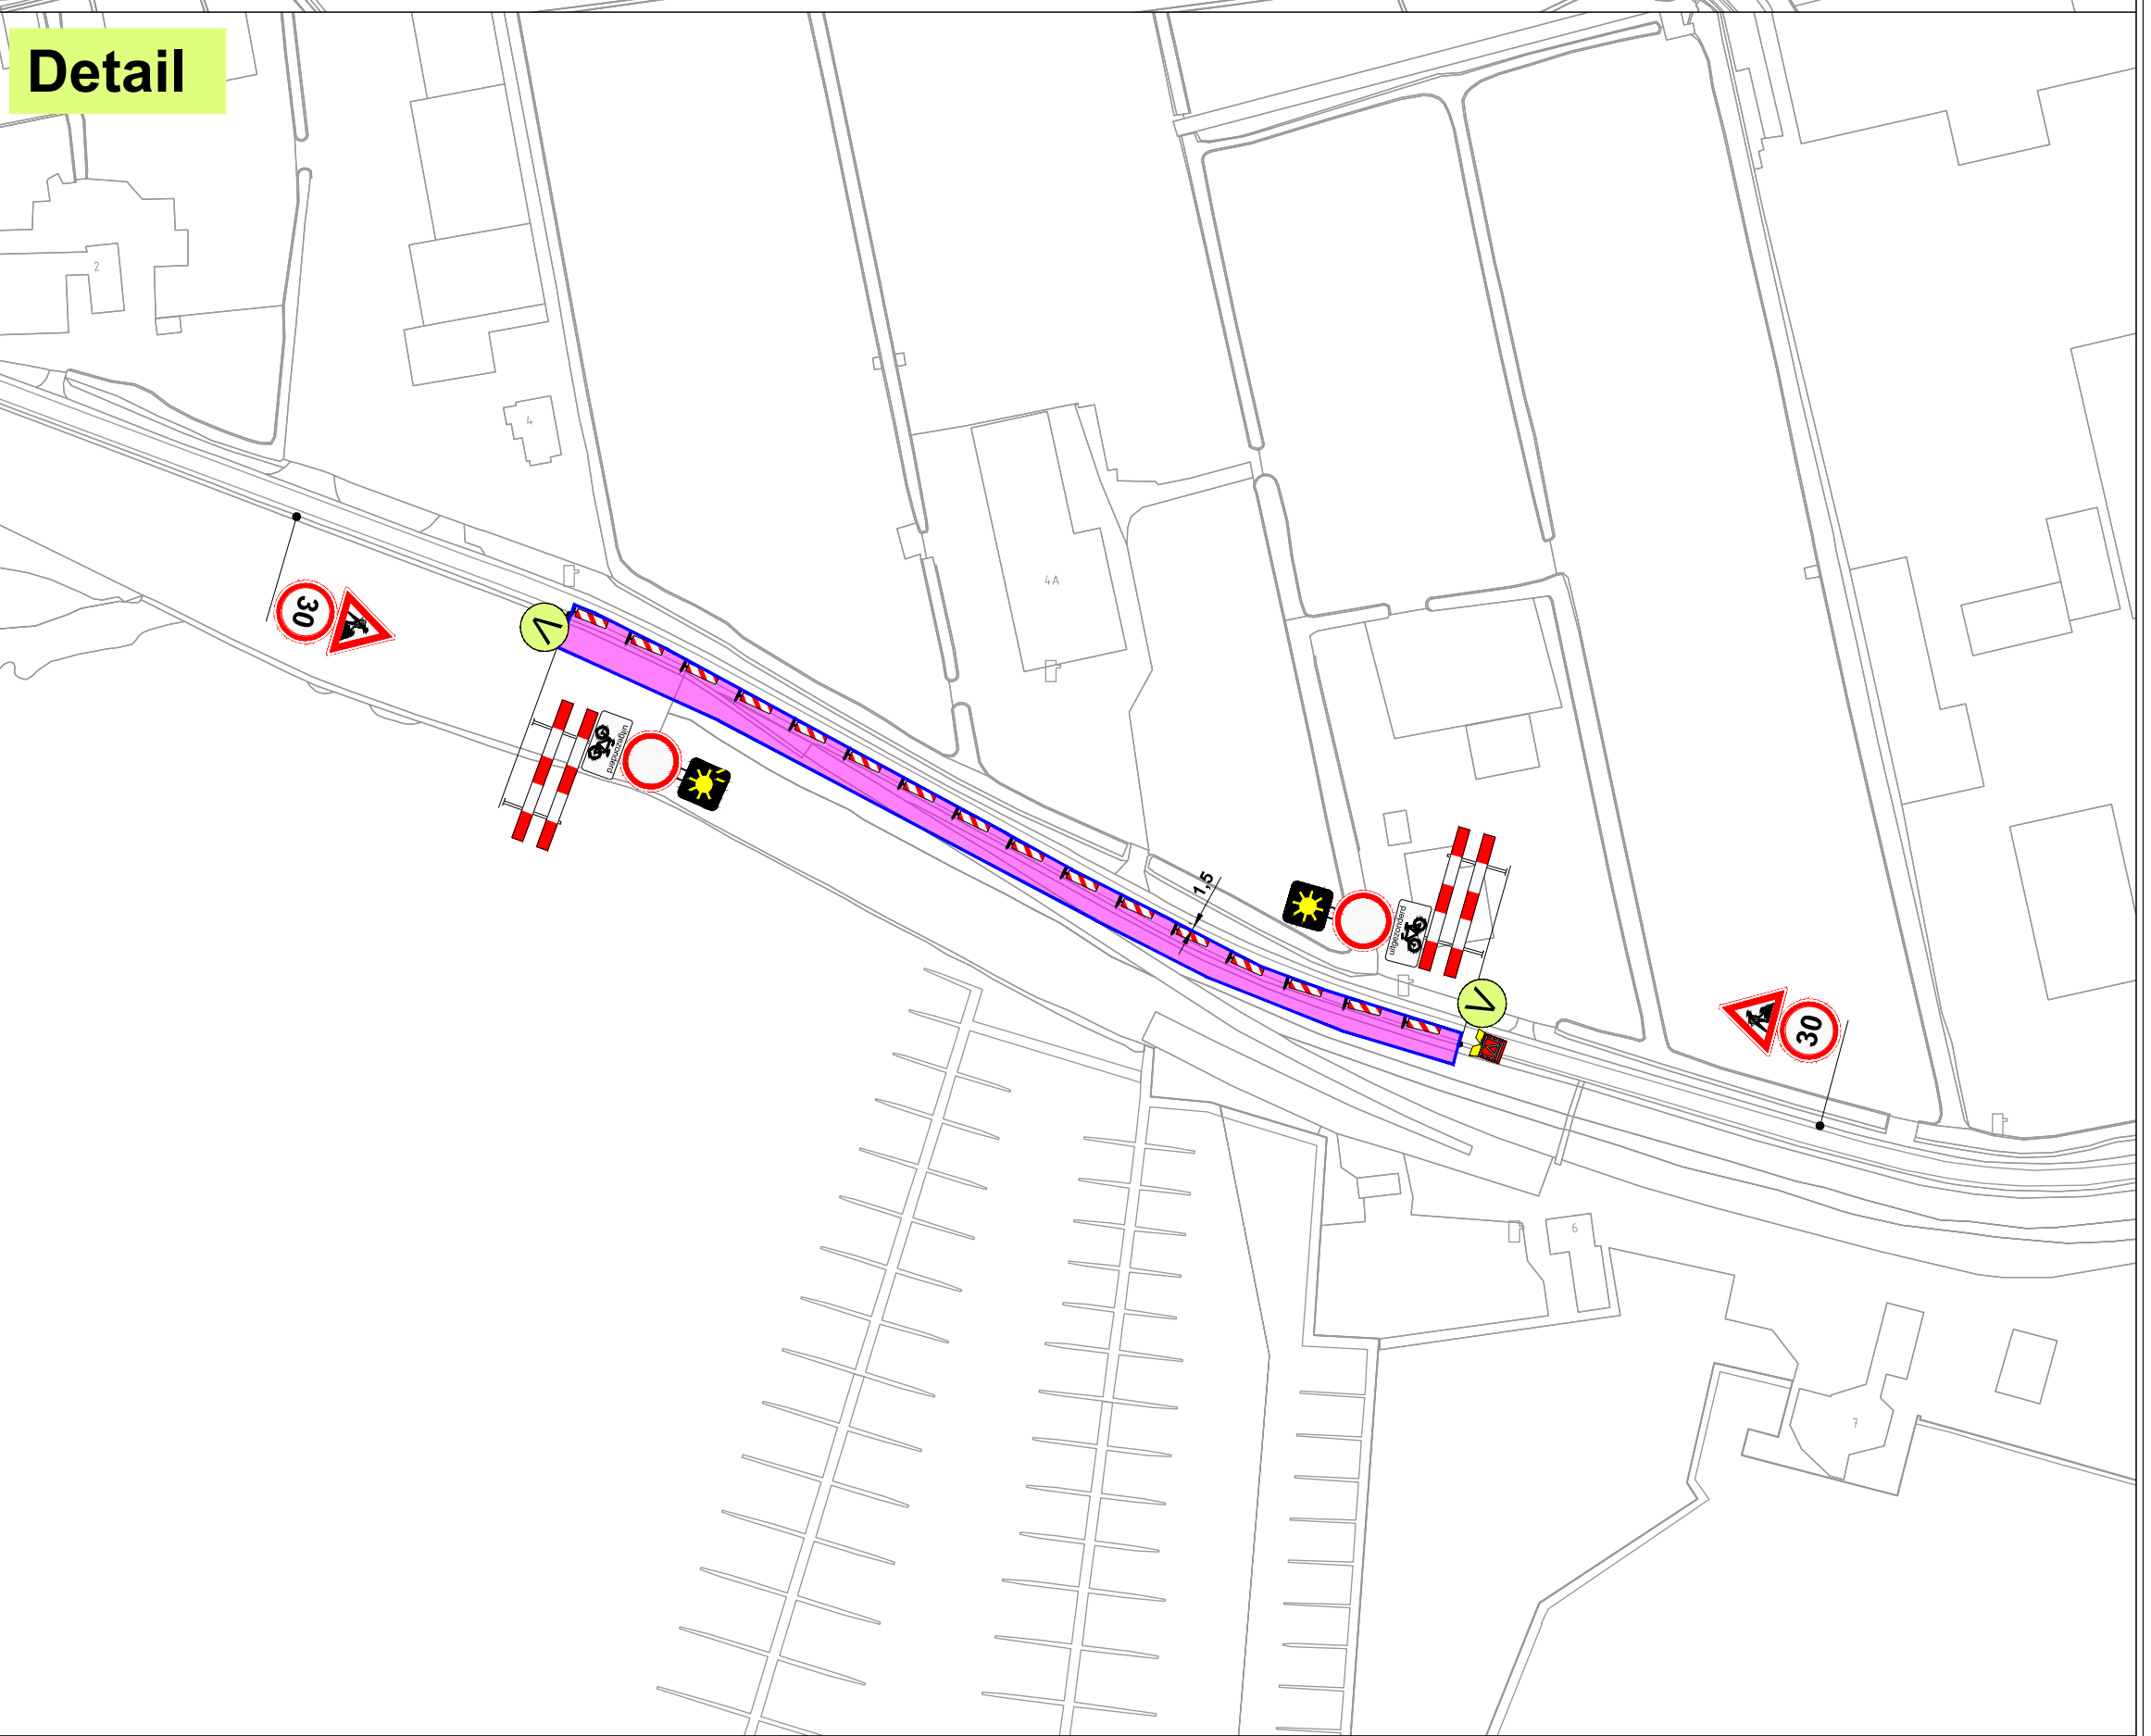

Tekeningnummer :
23.21.0535.1

BUKO. INFRASUPPORT
