

Raadgevende ingenieurs

Witteveen + Bos

water

infrastructuur

milieu

bouw



Eindrapportage (uitvoering)

Bestemmingsplan Barsbekerbinnenpolder te Zwartsluis

Gegevens riolering

Witteveen+Bos
Raadgevende ingenieurs b.v.

Van Twickelostraat 2
postbus 233
7400 AE Deventer
telefoon 0570 69 79 11
telefax 0570 69 73 44



- Revisie riolering
tek.nr.s: Zs8.4.4005R (b.o.b.'s, ligging putten en persleiding)
 Zs8.4.4501R t/m 4506R (inlaten)
- Meetgegevens b.o.b's en putdekselhoogtes
- Overzicht strenglengtes
- puttenstaat
- E/M-gegevens pompput



[illegible]



Gem. Zwartsluis Riolerings Uitbreidingsplan Barsbeekerbinnenpolder					
Datum opname : 25-10-99					
Putnummer	Vizierlijn	Aflezings	Hoogteverschil	VP Pompput - 0,018 NAP	
	2.000 + NAP	Putdeksel	Putdeksel-BOB	Hoogte Putdeksel t.o.v. NAP	Hoogte BOB t.o.v. NAP
R 26	2,000	1,733	-1,370	0,267	-1,103
R 27	2,000	1,561	-1,480	0,439	-1,041
R 28	2,000	1,565	-1,570	0,435	-1,135
R 28 > R 34	2,000	1,565	-1,570	0,435	-1,135
R 28	2,000	1,565	-1,555	0,435	-1,120
R 29	2,000	1,553	-1,480	0,447	-1,013
R 30	2,000	1,571	-1,370	0,429	-0,941
R 31	2,000	1,563	-1,445	0,437	-1,008
R 32	2,000	1,560	-1,565	0,440	-1,125
R 33	2,000	1,580	-1,685	0,420	-1,265
R 34	2,000	1,578	-1,650	0,422	-1,228
R 35	2,000	1,544	-1,765	0,456	-1,309
R 36	2,000	1,573	-1,795	0,427	-1,368
R 37	2,000	1,557	-1,815	0,443	-1,372
R 38	2,000	1,563	-1,900	0,437	-1,463
R 38 > R 33	2,000	1,563	-1,720	0,437	-1,283
R 38	2,000	1,563	-1,900	0,437	-1,463
R 39	2,000	1,561	-1,925	0,439	-1,486
R 39 > R 02	2,000	1,561	-1,635	0,439	-1,196
R 02	2,000	1,550	-1,890	0,450	-1,440
R 39	2,000	1,561	-2,335	0,439	-1,896
K 2	2,000	1,522	-2,420	0,478	-1,942
K 2	2,000	1,522	-2,280	0,478	-1,802
R 40	2,000	1,570	-2,215	0,430	-1,785
R 41	2,000	1,563	-2,215	0,437	-1,778
R 42	2,000	1,530	-2,105	0,470	-1,635
R 43	2,000	1,505	-2,040	0,495	-1,545
R 43 > R 44	2,000	1,505	-2,040	0,495	-1,545
R 43	2,000	1,505	-1,800	0,495	-1,305
R 49	2,000	1,586	-1,565	0,414	-1,151
R 50	2,000	1,530	-1,485	0,470	-1,015
R 51	2,000	1,518	-1,495	0,482	-1,013
R 51 > R 52	2,000	1,518	-1,480	0,482	-0,998
R 51	2,000	1,518	-1,480	0,482	-0,998
R 54	2,000	1,534	-1,450	0,486	-0,984
R 55	2,000	1,545	-1,300	0,455	-0,845
R 52	2,000	1,485	-1,510	0,515	-0,995
R 53	2,000	1,464	-1,385	0,536	-0,849
R 47	2,000	1,521	-1,335	0,479	-0,858
R 48	2,000	1,481	-1,455	0,519	-0,938
R 44	2,000	1,487	-1,530	0,513	-1,017
R 44 > R 43	2,000	1,487	-1,930	0,513	-1,417
R 44	2,000	1,487	-1,550	0,513	-1,037
R 45	2,000	1,517	-1,435	0,483	-0,952
R 46	2,000	1,572	-1,325	0,428	-0,897



Gem. Zwartsluis Riolering Uitbreidingsplan Barsbeekbinnenpolder					
Datum opname : 25-10-99			VP Pompput - 0.018 NAP		
Putnummer	Vizierlijn 2.000 + NAP	Aflezing Putdeksel	Hoogteverschil Putdeksel-BOB	Hoogte Putdeksel t.o.v. NAP	Hoogte BOB t.o.v. NAP
V 27	2,000	1,607	-1,395	0,393	-1,002
V 28	2,000	1,575	-1,500	0,425	-1,075
V 29	2,000	1,559	-1,660	0,441	-1,219
V 29 > V 36	2,000	1,559	-1,660	0,441	-1,219
V 29	2,000	1,559	-1,635	0,441	-1,194
V 30	2,000	1,569	-1,455	0,431	-1,024
V 31	2,000	1,559	-1,370	0,441	-0,929
V 32	2,000	1,530	-1,440	0,470	-0,970
V 33	2,000	1,553	-1,535	0,447	-1,088
V 34	2,000	1,530	-1,710	0,470	-1,240
V 35	2,000	1,521	-1,870	0,479	-1,391
V 35 > V 40	2,000	1,521	-2,345	0,479	-1,866
V 36	2,000	1,578	-2,235	0,422	-1,813
V 37	2,000	1,500	-2,450	0,500	-1,950
V 38	2,000	1,568	-2,555	0,432	-2,123
V 39	2,000	1,578	-2,585	0,422	-2,163
V 40	2,000	1,515	-2,765	0,485	-2,280
V 40 > V 35	2,000	1,515	-2,490	0,485	-2,005
V 40	2,000	1,515	-2,765	0,485	-2,280
V 41	2,000	1,530	-2,900	0,470	-2,430
V 41 > Pompput	2,000	1,530	-2,900	0,470	-2,430
V 41	2,000	1,530	-2,900	0,470	-2,430
K 2	2,000	1,522	-2,830	0,478	-2,352
V 42	2,000	1,543	-2,780	0,457	-2,323
V 43	2,000	1,540	-2,775	0,460	-2,315
V 44	2,000	1,508	-2,640	0,492	-2,148
V 45	2,000	1,538	-2,525	0,462	-2,063
V 45 > V 46	2,000	1,538	-2,525	0,462	-2,063
V 45	2,000	1,538	-2,355	0,462	-1,893
V 51	2,000	1,545	-2,155	0,455	-1,700
V 52	2,000	1,512	-1,995	0,488	-1,507
V 53	2,000	1,508	-1,965	0,494	-1,471
V 53 > V 54	2,000	1,508	-1,965	0,494	-1,471
V 53	2,000	1,508	-1,510	0,494	-1,016
V 56	2,000	1,523	-1,500	0,477	-1,023
V 57	2,000	1,552	-1,325	0,448	-0,877
V 54	2,000	1,480	-2,005	0,540	-1,465
V 55	2,000	1,480	-1,825	0,520	-1,305
V 49	2,000	1,507	-1,330	0,493	-0,837
V 50	2,000	1,450	-1,545	0,550	-0,995
V 46	2,000	1,442	-1,660	0,558	-1,102
V 46 > V 45	2,000	1,442	-2,380	0,558	-1,822
V 46	2,000	1,442	-1,680	0,558	-1,122
V 47	2,000	1,463	-1,520	0,537	-0,983
V 48	2,000	1,587	-1,325	0,433	-0,892



BARSBEEKER BINNEN POLDER ZWARTSLUIS

WERKNR. 70.38.02

DATUM. 20-04-1990

*PUTLENGTES (m)


FASE I

V1 - V2	36.90
R1 - R2	36.95
V2 - V3	37.60
R2 - R3	39.45
V3 - V4	32.70
R3 - R4	31.50
V4 - V5	44.80
R4 - R5	45.60
V5 - V6	48.00
R5 - R6	48.60
V6 - V7	52.00
R6 - R7	52.70
V7 - V8	44.05
R7 - R8	48.60
R8 - R57	9.30
R57 - R9	48.55
R9 - R10	31.75
V9 - V10	20.10
R10 - R11	21.85
V10 - V11	21.30
R11 - R12	24.70
V11 - V12	24.30

R12 - R13	23.90
V12 - V13	23.40
R13 - R14	24.70
V13 - V14	25.25
R14 - R15	10.80
V14 - V15	11.35
R15 - R3	55.00
V15 - V3	53.40
R3 - R56	11.65
R56 - K1R	8.50
R56 - K1V	19.30
V3 - K1V	33.00
K1R - R16	31.80
K1V - V16	33.20
R16 - R25	35.30
V16 - V26	36.00
R25 - R24	35.40
V26 - V25	35.65
R24 - R23	49.70
V25 - V24	49.20
R23 - R22	49.45
V24 - V23	48.75

R22 - R21	17.60
V23 - V22	16.40
R21 - STOP NAAST V2	
V22 - V21	40.65
V16 - V17	= 26.70
R16 - R17	= 27.50
V17 - V18	= 28.90
R17 - R18	= 43.90
V18 - V19	= 51.25
R18 - R19	= 57.90
V19 - V20	= 46.80
R19 - R20	= 46.85




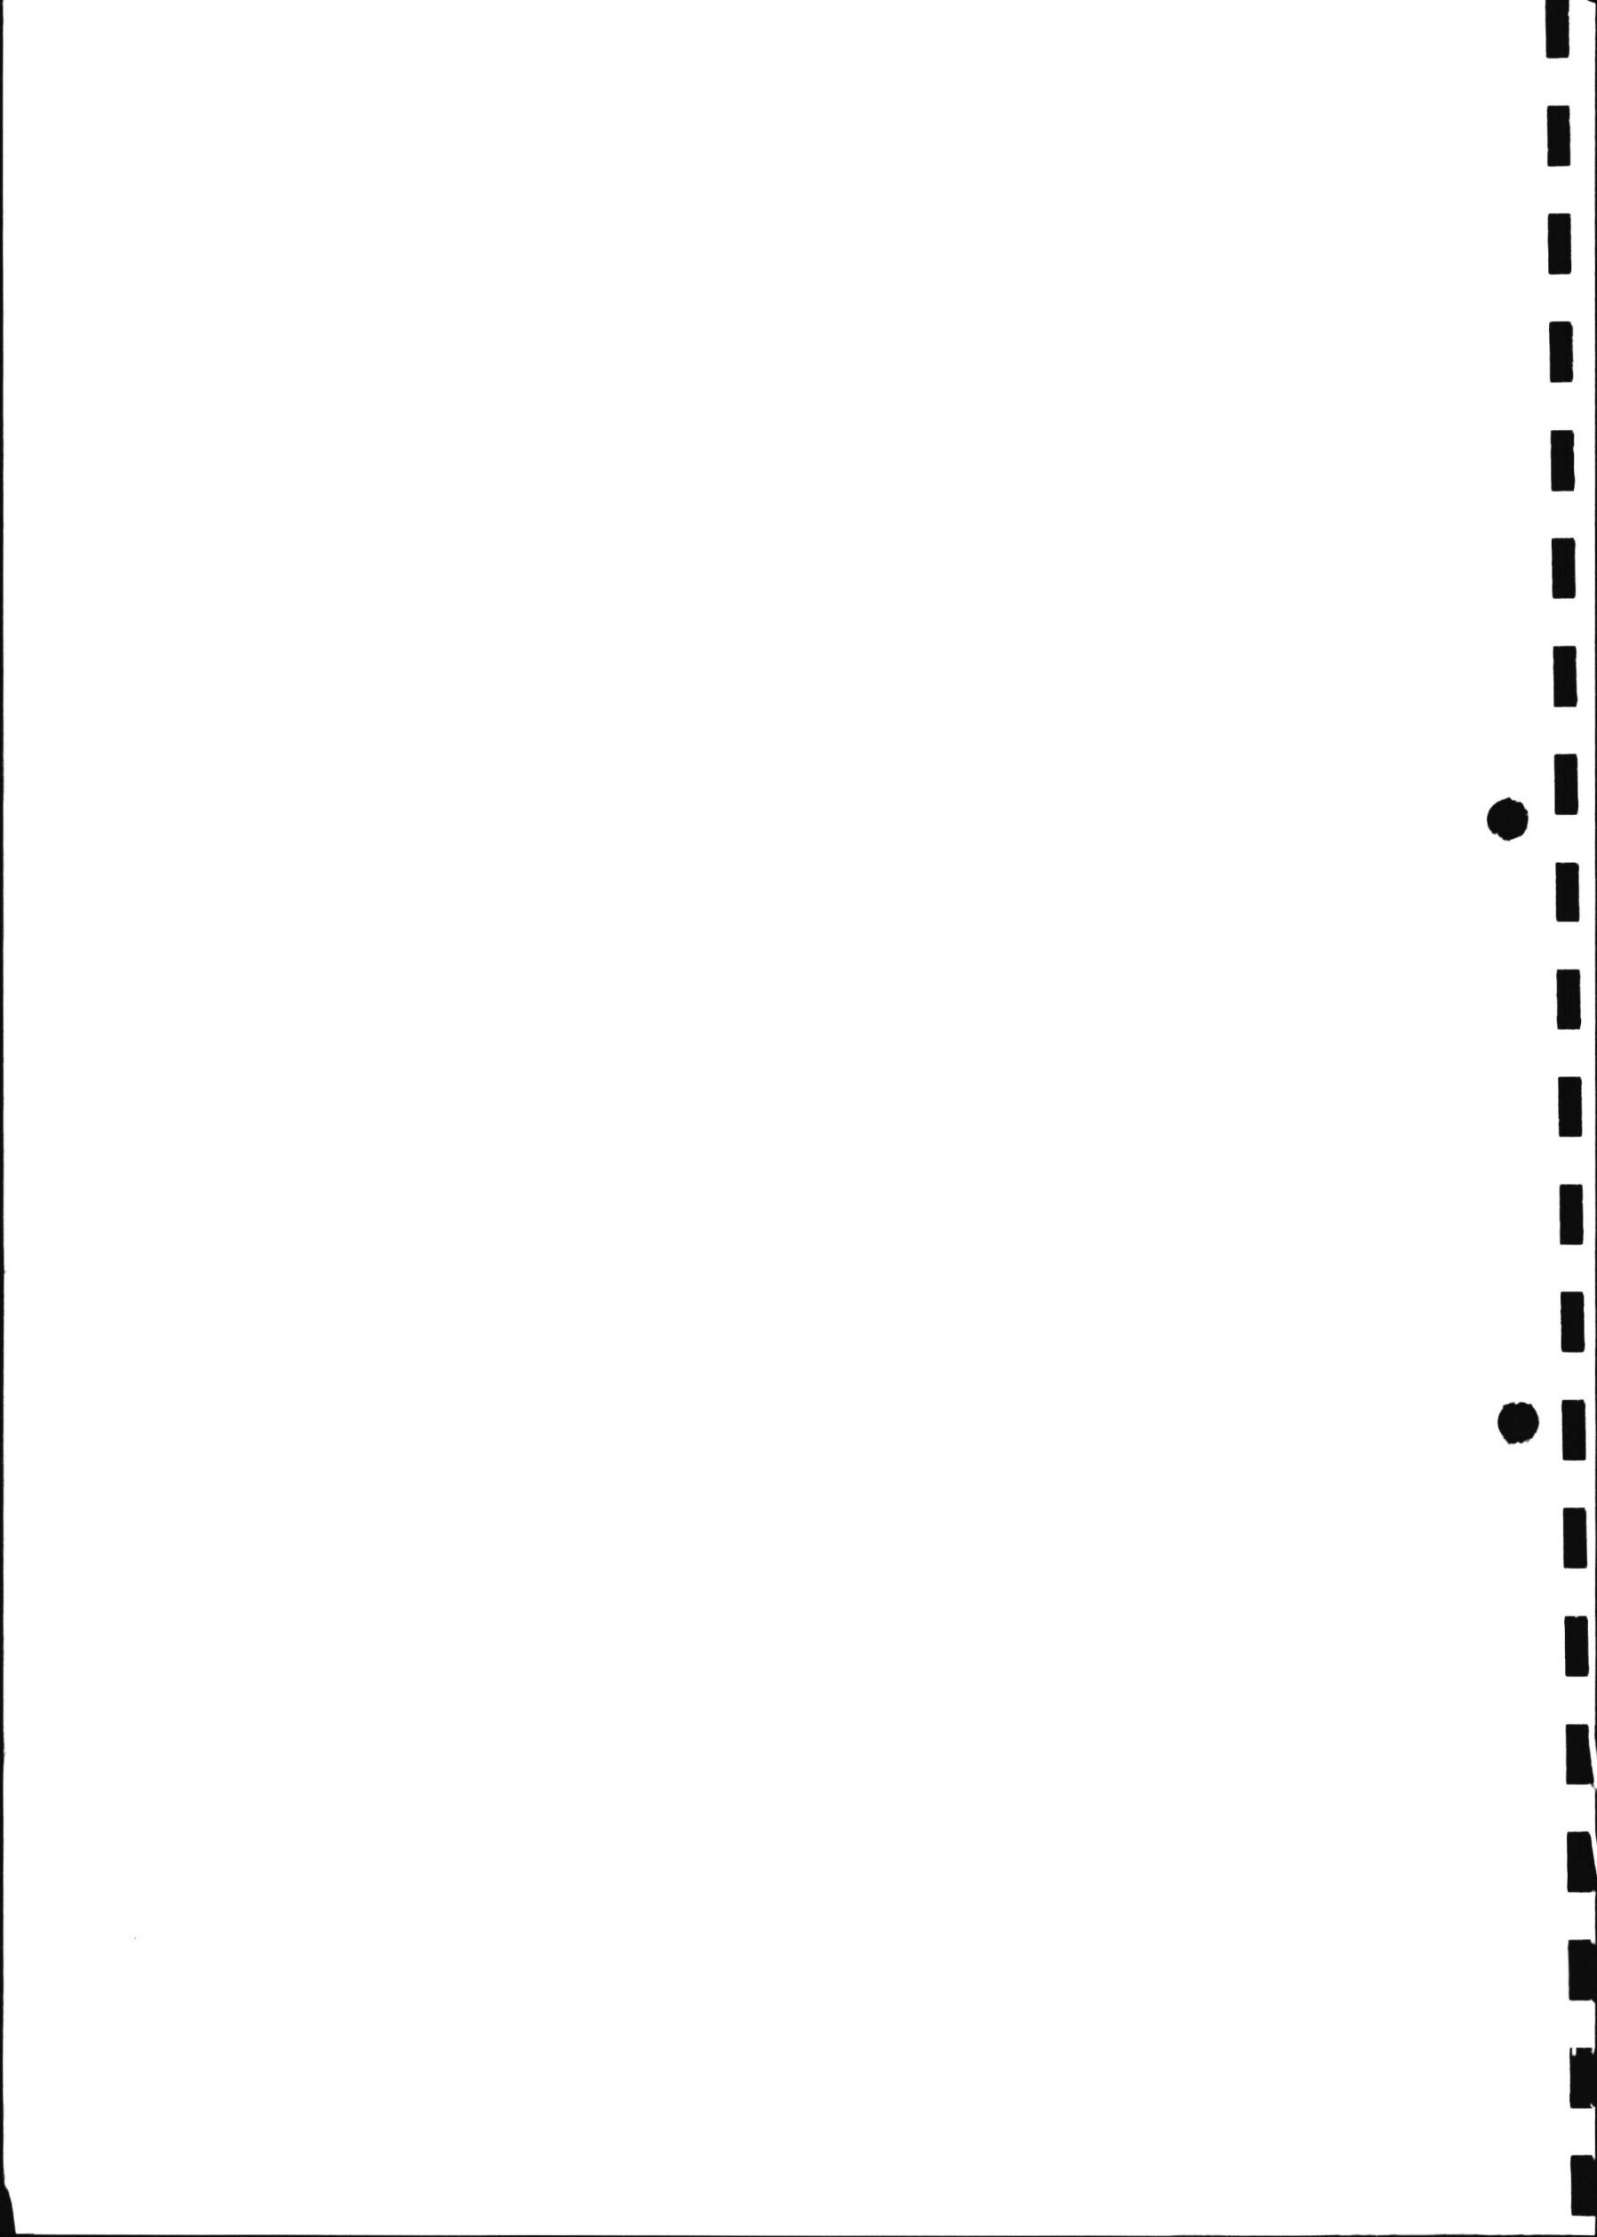

Overzicht uitleggers Barsbekerbinnenpolder te Zwartsluis (970037)

Van putnummer	Naar putnummer	Bladzijde
K2R	R40	11
R27	R26	28
R28	R27	29
R28	R34	32
R29	R28	31
R30	R29	30
R31	R30	4+33
R32	R31	3
R33	R32	2
R35	R35	8
R36	R35	7
R37	R36	6
R38	R33	1
R38	R37	5
R38	R39	9
R39	K2R	10
R39	O2	13
R40	R41	12
R41	R42	16
R42	R43	17
R43	R44	18
R43	R49	14
R44	R45	25
R44	R48	27
R45	R46	24
R48	R47	26
R49	R50	15
R50	R51	23
R51	R52	20
R51	R54	22
R52	R53	19
R54	R55	21

Van putnummer	Naar putnummer	Bladzijde
K2V	V32	11
V28	V27	28
V29	V28	29
V29	V36	32
V30	V29	31
V31	V30	30
V33	V32	4
V34	V33	3
V35	V34	2
V37	V36	8
V38	V37	7
V39	V38	6
V40	V35	1
V40	V39	5
V40	V41	9
V41	K2V	10
V42	V43	12
V43	V44	16
V44	V45	17
V45	V46	18
V45	V51	14
V46	V47	25
V46	V50	27
V47	V48	24
V50	V49	26
V51	V52	15
V52	V53	23
V53	V54	20
V53	V56	22
V54	V55	19
V56	V57	21

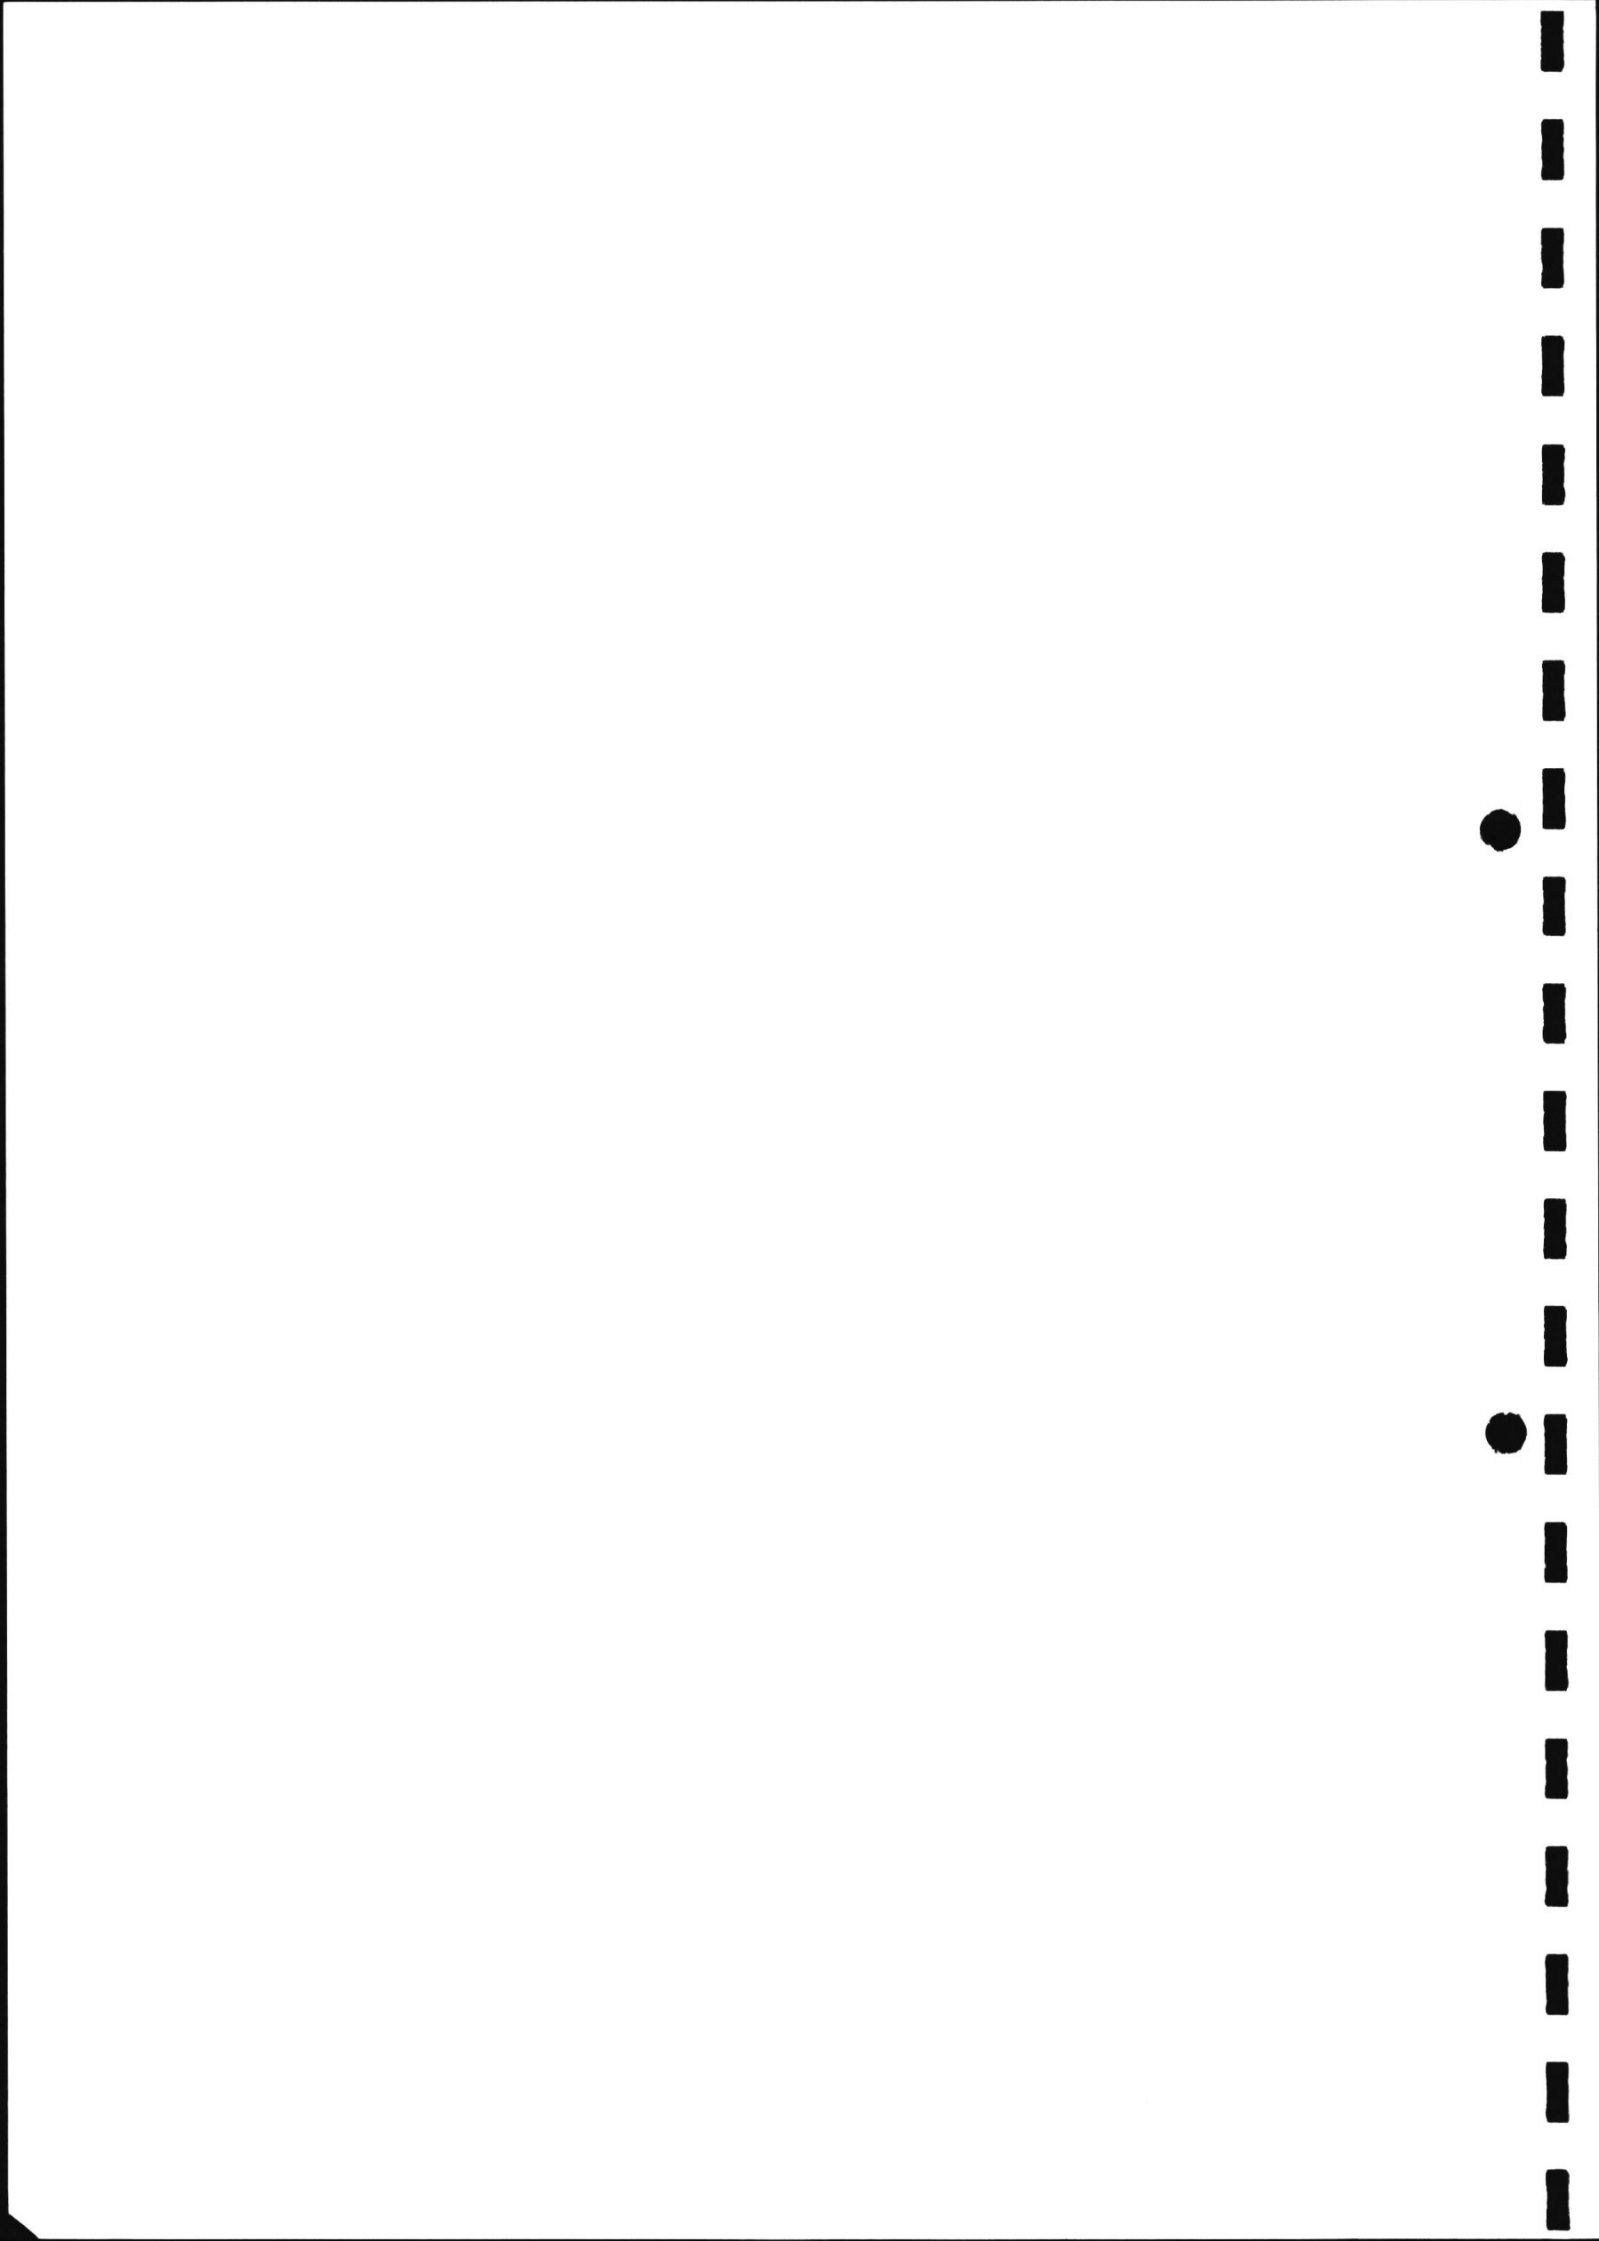



Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 1

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V40</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.95</u>	m1
Naar putnummer	<u>V35</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.79</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>45</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>25,4</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.25</u>	m1
Naar putnummer	<u>R33</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.17</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>0.80</u>	m1
2)	<u>23.40</u>	m1
3)	<u>22.80</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: B.B.B.P

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 2

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V35</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>134</u> -	m1
Naar putnummer	<u>V34</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>110</u> -	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>49</u> m1	beton pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>21.6</u>	m1
2)	<u>3.7</u>	m1
3)	<u>44.6</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R33</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>117</u> -	m1
Naar putnummer	<u>R32</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>106</u> -	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>51.9</u> m1	beton pvc	diameter:	<u>315</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>3.4</u>	m1
2)	<u>4.6</u>	m1
3)	<u>13.8</u>	m1
4)	<u>21.6</u>	m1
5)	<u>3.0</u>	m1
6)	<u>3.7</u>	m1
7)	<u>44.6</u>	m1
8)	<u>44.6</u>	m1
9)	<u>57.3</u>	m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 3

Onderdeel: Riolecrina

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	V34	hoogte t.o.v. peil:	1.18	m1
Naar putnummer	V33	hoogte t.o.v. peil:	1.01	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	47,5 m1	beton / pvc	diameter:	250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	4	m1
2)	12.8	m1
3)	13.8	m1
4)	25.4	m1
5)	31.6	m1
6)	34.2	m1
7)	46.8	m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

perc. 120

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	

Streng gemeten vanaf putnummer	R32	hoogte t.o.v. peil:	1.06	m1
Naar putnummer	R31	hoogte t.o.v. peil:	0.96	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	54,1 m1	beton / pvc	diameter:	250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	1.15	m1
2)	2.6	m1
3)	16.8	m1
4)	19.2	m1
5)	22.5	m1
6)	28.7	m1
7)	31.3	m1
8)	44.4	m1
9)	45.1	m1
10)	46.9	m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

→ niet
aanwezig

perc. 120
KOLK
perc. 109

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal			beton/pvc	





Werkomschrijving: BBBP

Onderdeel: Rioleering

Gemeten door: [Redacted]

Bladnummer: 4

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>1/33</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.01</u>	m1
Naar putnummer	<u>1/32</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>28.15</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>2.5</u>	m1
2)	<u>9</u>	m1
3)	<u>19.6</u>	m1
4)	<u>25.05</u>	m1
5)	<u>37.35</u>	m1
6)	<u>46.9</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

perc. 109 Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>B31</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.96</u>	m1
Naar putnummer	<u>B30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten		beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1</u>	m1
2)	<u>9.8</u>	m1
3)	<u>11.6</u>	m1
4)	<u>16</u>	m1
5)	<u>28.4</u>	m1
6)	<u>39.20</u>	m1
7)	<u>37.35</u>	m1
8)	<u>46.6</u>	m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

perc. 121 Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving:

Bladnummer: 5

Onderdeel:

Gemeten door:

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	V40	hoogte t.o.v. peil:	2.24-	m1
Naar putnummer	V39	hoogte t.o.v. peil:	2.05-	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	59.6 m1	beton / pvc	diameter:	250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	19.25	m1
2)	37.20	m1
3)	63.40	m1
4)	56.20	m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	R38	hoogte t.o.v. peil:	1.44-	m1
Naar putnummer	R37	hoogte t.o.v. peil:	1.32-	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	59.2 m1	beton / pvc	diameter:	315 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	11.8	m1
2)	19.2	m1
3)	35.4	m1
4)	39.2	m1
5)	45.4	m1
6)	57.2	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 6

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>139</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.05</u> m1
Naar putnummer	<u>138</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.01</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>1.6</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R37</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>132</u> m1
Naar putnummer	<u>R36</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>129</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>12.4</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

2.20

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 7

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V38</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.01-</u>	m1
Naar putnummer	<u>V37</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.85-</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44</u> m1	beton pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>13,2</u>	m1
2)	<u>16</u>	m1
3)	<u>31,4</u>	m1
4)	<u>32</u>	m1
5)	<u>40,4</u>	m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

perc. 135
perc. 147

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R36</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>129-</u>	m1
Naar putnummer	<u>R35</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>120-</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>12,5</u>	m1
2)	<u>15,2</u>	m1
3)	<u>25,2</u>	m1
4)	<u>30,6</u>	m1
5)	<u>31,8</u>	m1
6)	<u>40,6</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

perc. 135
perc. 147

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP
Onderdeel: Rioleering
Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 8
Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>137</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.85</u>	m1
Naar putnummer	<u>138</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.70</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44.5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>5.4</u>	m1
2)	<u>9</u>	m1
3)	<u>17.8</u>	m1
4)	<u>23.5</u>	m1
5)	<u>30.5</u>	m1
6)	<u>39.2</u>	m1
7)	<u>41.5</u>	m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R35</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.20</u>	m1
Naar putnummer	<u>R36</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.12</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44.5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1.8</u>	m1
2)	<u>5.2</u>	m1
3)	<u>8.8</u>	m1
4)	<u>10.6</u>	m1
5)	<u>2.2</u>	m1
6)	<u>23.2</u>	m1
7)	<u>30.4</u>	m1
8)	<u>40.2</u>	m1
9)	<u>41.4</u>	m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Bladnummer: 9

Onderdeel: Rioleering

Gemeten door: [Redacted]
J

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>V40</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.24</u>	m1
Naar putnummer	<u>V41</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.39</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>7,5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1,40</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>R38</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.44</u>	m1
Naar putnummer	<u>B39</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.45</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>0,5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>0,90</u>	m1
2)	<u>7,40</u>	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Bladnummer: 10

Onderdeel: Biolering

Gemeten door: [Redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V41</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>- 2.39</u>	m1
Naar putnummer	<u>K2V</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>- 2.33</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>16.25</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>12,4</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R39</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.87</u>	m1
Naar putnummer	<u>K2R</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.96</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>12.56</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>10,4</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:		m1		
Diameter		mm1		
Materiaal	beton/pvc			





Werkomschrijving:

Bladnummer: 4

Onderdeel:

Gemeten door:

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	K2V	hoogte t.o.v. peil:	2.33	m1
Naar putnummer	V42	hoogte t.o.v. peil:	2.30	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	13.3 m1	beton / pvc	diameter:	250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	geen	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	K2B	hoogte t.o.v. peil:	1.76	m1
Naar putnummer	R40	hoogte t.o.v. peil:	1.74	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	12.5 m1	beton / pvc	diameter:	315 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	geen	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 12

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V42</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.30</u>	m1
Naar putnummer	<u>V43</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.26</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>19.10</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>2.6</u>	m1
2)	<u>8.6</u>	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R40</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.74</u>	m1
Naar putnummer	<u>R41</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.70</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>18.5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>2.4</u>	m1
2)	<u>3.6</u>	m1
3)	<u>9.2</u>	m1
4)	<u>10.4</u>	m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: 970037
Onderdeel: Riolerings
Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 13

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	R39	hoogte t.o.v. peil:	1.22	m1
Naar putnummer	02	hoogte t.o.v. peil:	1.20	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	6,8	beton /	diameter:	400 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	

Streng gemeten vanaf putnummer		hoogte t.o.v. peil:		m1
Naar putnummer		hoogte t.o.v. peil:		m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	m1	beton / pvc	diameter:	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	

Van put:	hoogte:	m1
Naar:	hoogte:	m1
Lengte:	m1	
Diameter	mm1	
Materiaal	beton/pvc	





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 14

Onderdeel: Biolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>1/45</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.83 -</u>	m1
Naar putnummer	<u>51</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.65 -</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>53,5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>10</u>	m1
2)	<u>24.6</u>	m1
3)	<u>39.6</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R43</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.19 -</u>	m1
Naar putnummer	<u>R49</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.09 -</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>53</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>9</u>	m1
2)	<u>17.5</u>	m1
3)	<u>23.4</u>	m1
4)	<u>24.4</u>	m1
5)	<u>39.6</u>	m1
6)	<u>40</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Bladnummer: 15

Onderdeel: Bioleering

Gemeten door: [Redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V51</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.65</u>	m1
Naar putnummer	<u>V52</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.48</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>51.6</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>2</u>	m1
2)	<u>15.6</u>	m1
3)	<u>30.6</u>	m1
4)	<u>45.4</u>	m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R49</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.09</u>	m1
Naar putnummer	<u>R50</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.98</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>51.10</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1.4</u>	m1
2)	<u>8.5</u>	m1
3)	<u>13.4</u>	m1
4)	<u>15</u>	m1
5)	<u>27.6</u>	m1
6)	<u>30</u>	m1
7)	<u>39.8</u>	m1
8)	<u>44.8</u>	m1
9)	<u>47</u>	m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B B B P

Bladnummer: 16

Onderdeel: Rielesing

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V43</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.26 -</u>	m1
Naar putnummer	<u>V44</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.13 -</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>49.8</u> m1	beton pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>5.2</u>	m1
2)	<u>2.0</u>	m1
3)	<u>34.8</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R41</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.70 -</u>	m1
Naar putnummer	<u>R42</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.60 -</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>50.6</u> m1	beton pvc	diameter: <u>315</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>5.6</u>	m1
2)	<u>1.6</u>	m1
3)	<u>19.9</u>	m1
4)	<u>32.7</u>	m1
5)	<u>34.6</u>	m1
6)	<u>4.1</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving:

Bladnummer: 17

Onderdeel:

Gemeten door:

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	V44	hoogte t.o.v. peil:	2.13	m1
Naar putnummer	V45	hoogte t.o.v. peil:	2.00	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	48.75 m1	beton / pvc	diameter:	250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	1.60	m1
2)	14.20	m1
3)	2.9	m1
4)	4.4	m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	R42	hoogte t.o.v. peil:	1.60	m1
Naar putnummer	R43	hoogte t.o.v. peil:	1.50	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	4.9 m1	beton / pvc	diameter:	315 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	1.10	m1
2)	13.8	m1
3)	14.8	m1
4)	2.0	m1
5)	28.6	m1
6)	39.8	m1
7)	45.6	m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal	beton/pvc			





Werkomschrijving: Zwartsluis
Onderdeel: Riolering
Gemeten door: XXXXXXXXXX
J

Bladnummer: 18

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V45</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>2.00</u>	m1
Naar putnummer	<u>V46</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.80</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>56.75</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R43</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.50</u>	m1
Naar putnummer	<u>R44</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.40</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>54.2</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>8.6</u> m1
2)	<u>25.6</u> m1
3)	<u>13.4</u> m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: 970037
Onderdeel: Riole
Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 19

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	V54	hoogte t.o.v. peil:	1.43	m1
Naar putnummer	V55	hoogte t.o.v. peil:	1.27	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	49,30 m1	beton / pvc	diameter: 1 250	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	5	m1
2)	9,2	m1
3)	17,6	m1
4)	23,2	m1
5)	26,4	m1
6)	37,2	m1
7)	39,95	m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	R52	hoogte t.o.v. peil:	0.95	m1
Naar putnummer	R53	hoogte t.o.v. peil:	0.85	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	49,80 m1	beton / pvc	diameter: 250	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	22,2	m1
2)	44,4	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 20

Onderdeel: Rioleering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>153</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.47</u>	m1
Naar putnummer	<u>154</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.43</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>10.8</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>5.6</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R51</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u>	m1
Naar putnummer	<u>R52</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.95</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>10.35</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>9.4</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 2

Onderdeel: Biolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>V56</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u> m1
Naar putnummer	<u>V57</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>3305</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>6</u>	m1
2)	<u>24,2</u>	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>R54</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.93</u> m1
Naar putnummer	<u>R55</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>3285</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>7,4</u>	m1
2)	<u>30</u>	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 22

Onderdeel: Rioleering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V53</u>	hoogte t.o.v. peil:		
Naar putnummer	<u>V56</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.99</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>5.60</u> m1	beton / pvc	<u>-0.97</u>	m1
		diameter:	<u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R51</u>	hoogte t.o.v. peil:		
Naar putnummer	<u>R54</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>7.10</u> m1	beton pvc	<u>0.94</u>	m1
		diameter:	<u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: BBBP
Onderdeel: Biolering
Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 23

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V52</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.48</u>	m1
Naar putnummer	<u>V53</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.47</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>4</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R50</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.98</u>	m1
Naar putnummer	<u>R51</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>6.5</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: zwartsluis

Bladnummer: 24

Onderdeel: Riolering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V47</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.95</u> m1
Naar putnummer	<u>V40</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>31.25</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>7</u>	m1
2)	<u>1.6</u>	m1
3)	<u>15.8</u>	m1
4)	<u>20.4</u>	m1
5)	<u>30</u>	m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R45</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.91</u> m1
Naar putnummer	<u>R46</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>31.05</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>3.2</u>	m1
2)	<u>22.4</u>	m1
3)	<u>24.8</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: Zwartsluis

Bladnummer: 25

Onderdeel: Riddering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V46</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.07</u> m1
Naar putnummer	<u>V47</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.95</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>30.8</u> m1	beton pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>3.6</u>	m1
2)	<u>8.4</u>	m1
3)	<u>16.4</u>	m1
4)	<u>21</u>	m1
5)	<u>25</u>	m1
6)	<u>30</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R44</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.98</u> m1
Naar putnummer	<u>R45</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.91</u> m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>30.4</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>12.4</u>	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:	m1		
Diameter	mm1		
Materiaal	beton/pvc		





Werkomschrijving: Zwarts/luis

Onderdeel: Biolecluse

Gemeten door: [redacted]

Bladnummer: 26

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>V50</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.96-</u>	m1
Naar putnummer	<u>V49</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85-</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>31</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>15</u>	m1
2)	<u>7.6</u>	m1
3)	<u>12.2</u>	m1
4)	<u>16.6</u>	m1
5)	<u>21</u>	m1
6)	<u>29.7</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>R48</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.91-</u>	m1
Naar putnummer	<u>R47</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85-</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>29.35</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>2.5</u>	m1
2)	<u>2.6</u>	m1
3)	<u>23.6</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving:

Bladnummer: 27

Onderdeel:

Gemeten door:

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	146	hoogte t.o.v. peil:	107	m1
Naar putnummer	150	hoogte t.o.v. peil:	094	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	31 m1	beton / pvc	diameter: 250	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	5	m1
2)	9,8	m1
3)	17,8	m1
4)	22,4	m1
5)	26,6	m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	R44	hoogte t.o.v. peil:	098	m1
Naar putnummer	R49	hoogte t.o.v. peil:	091	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	29,5 m1	beton / pvc	diameter: 250	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	11,5	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Bladnummer: 28

Onderdeel: R. o. l. e. n. g.

Gemeten door: [Redacted]

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>R27</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.94</u>	m1
Naar putnummer	<u>R26</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.95</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>43.10</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1</u>	m1
2)	<u>11.4</u>	m1
3)	<u>14.6</u>	m1
4)	<u>17</u>	m1
5)	<u>23</u>	m1
6)	<u>41</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

*Kolk
Kolk
Kolk*

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>V28</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.98</u>	m1
Naar putnummer	<u>V27</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.95</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>39.3</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>5</u>	m1
2)	<u>14.4</u>	m1
3)	<u>27</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	

Van put:		hoogte:	m1
Naar:		hoogte:	m1
Lengte:		m1	
Diameter		mm1	
Materiaal		beton/pvc	





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 29

Onderdeel: Risicotoeslag

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>B28</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.03</u>	m1
Naar putnummer	<u>B27</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.94</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>44.8</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>10.2</u>	m1
2)	<u>11.7</u>	m1
3)	<u>17.8</u>	m1
4)	<u>24.5</u>	m1
5)	<u>33.2</u>	m1
6)	<u>34</u>	m1
7)	<u>39.8</u>	m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

kolk

kolk

kolk

kolk

kolk

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>129</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.12</u>	m1
Naar putnummer	<u>129</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.98</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>39.65</u> m1	beton / pvc	diameter: <u>250</u>	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>10</u>	m1
2)	<u>22.8</u>	m1
3)	<u>32.2</u>	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: B.B.B.P.

Bladnummer: 30

Onderdeel: Ruitering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u>	m1
Naar putnummer	<u>R29</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.93</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>39.5</u> m1	beton / pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>10.2</u>	m1
2)	<u>10.8</u>	m1
3)	<u>16.4</u>	m1
4)	<u>22.8</u>	m1
5)	<u>33.35</u>	m1
6)	<u>36.40</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

kolik
kolik

kolik

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>V31</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u>	m1
Naar putnummer	<u>V30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>34.5</u> m1	beton / pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1</u>	m1
2)	<u>11</u>	m1
3)	<u>21</u>	m1
4)	<u>33.8</u>	m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 31

Onderdeel: Rioleering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>R29</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.93</u>	m1
Naar putnummer	<u>R28</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.01</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>40,3</u> m1	beton / pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>1.2</u>	m1
2)	<u>6</u>	m1
3)	<u>16.7</u>	m1
4)	<u>21.5</u>	m1
5)	<u>23.2</u>	m1
6)	<u>2.9</u>	m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

kolle

kolle

kolle

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	<u>V30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.97</u>	m1
Naar putnummer	<u>V29</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>1.05</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>33.2</u> m1	beton / pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>9.5</u>	m1
2)	<u>22.3</u>	m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 32

Onderdeel: Risikering

Gemeten door: [redacted]

Datum:

Streng gemeten vanaf putnummer	V29	hoogte t.o.v. peil:	(1.55-) 1.12- gewijzigd. m1
Naar putnummer	V36	hoogte t.o.v. peil:	1.70- m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	49 m1	beton / pvc	diameter: 250 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	41	m1
2)		m1
3)		m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten vanaf putnummer	R28	hoogte t.o.v. peil:	1.05- m1
Naar putnummer	R34	hoogte t.o.v. peil:	1.12- m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	40,4 m1	beton / pvc	diameter: 315 mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	19	m1
2)	40	m1
3)	45	m1
4)		m1
5)		m1
6)		m1
7)		m1
8)		m1
9)		m1
10)		m1
11)		m1
12)		m1
13)		m1
14)		m1
15)		m1
16)		m1
17)		m1
18)		m1
19)		m1
20)		m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc





Werkomschrijving: BBBP

Bladnummer: 33

Onderdeel: Riolekking

Gemeten door: [Redacted]

Datum:

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer	<u>R 31</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.96</u>	m1
Naar putnummer	<u>R 30</u>	hoogte t.o.v. peil:	<u>0.85</u>	m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten	<u>57,8</u> m1	<u>beton</u> / pvc	diameter:	<u>250</u> mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	<u>40,6</u> m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Kolk

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Streng gemeten <u>vanaf</u> putnummer		hoogte t.o.v. peil:		m1
Naar putnummer		hoogte t.o.v. peil:		m1
Lengte streng h.o.h. tussen putten		<u>beton</u> / pvc	diameter:	mm1

Afstand inlaten vanaf hart put

1)	m1
2)	m1
3)	m1
4)	m1
5)	m1
6)	m1
7)	m1
8)	m1
9)	m1
10)	m1
11)	m1
12)	m1
13)	m1
14)	m1
15)	m1
16)	m1
17)	m1
18)	m1
19)	m1
20)	m1

Overige aansluitingen

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc

Van put:		hoogte:		m1
Naar:		hoogte:		m1
Lengte:				m1
Diameter				mm1
Materiaal				beton/pvc



PUTTENSTAAT

P.B. 219

4600 AE BERGEN OP ZOOM

TEL: 0164-274200

FAX: 0164-274277

Puttenstaat nr : JP0622 Ordernummer : 806.029.2

Opdrachtgever : Combinatie Schagen Beens

Aantal bladen
(incl. voorblad) : 23
Buizenblad : Ja

Referentie/tel : XXXXXXXXXX J

Op afroep
gereed vanaf : 15-06-98

Werk en plaats : Barsbekerbinnenpolder
: Zwartsluis

Leveringssnelheid: 12 putten per week

Direktie :

	NAAM/WIJZ.	DATUM	ACCOORD.
GEMAAKT	JP	03-06-98	
1e WIJZIGING			
2e WIJZIGING			
3e WIJZIGING			
4e WIJZIGING			

Puttenstaat bestemd voor:

Externe order
Productie
Goedgekeurd

WERK		g70037 BBBP	
AKTIE		TER INFO	
—		(WP)	W+B

IN TE STORTEN ONDERDELEN :

Put nr.	Onderdeel	Afmeting	Bestel datum	Door	Leverancier	lever datum	Fabriek	Geleverd	Extra
K2V	Ts.Klep	200			KST				Aansluiting in wand

Afdeklaat	= Dicht	<- = Uitg. leiding	SP 300 = sparl. voor buis 300	SPHHNR = Hondehok ϕ NEN
Bovenplaat	= Gat 600	W = Wapening	SPNR = ϕ NEN	SPHHN = Hondehok ei NEN
Tussenplaat	= Opbouw tbv. verj.	-[= Mof	SPN = ei NEN	SPHH = Hondehok
OV	= Overstort	— = Spie	UB = ultra-rib beton	SpRH = Rechth. sparing
H	= Totale put hoogte	= = Pvc	U = ultra-rib	SpD = Inw./diam
h	= Hoogte BOK t.o.v. buiten onderkant put.			



WACO-LIESBOSCH BETON bv BERGEN OP ZOOM

Puttenst. nr. JP0622		Order nr. 806.029.2	Blad nr. B1
----------------------	--	---------------------	-------------

Mee te leveren buizen :

6 st MS buizen ϕ 400 x 2400 mm

2 st S/S buizen lang 1900 mm



WACO LIESBOSCH BETON

PUTTENSTAATNUMMER: JP0622
 OPDRACHTGEVER: Combinatie Schagen Beens
 WFRM: Barsbekerbinnenpolder Zwartsluis

ORDERNUMMER : 806.029.2
 BLADNUMMER : 1
 DATUM AANMAAK : 03-06-1998
 DATUM WIJZIGING : - - - AANTAL BLADEN : 4

Puttnr.	Lev.dat.	Afim.	Opbouw								Totale put hoogte H	Aansluitingen				Str. prf.	Gewicht Totale Put.	Voorraad Code	Opmerkingen
			OB	KosP	TP	Os1	Os2	Kegel	BP	AD		Aantal	specificatie Aansl. / Diam. / h / Hoek						
R28	18-06-98	φ0800	800					#580			1380	3	<Pvc Pvc	315 /180 /5 250 /220 /270	Pvc 250 /200 /90	Ja	1361	162	
V29	18-06-98	■0900	1300					#550			1850	3	<Pvc Pvc	250 /180 /5 250 /650 /270	Pvc 250 /610 /90	Ja	2632	234	
R31	18-06-98	φ0800	#800					#580			1380	2	<Pvc	315 /180 /0	Pvc 315 /180 /180	Ja	1361	E01-162	
R33	18-06-98	φ0800	800					#700			1500	2	<Pvc	315 /180 /45	Pvc 315 /180 /180	Ja	1445	165	
V35	18-06-98	φ0800	#800			#800		#500			2100	2	<Pvc	250 /180 /45	Pvc 250 /180 /180	Ja	1865	D09-152 160	
R34	18-06-98	φ0800	#800					#620			1420	2	<Pvc	315 /180 /0	Pvc 315 /180 /180	Ja	1389	E01-163	
V36	18-06-98	φ0800	#800			#800		#420			2020	2	<Pvc	250 /180 /0	Pvc 250 /180 /180	Ja	1809	D18-152 158	
R35	18-06-98	φ0800	#800					#740			1540	2	<Pvc	315 /180 /0	Pvc 315 /180 /180	Ja	1473	E01-166	
V37	18-06-98	φ0800	#800			#800		#580			2180	2	<Pvc	250 /180 /0	Pvc 250 /180 /180	Ja	1921	D18-152 162	
R36	18-06-98	φ0800	800					#820			1620	2	<Pvc	315 /180 /335	Pvc 315 /180 /180	Ja	1529	168	
V38	18-06-98	φ0800	#800			#800		#740			2340	2	<Pvc	250 /180 /335	Pvc 250 /180 /180	Ja	2033	D05-152 166	
R37	18-06-98	φ0800	800					#860			1660	2	<Pvc	315 /180 /315	Pvc 315 /180 /155	Ja	1557	169	
V39	18-06-98	φ0800	#800			#800		#780			2380	2	Pvc	250 /180 /315	<Pvc 250 /180 /155	Ja	2061	D04-152 167	
R38	18-06-98	φ0800	1020					#740			1760	3	<Pvc Pvc	315 /180 /315 315 /370 /225	Pvc 315 /180 /135	Ja	1627	166	
R39	18-06-98	■0900	1500					#700			2200	3	Pvc <Pvc	315 /600 /135 315 /180 /315	Pvc 315 /830 /225	Ja	3000	237	
V40	18-06-98	φ0800	1020			#800		#740			2560	3	<Pvc Pvc	250 /180 /315 250 /470 /225	Pvc 250 /180 /135	Ja	2187	152-166	
V41	18-06-98	φ0800	#800			#1020		#900			2720	3	Pvc <Pvc	250 /180 /315 250 /180 /225	Pvc 250 /180 /135	Ja	2299	D21-153 170	
V42	18-06-98	■1150	1300					#BP			1450	3	<S	400 /180 /0	M 400 /180 /180	Nee	3375	577	BP met 2 x mangat !!



WACO LIESBOSCH BETON

PUTTENSTAATNUMMER: JP0622
 OPDRACHTGEVER : Combinatie Schagen Beens
 WERK : Barsbekerbinnenpolder Zwartsluis

ORDERNUMMER : 806.029.2
 BLADNUMMER : 2
 DATUM AANMAAK : 03-06-1998
 DATUM WIJZIGING : - - AANTAL BLADEN : 4

Putnr.	Lev.dat.	Afm.	Opbouw							Totale put hoogte H	Aansluitingen		Str. prf.	Gewicht Totale Put	Voorraad Code	Opmerkingen
			OB	KosP	TP	Os1	Os2	Kegel	BP	AD	Aantal	specificatie Aansl. / Diam. / h / Hoek				
												OV/-1200/60/1150				
R 26	25-06-98	φ0800	#800					#380			1180	1 <Pvc 250 /180 /270	Ja	1221	D19-157	
V27	25-06-98	φ0800	#800					#380			1180	1 <Pvc 250 /180 /270	Ja	1221	D19-157	
R27	25-06-98	φ0800	#800					#460			1260	2 Pvc 250 /180 /90 <Pvc 250 /180 /270	Ja	1277	D18-159	
V28	25-06-98	φ0800	#800					#500			1300	2 Pvc 250 /180 /90 <Pvc 250 /180 /270	Ja	1305	D18-160	
R29	25-06-98	φ0800	#800					#460			1260	2 <Pvc 250 /180 /90 Pvc 250 /180 /270	Ja	1277	D18-159	
V30	25-06-98	φ0800	#800					#500			1300	2 <Pvc 250 /180 /90 Pvc 250 /180 /270	Ja	1305	D18-160	
R30	25-06-98	φ0800	800					#380			1180	2 <Pvc 250 /180 /5 Pvc 250 /180 /90	Ja	1221	157	
V31	25-06-98	φ0800	#800					#380			1180	1 <Pvc 250 /180 /90	Ja	1221	D19-157	
V32	25-06-98	φ0800	#800					#380			1180	1 <Pvc 250 /180 /0	Ja	1221	D19-157	
R31	25-06-98	φ0800	#800					#460			1260	2 <Pvc 250 /180 /0 Pvc 250 /180 /180	Ja	1277	D18-159	
V33	25-06-98	φ0800	#800					#540			1340	2 <Pvc 250 /180 /0 Pvc 250 /180 /180	Ja	1333	D18-161	
V34	25-06-98	φ0800	#800					#700			1500	2 <Pvc 250 /180 /0 Pvc 250 /180 /180	Ja	1445	D18-165	
R40	25-06-98	φ0800	800			#800		#460			2060	2 <Pvc 315 /180 /135 Pvc 315 /180 /290	Ja	1837	152-159	
R28	25-06-98	φ0900	900					1350			2250	3 <Pvc 200 /180 /0 Pvc 200 /320 /270	Ja	3052		
V24	25-06-98	φ0900	1100					1550			2650	4 <Pvc 250 /180 /90 Pvc 250 /180 /270 Ts.Klep200/600/180	Ja	3472		
V42	25-06-98	φ0800	#800			#1020		#820			2640	2 <Pvc 250 /180 /135 Pvc 250 /180 /290	Ja	2243	D05-153 168	
V41	25-06-98	φ0800	800			#800		#420			2020	2 <Pvc 315 /180 /110 Pvc 315 /180 /270	Ja	1809	152-158	
V43	25-06-98	φ0800	#800			#800		#980			2580	2 <Pvc 250 /180 /110 Pvc 250 /180 /270	Ja	2201	D04-152 172	
R42	01-07-98	φ0800	#800			#800		#340			1940	2 <Pvc 315 /180 /90 Pvc 315 /180 /270	Ja	1753	E01-152 156	
V44	01-07-98	φ0800	#800			#800		#860			2460	2 <Pvc 250 /180 /90 Pvc 250 /180 /270	Ja	2117	D18-152	



WACO LIESBOSCH BETON

PUTTENSTAATNUMMER: JP0622

OPDRACHTGEVER : Kombinatie Schagen Beens

WERK : Barsbekerbinnenpolder Zwartsluis

DATUM AANMAAK : 03-06-1998

DATUM WIJZIGING : - -

ORDERNUMMER : 806.029.2

BLADNUMMER : 3

AANTAL BLADEN : 4

Putnr.	Lev.dat.	Afm.	Opbouw								Totale put hoogte H	Aansluitingen				Str. prf.	Gewicht Totale Put.	Voor- raad Code	Opmerkingen	
			OB	KosP	TP	Os1	Os2	Kegel	BP	AD		Aan- tal	specificatie Aansl. / Diam. / h / Hoek							
																	169			
R43	02-07-98	φ0800	1020					#820			1840	3	<Pvc Pvc	315 /180 /90 250 /490 /270	Pvc	250 /180 /180	Ja	1683	168	
V45	02-07-98	φ0800	1020			#800		#500			2320	3	<Pvc Pvc	250 /180 /90 250 /350 /270	Pvc	250 /180 /180	Ja	2019	152-160	
R44	02-07-98	φ0900	1100					#650			1750	3	<Pvc Pvc	250 /180 /0 250 /600 /270	Pvc	250 /600 /90	Ja	2527	236	
R49	02-07-98	φ0800	#800					#620			1420	2	<Pvc	250 /180 /90	Pvc	250 /180 /270	Ja	1389	018-163	
V51	02-07-98	φ0800	#800			#800		#380			1980	2	<Pvc	250 /180 /90	Pvc	250 /180 /270	Ja	1781	018-152 157	
R50	02-07-98	φ0800	#800					#500			1300	2	Pvc	250 /190 /315	<Pvc	250 /180 /90	Ja	1305	009-160	
V52	02-07-98	φ0800	#800					#1020			1820	2	Pvc	250 /190 /315	<Pvc	250 /180 /90	Ja	1669	009-173	
R51	02-07-98	φ0800	#800					#500			1300	3	Pvc Pvc	250 /180 /315 250 /180 /225	<Pvc	250 /180 /135	Ja	1305	021-160	
V53	02-07-98	φ0900	1300					#500			1800	3	<Pvc Pvc	250 /180 /135 250 /660 /315	Pvc	250 /180 /225	Ja	2580	233	
R52	02-07-98	φ0800	#800					#460			1260	2	<Pvc	250 /180 /45	Pvc	250 /180 /180	Ja	1277	009-159	
V54	02-07-98	φ0800	#800					#980			1780	2	<Pvc	250 /180 /45	Pvc	250 /180 /180	Ja	1641	009-172	
R55	02-07-98	φ0800	#800					#380			1180	1	<Pvc	250 /180 /0			Ja	1221	019-157	
V56	02-07-98	φ0800	#800					#820			1620	1	<Pvc	250 /180 /0			Ja	1529	019-168	
R57	02-07-98	φ0800	#800					#460			1260	2	Pvc	250 /180 /0	<Pvc	250 /180 /135	Ja	1277	009-159	
V58	02-07-98	φ0800	#800					#540			1340	2	Pvc	250 /200 /0	<Pvc	250 /180 /135	Ja	1333	009-161	
R59	02-07-98	φ0800	#800					#380			1180	1	<Pvc	250 /180 /180			Ja	1221	019-157	
V60	02-07-98	φ0800	#800					#380			1180	1	<Pvc	250 /180 /180			Ja	1221	019-157	
R61	02-07-98	φ0900	1500					#650			2150	3	<Pvc Pvc	250 /180 /0 250 /910 /270	Pvc	250 /910 /90	Ja	2947	236	
R62	02-07-98	φ0800	#800					#460			1260	2	Pvc	250 /180 /90	<Pvc	250 /180 /270	Ja	1277	018-159	



WACO LIESBOSCH BETON


RUTTENSTAATNUMMER JP0622
OPDRACHTGEVER : Combinatie Schagen Beens
WERK : Barsbekerbinnenpolder Zwartsluis


DATUM AANMAAK : 03-06-1998
DATUM WIJZIGING : - -


ORDERNUMBER : 806.029.2
BLADNUMBER : 4
AANTAL BLADEN : 4

[illegible]





Blad : 1/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R 26
 Pvc250 /850- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	


Blad : 1/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V27
 Pvc250 /850- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	

Blad : 1/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R27
 Pvc250 /940- h = 180 90° Pvc250 /940- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 400 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 940- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	





Blad : 2/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1300	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V28
 Pvc250 /980- h = 180 270° Pvc250 /980- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 980- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1300	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	


Blad : 2/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1380	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R28
 Pvc315 /1050- h = 180 5° Pvc250 /1030- h = 200 90° Pvc250 /1010- h = 220 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 580	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1050- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1380	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	

Blad : 2/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1850	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0900	Putnr: V29
 Pvc250 Midden/1550- h = 180 5° Pvc250 Midden/1120- h = 610 90° Pvc250 Midden/1080- h = 650 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 1300 Kegelstuk : 550	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 420 Bovenkant put : 120+ Laagste B.O.K. : 1550- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1850	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	





Blad : 3/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R29
 Pvc250 /930- h = 180 270° Pvc250 /930- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 930- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	


Blad : 3/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1300	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V30
 Pvc250 /970- h = 180 270° Pvc250 /970- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 970- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1300	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	

Blad : 3/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R30
 Pvc250 /850- h = 180 5° Pvc250 /850- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	





Blad : 4/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V31
 Pvc250 /850- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				


Blad : 4/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V32
 Pvc250 /850- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				

Blad : 4/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R31
 Pvc250 /960- h = 180 0° Pvc250 /960- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen: 420 Bovenkant put : 120+ Laagste B.O.K. : 960- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				





Blad : 5/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1340	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V33
Pvc250 /1010- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 540	
Pvc250 /1010- h = 180 180°				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1010- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1340	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 5/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1380	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R32
Pvc315 /1060- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 580	
Pvc315 /1060- h = 180 180°				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 1060- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1380	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 5/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1500	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V34
Pvc250 /1180- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 700	
Pvc250 /1180- h = 180 180°				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 1180- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1500	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 6/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1500	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R33
 Pvc315 /1170- h = 180 45° Pvc315 /1170- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 700	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1170- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1500	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	


Blad : 6/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2100	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V35
 Pvc250 /1790- h = 180 45° Pvc250 /1790- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 410 Bovenkant put : 130+ Laagste B.O.K. : 1790- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2100	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	

Blad : 6/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1420	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R34
 Pvc315 /1120- h = 180 0° Pvc315 /1120- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 620	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 420 Bovenkant put : 120+ Laagste B.O.K. : 1120- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1420	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	





Blad : 7/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2020	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V36
Pvc250 /1700- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 420 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 540+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 1700- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2020	
				Pvc250 /1700- h = 180 180°	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 7/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1540	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R35
Pvc315 /1200- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 740 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 160+ Laagste B.O.K. : 1200- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1540	
				Pvc315 /1200- h = 180 180°	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 7/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2180	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V37
Pvc250 /1850- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 580 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2180	
				Pvc250 /1850- h = 180 180°	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 8/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1620	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R36
Pvc315 /1290- h = 180 335°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 820	
Pvc315 /1290- h = 180 180°				Stroomprofiel : Ja	
WAP. WACO-LIESBOSCH Nee BETON BV				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1290- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1620	
				OPM:	


Blad : 8/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2340	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V38
Pvc250 /2010- h = 180 335°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 740	
Pvc250 /2010- h = 180 180°				Stroomprofiel : Ja	
WAP. WACO-LIESBOSCH Nee BETON BV				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 2010- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2340	
				OPM:	

Blad : 8/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1660	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R37
Pvc315 /1320- h = 180 315°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 860	
Pvc315 /1320- h = 180 155°				Stroomprofiel : Ja	
WAP. WACO-LIESBOSCH Nee BETON BV				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 390 Bovenkant put : 160+ Laagste B.O.K. : 1320- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1660	
				OPM:	





Blad : 9/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2380	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: V39
Pvc250 /2050- h = 180 315°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 780 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 2050- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2380	
					
Pvc250 /2050- h = 180 155°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 9/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1760	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R38
Pvc315 /1440- h = 180 315°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1020 Kegelstuk : 740 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 410 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 1440- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1760	
					
Pvc315 /1250- h = 370 225°					
Pvc315 /1440- h = 180 135°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 9/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2200	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0900	Putnr: R39
Pvc315 Midden/1870- h = 180 315°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1500 Kegelstuk : 700 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1870- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2200	
					
Pvc315 Midden/1220- h = 830 225°					
Pvc315 Midden/1450- h = 600 135°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 10/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2560	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr : V40
Pvc250 /2240- h = 180 315°  Pvc250 /1950- h = 470 225° Pvc250 /2240- h = 180 135°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1020 Opzetstuk 1 : 800 Kegelstuk : 740 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 410 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 2240- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2560	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 10/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2720	Lev.dat : 18-06-1998	Putafm : 0800	Putnr : V41
Pvc250 /2390- h = 180 315°  Pvc250 /2390- h = 180 225° Pvc250 /2390- h = 180 135°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Opzetstuk 1 : 1020 Kegelstuk : 900 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 2390- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2720	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 10/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1450	Lev.dat : 24-06-1998	Putafm : 1150	Putnr : OV2
S400 Midden/1200- h = 180 0°  M400 Midden/1200- h = 180 180° 1500 1000				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1300 Bovenplaat : 150 Stroomprofiel : Nee Maaiveld : 500+ Putrand+stellagen : 430 Bovenkant put : 70+ Laagste B.O.K. : 1200- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1450	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OV -1200 /60+ /1150	
Nee	BETON BV			OPM: BP met 2 x mangat !!	





Blad : 11/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2060	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr: R40
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 410	
				Bovenkant put : 140+	
				Laagste B.O.K. : 1740-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 2060	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 11/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2250	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0900	Putnr: K2R
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 900	
				Kegelstuk : 1350	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 380	
				Bovenkant put : 170+	
				Laagste B.O.K. : 1900-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 2250	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 11/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2650	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0900	Putnr: K2V
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 1100	
				Kegelstuk : 1550	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 410	
				Bovenkant put : 140+	
				Laagste B.O.K. : 2330-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 2650	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			Ts.Klep KST 200 /1900- 180°	
Nee	BETON BV			OPM:	





Blad : 12/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2640	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr. V42
 Pvc250 /2300- h = 180 290° Pvc250 /2300- h = 180 135°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 1020	
				Kegelstuk : 820	
				Stroomprofiel : Ja	
Maaiveld : 550+					
Putrand+stellagen : 390					
Bovenkant put : 160+					
Laagste B.O.K. : 2300-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 2640					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 12/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2020	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr. R41
 Pvc315 /1700- h = 180 110° Pvc315 /1700- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 420	
				Stroomprofiel : Ja	
Maaiveld : 550+					
Putrand+stellagen : 410					
Bovenkant put : 140+					
Laagste B.O.K. : 1700-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 2020					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 12/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2580	Lev.dat : 25-06-1998	Putafm : 0800	Putnr. V43
 Pvc250 /2260- h = 180 110° Pvc250 /2260- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 980	
				Stroomprofiel : Ja	
Maaiveld : 550+					
Putrand+stellagen : 410					
Bovenkant put : 140+					
Laagste B.O.K. : 2260-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 2580					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 13/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1940	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R42
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 340	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen: 390	
				Bovenkant put : 160+	
				Laagste B.O.K. : 1600-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 1940	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 13/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2460	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V44
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 860	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen: 400	
				Bovenkant put : 150+	
				Laagste B.O.K. : 2130-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 2460	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 13/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1840	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R43
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 1020	
				Kegelstuk : 820	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen: 390	
				Bovenkant put : 160+	
				Laagste B.O.K. : 1500-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 1840	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 14/22	Putst.nr. : JP0622	H : 2320	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V45
Pvc250 /1830- h = 350 270°  Pvc250 /2000- h = 180 90° Pvc250 /2000- h = 180 180° <td colspan="2">ORDERNUMMER : 806.029.2</td>				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 1020	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 410	
				Bovenkant put : 140+	
				Laagste B.O.K. : 2000-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 2320	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 14/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1750	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0900	Putnr. R44
Pvc250 Midden/1400- h = 180 0°  Pvc250 Midden/980- h = 600 270° Pvc250 Midden/980- h = 600 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 1100 Kegelstuk : 650	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 380	
				Bovenkant put : 170+	
				Laagste B.O.K. : 1400-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 1750	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 14/22		Putst.nr. : JP0622		H : 2150		Lev.dat : 09-07-1998		Putafm : 0900		Putnr : V46	
Pvc250 Midden/1800- h = 180 0°  Pvc250 Midden/1070- h = 910 270° Pvc250 Midden/1070- h = 910 90° ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1500 Kegelstuk : 650 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 380 Bovenkant put : 170+ Laagste B.O.K. : 1800- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 2150 WAP. Nee WACO-LIESBOSCH BETON BV OPM:											





Blad : 15/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R45
 Pvc250 /910- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 380 Bovenkant put : 170+ Laagste B.O.K. : 910- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				


Blad : 15/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V47
 Pvc250 /950- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 420 Bovenkant put : 130+ Laagste B.O.K. : 950- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				


Blad : 15/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R46
 Pvc250 /850- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				





Blad : 16/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V48
 Pvc250 /850- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 400	
Bovenkant put : 150+					
Laagste B.O.K. : 850-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1180					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 16/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R48
 Pvc250 /910- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 460	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 380	
Bovenkant put : 170+					
Laagste B.O.K. : 910-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1260					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 16/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1300	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V50
 Pvc250 /960- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 390	
Bovenkant put : 160+					
Laagste B.O.K. : 960-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1300					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

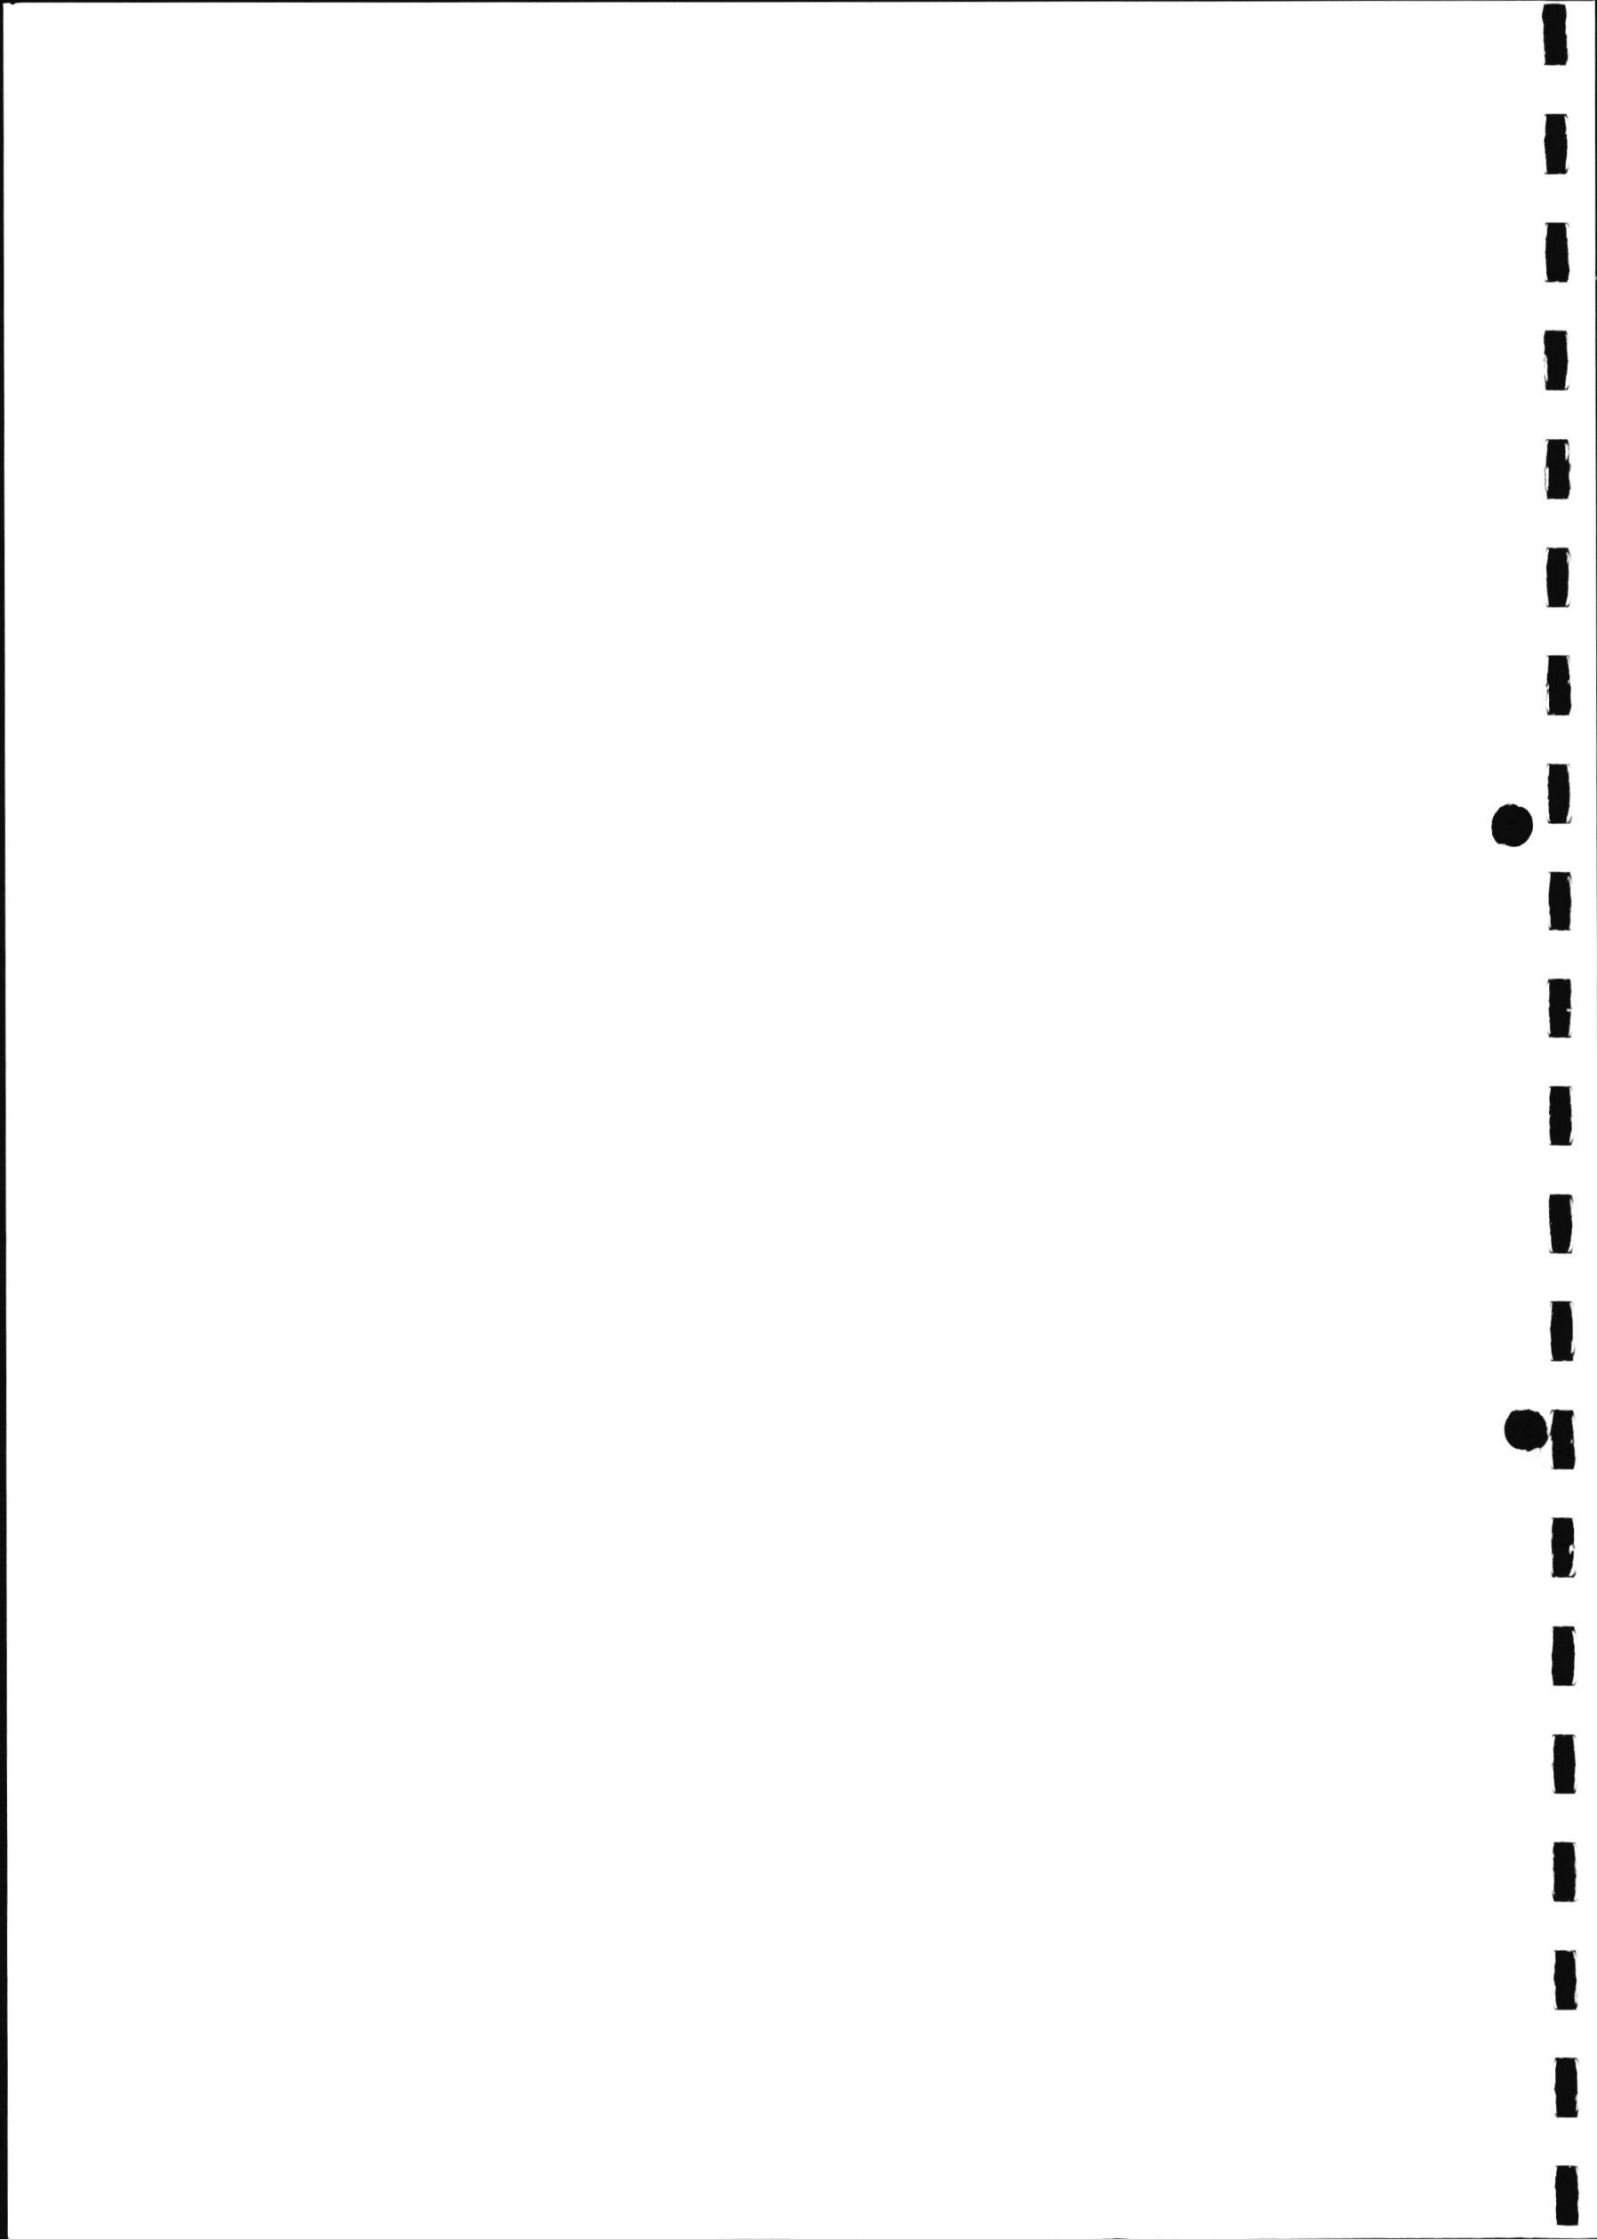



Blad : 17/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R47
 Pvc250 /850- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				


Blad : 17/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 09-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V49
 Pvc250 /850- h = 180 90°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				

Blad : 17/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1420	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R49
 Pvc250 /1090- h = 180 90° Pvc250 /1090- h = 180 270°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 620	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1090- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1420	
				OPM:	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV				





Blad : 18/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1980	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V51
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Opzetstuk 1 : 800	
				Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
Maaiveld : 550+					
Putrand+stellagen : 400					
Bovenkant put : 150+					
Laagste B.O.K. : 1650-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1980					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 18/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1300	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R50
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Kegelstuk : 500	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
Putrand+stellagen : 410					
Bovenkant put : 140+					
Laagste B.O.K. : 980-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1300					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 18/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1820	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V52
				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Kegelstuk : 1020	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
Putrand+stellagen : 390					
Bovenkant put : 160+					
Laagste B.O.K. : 1480-					
h (+ bodem 120) : 180					
Tot. hoogte put : 1820					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				




Blad : 19/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1300	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R51
Pvc250 /970- h = 180 315°  Pvc250 /970- h = 180 225° Pvc250 /970- h = 180 135°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 500 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 970- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1300	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				


Blad : 19/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1800	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0900	Putnr: V53
Pvc250 Midden/990- h = 660 315°  Pvc250 Midden/1470- h = 180 225° Pvc250 Midden/1470- h = 180 135°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 1300 Kegelstuk : 500 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 1470- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1800	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 19/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R52
Pvc250 /950- h = 180 45°  Pvc250 /950- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 460 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 420 Bovenkant put : 130+ Laagste B.O.K. : 950- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				





Blad : 20/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1780	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V54
 Pvc250 /1430- h = 180 45° Pvc250 /1430- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 980	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 380 Bovenkant put : 170+ Laagste B.O.K. : 1430- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1780	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	


Blad : 20/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R53
 Pvc250 /850- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	

Blad : 20/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1620	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V55
 Pvc250 /1270- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800 Kegelstuk : 820	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 380 Bovenkant put : 170+ Laagste B.O.K. : 1270- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1620	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV			OPM:	




Blad : 21/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1260	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R54
Pvc250 /940- h = 180 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 460 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 410 Bovenkant put : 140+ Laagste B.O.K. : 940- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1260	
					
Pvc250 /940- h = 180 135°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 21/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1340	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V56
Pvc250 /970- h = 200 0°				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 540 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 380 Bovenkant put : 170+ Laagste B.O.K. : 990- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1340	
					
Pvc250 /990- h = 180 135°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				

Blad : 21/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: R55
				ORDERNUMMER : 806.029.2 Onderbak : 800 Kegelstuk : 380 Stroomprofiel : Ja Maaiveld : 550+ Putrand+stellagen : 400 Bovenkant put : 150+ Laagste B.O.K. : 850- h (+ bodem 120) : 180 Tot. hoogte put : 1180	
					
Pvc250 /850- h = 180 180°					
WAP.	WACO-LIESBOSCH			OPM:	
Nee	BETON BV				



Blad : 22/22	Putst.nr. : JP0622	H : 1180	Lev.dat : 02-07-1998	Putafm : 0800	Putnr: V57
 Pvc250 /850- h = 180 180°				ORDERNUMMER : 806.029.2	
				Onderbak : 800	
				Kegelstuk : 380	
				Stroomprofiel : Ja	
				Maaiveld : 550+	
				Putrand+stellagen : 400	
				Bovenkant put : 150+	
				Laagste B.O.K. : 850-	
				h (+ bodem 120) : 180	
				Tot. hoogte put : 1180	
WAP. Nee	WACO-LIESBOSCH BETON BV		OPM:		





Mous Pompenbouw b.v. Balk

Gegevensblad afvoerpomp

Pomp

Fabrikaat : ABS
Type : AS 0840
Toerental : 2900 o.p.m.
Kogeldoorlaat : 30 mm.
Debiet : 10 m³/h
Totale opvoerhoogte : 17 mwk
Rendement : 25 %
Benodigd vermogen : 1,9 kW
Perslaansluiting : 50 mm.
Gewicht : 40 kg.
Aansluittype : 1-kanaal

Elektromotor

Fabrikaat : ABS
Type : M26/2 D
Vermogen vollast : 2,6 kW
Motorspanning : 400 V
Toerental : 2900 o.p.m.
Vollaststroom : 5,6 A
Max.aanloopstroom : 16 A
Rendement vollast : 75,6 %
Cos phi vollast : 0,88
Uitvoering IP : 68
Isolatieklasse : F
Aanloopmethode : ster-driehoek

Water in olie beveiliging : nee
Thermische beveiliging : nee
Koelmantel : nee


Materialen

Pomphuis : GG 25
Waaier : GG 25
Pompas : st. 1.4021

Bijlagen

Maatschetsen nr. : -
Grafiek nr. : -



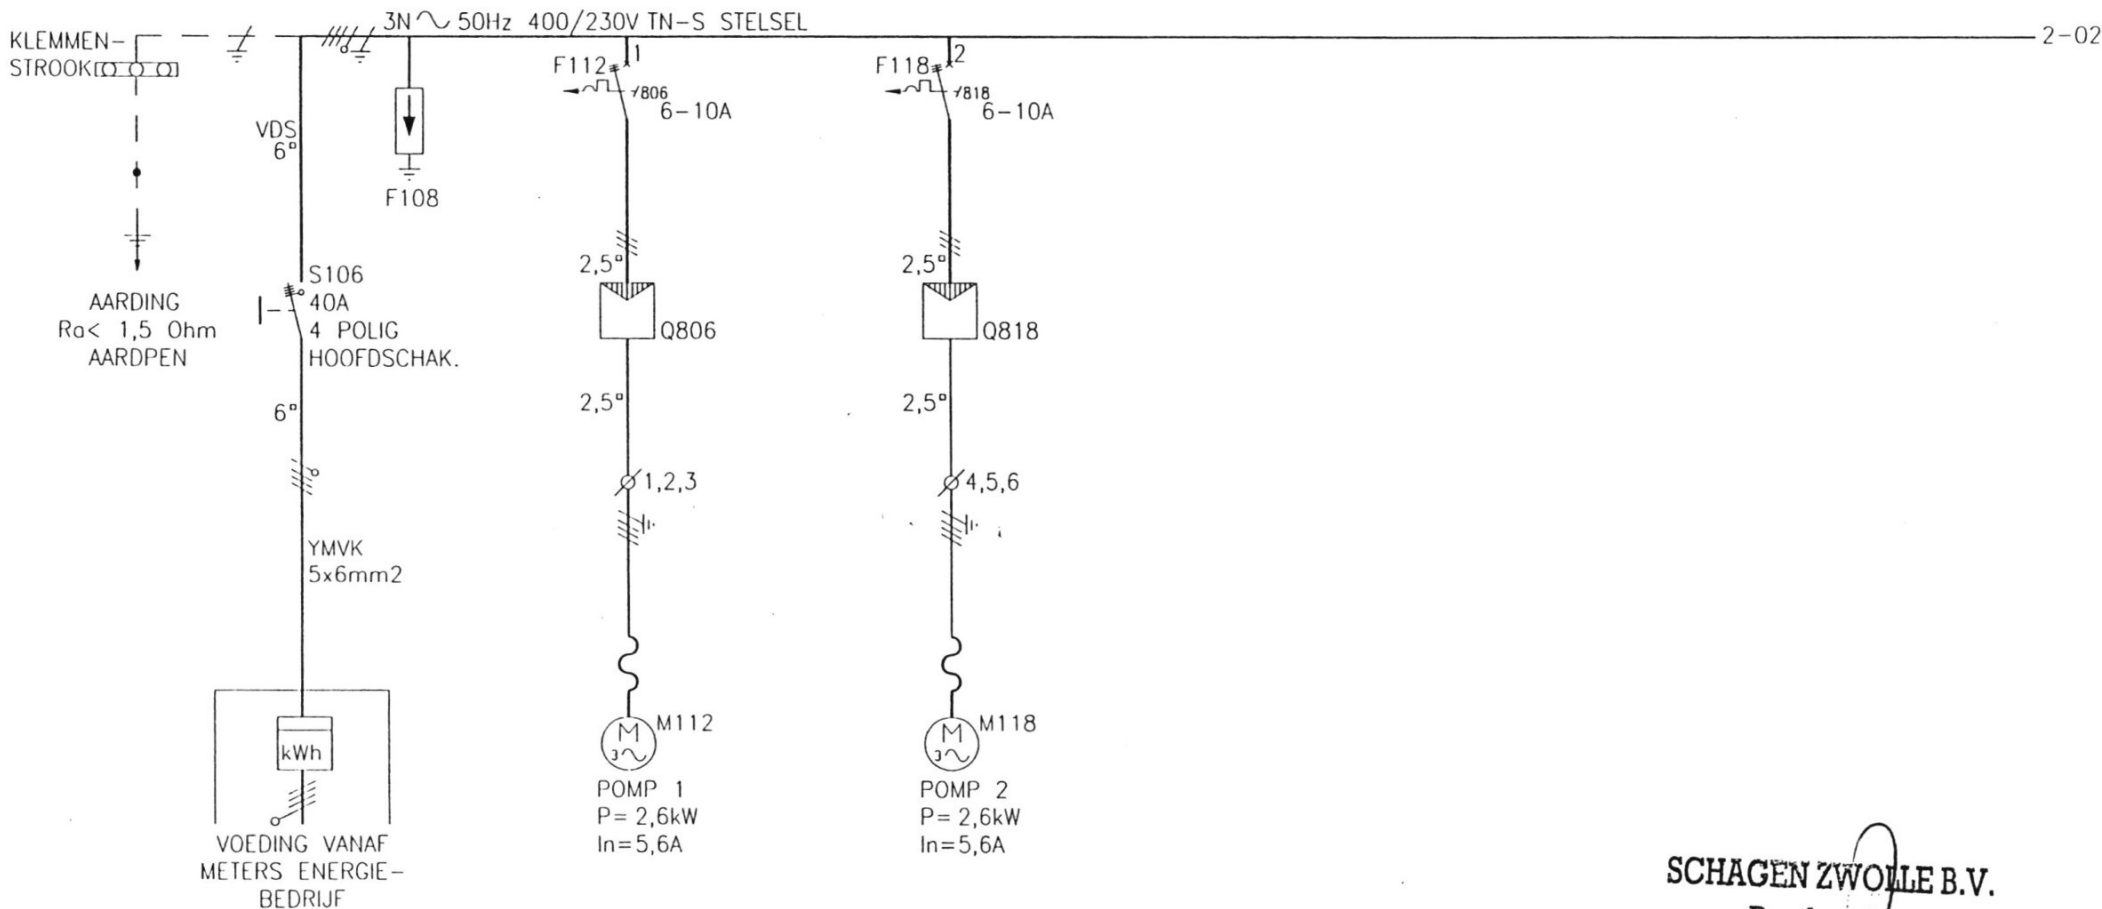

TOTAAL OPGESTELD VERMOGEN; 4 kVA
 GELIJKTIJDIG AFGENOMEN VERMOGEN; 4 kVA

ADRES; B'PLAN BARSBEKERBINNENPOLDER
 ZWARTSLUIS

SCHAGEN ZWOLLE B.V.
 Postbus 619
 8000 AP ZWOLLE

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998	Edition D
Edition B:	Edition E:
Edition C:	Rev :
Drawing No. P-980328	Sheet: 1
Edition	

MOUS POMPENBOUW B.V.

Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*

Design: P. SWART

Date: 28-05-1998


HOOFDSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
 RG BARSBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS

All rights reserved



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

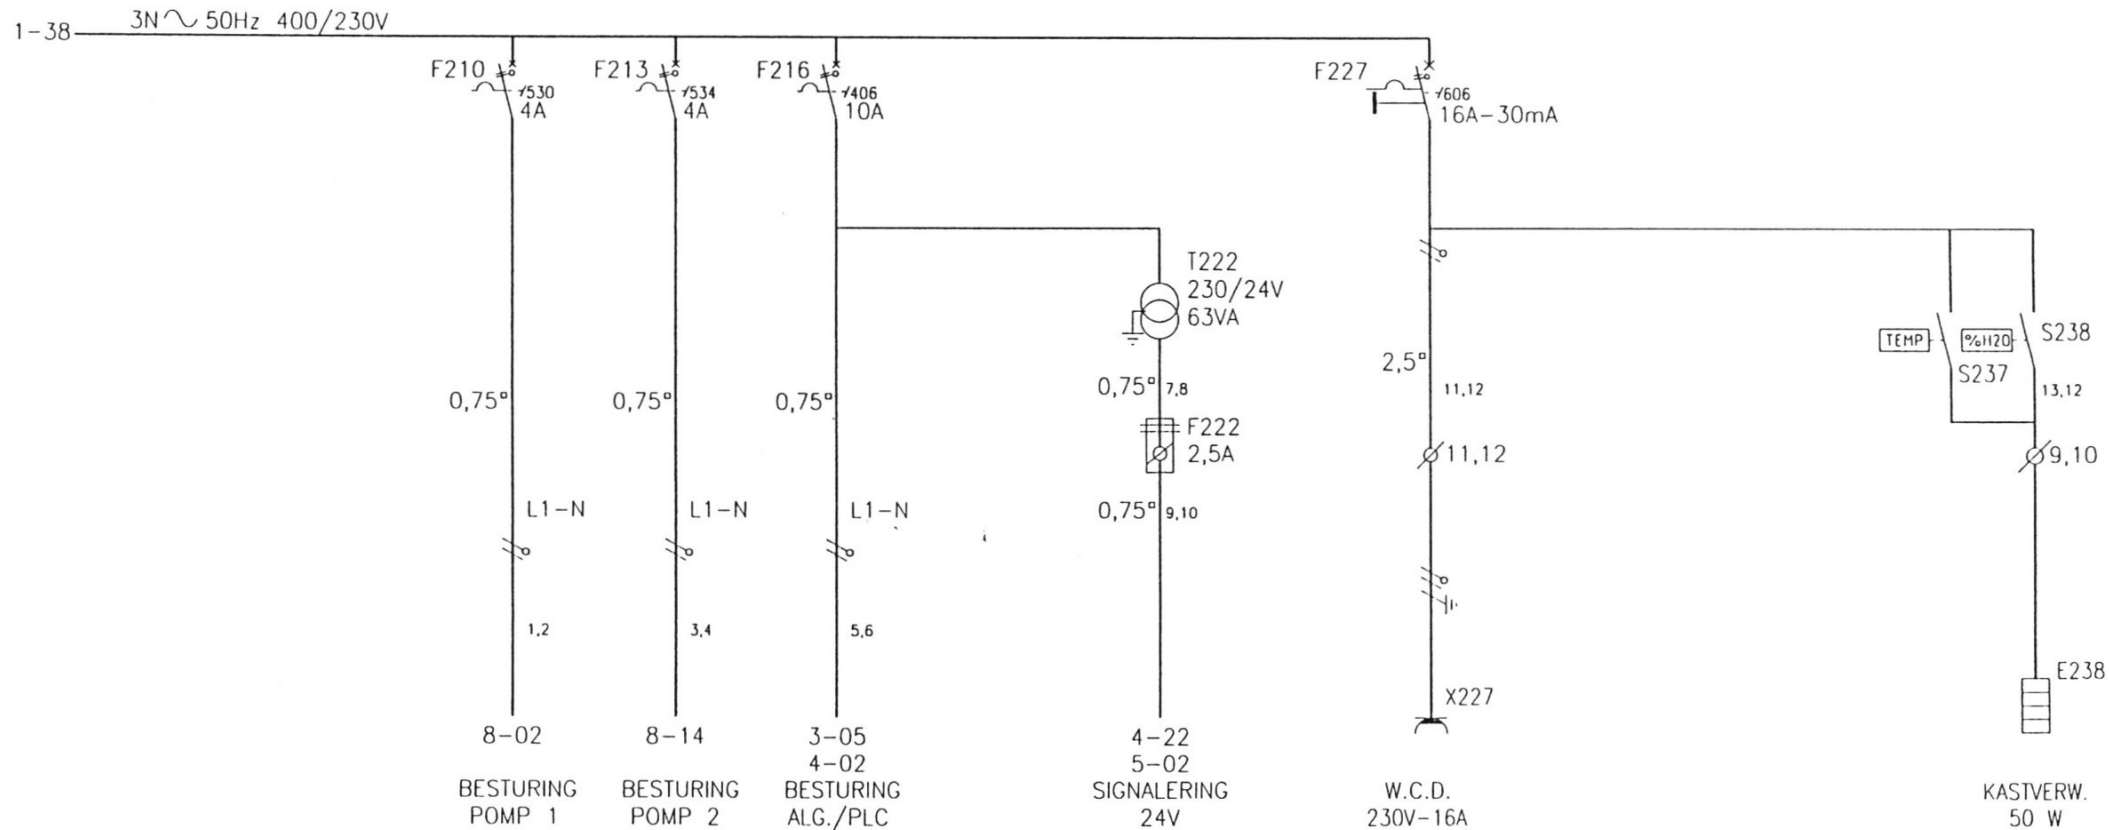

Datum van wijziging

Edition A. 03-07-1998

Edition D.

Edition B.

Edition E.

Edition C.

Rev

Drawing No.

P-980328

Sheet

2

Edition. All rights reserved

MOUS POMPENBOUW B.V.

Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*

Design: P. SWART


Date: 28-05-1998

HOOFDSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSBEBERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

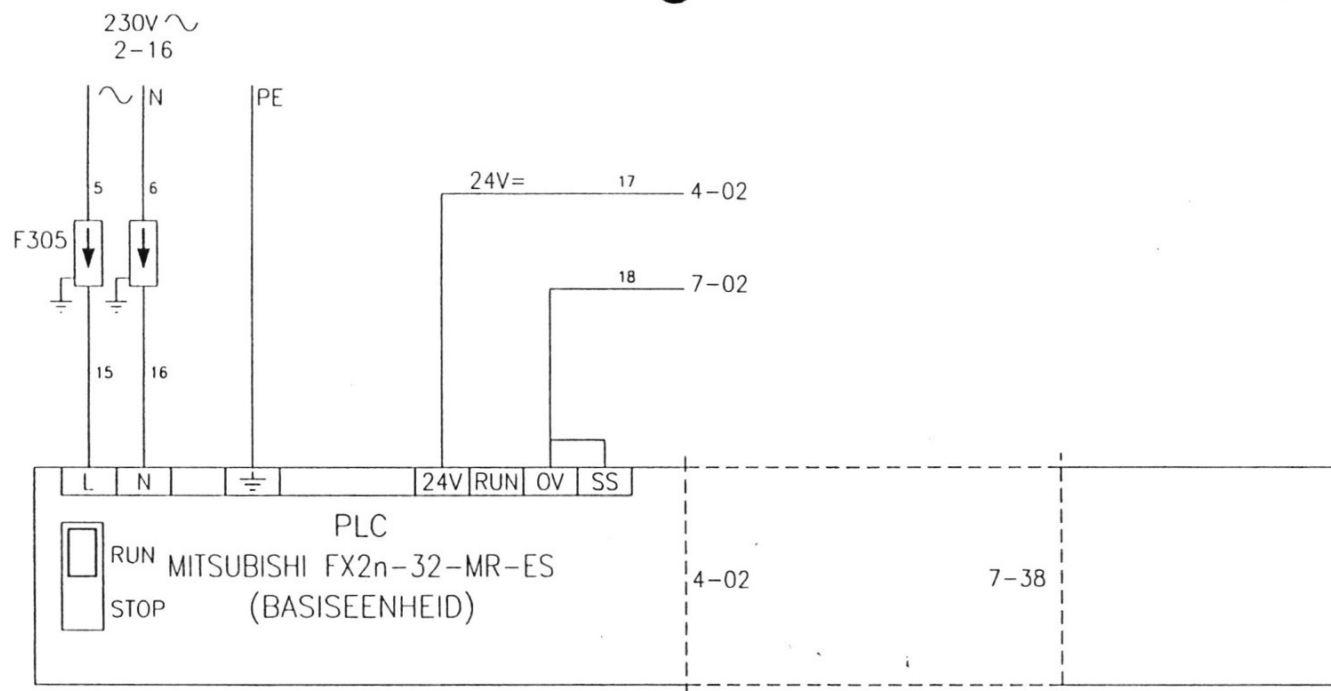

NIVEAU PEILEN:	
HOOGWATER	-0.50 NAP
INSCHAKELPEIL 2	NVT
INSCHAKELPEIL 1	-2.41 NAP
UITSCHAKELPEIL	-2.70 NAP
LAAGWATER	-2.80 NAP
BODEM	-3.00 NAP
DATUM	03-07-1998

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998

Edition D:

Edition B:

Edition E:

Edition C:

Rev :

Drawing No:

P-980328

Sheet:

3

MOUS POMPENBOUW B.V.

Design: P. SWART

Date: 28-05-1998

all p. 7-98


STUURSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS

All rights reserved


Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*



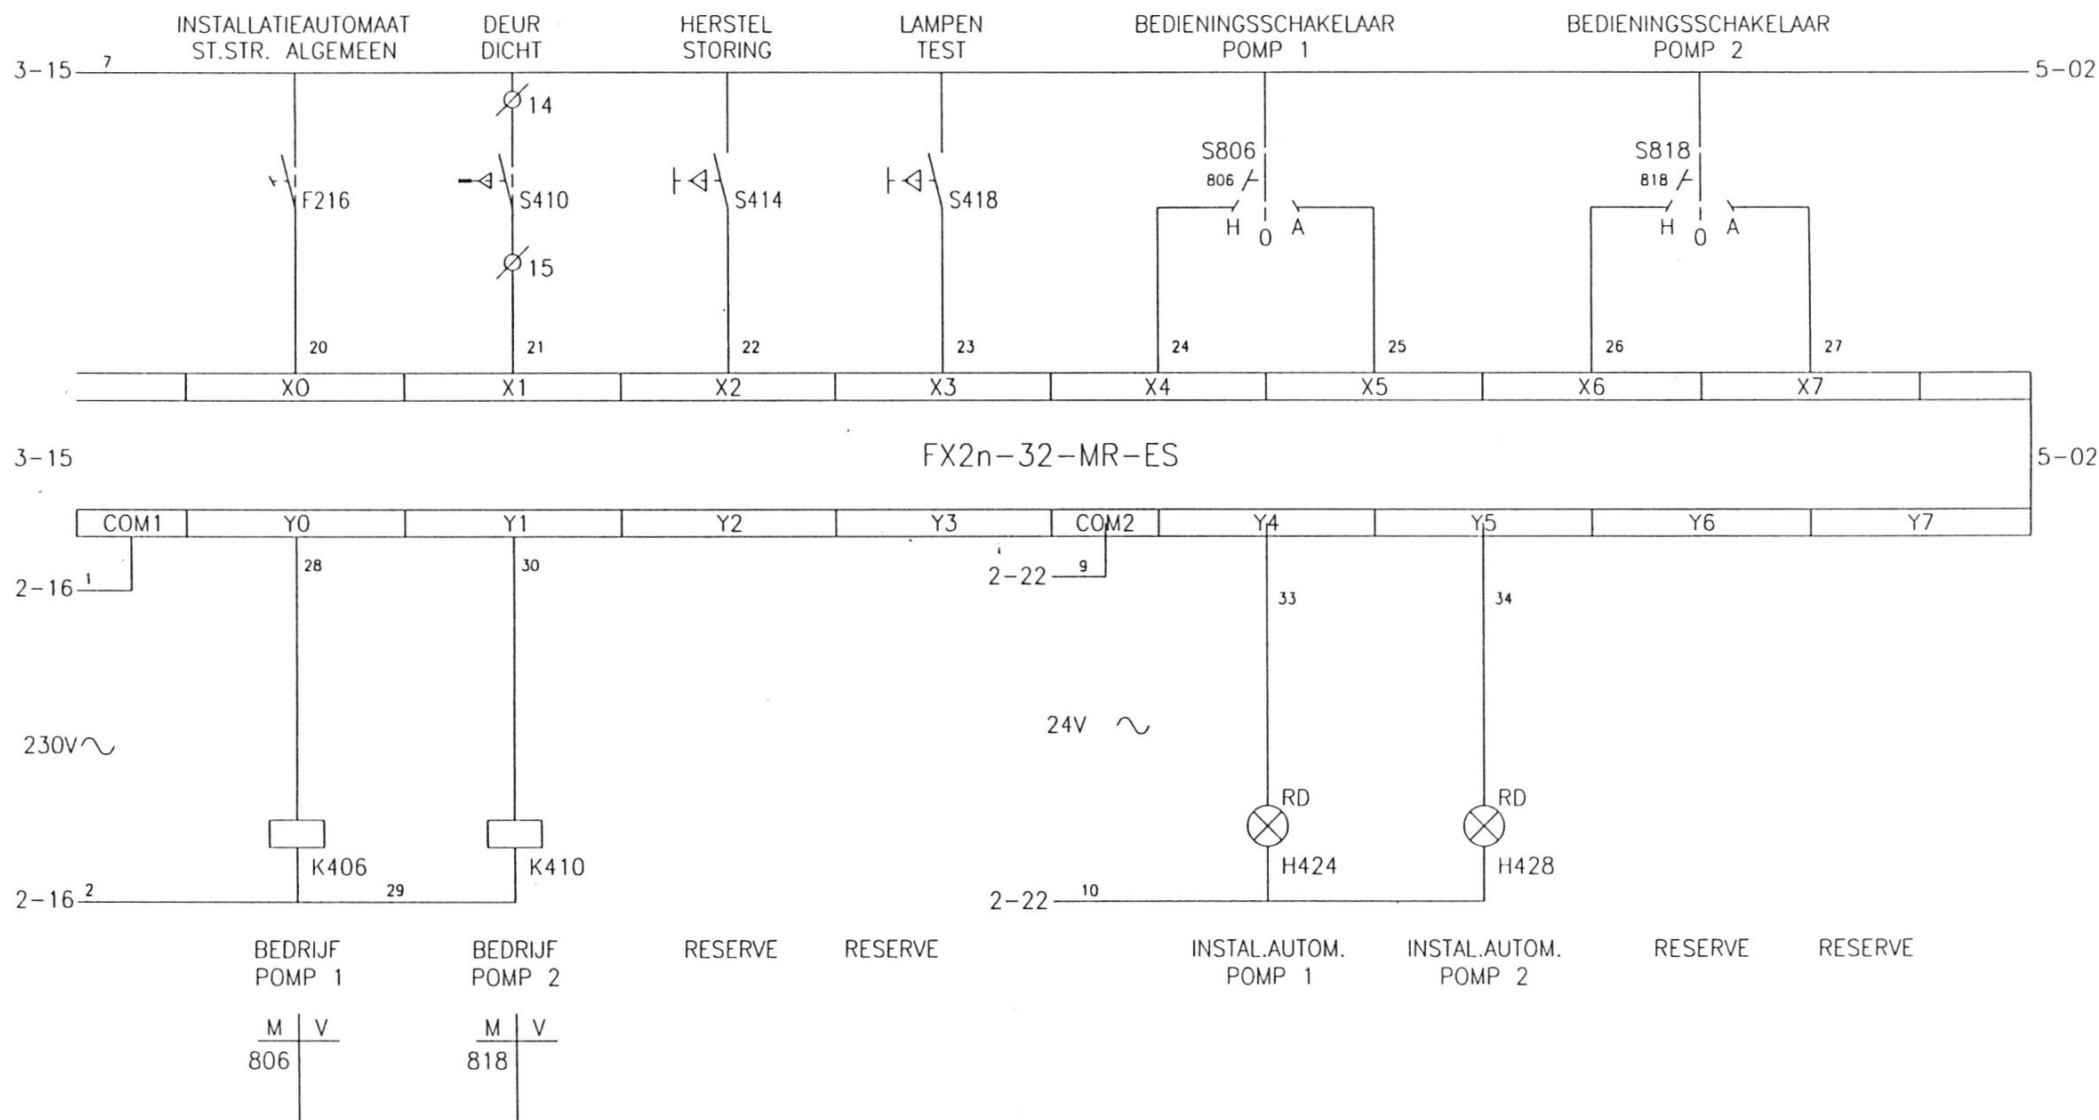



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

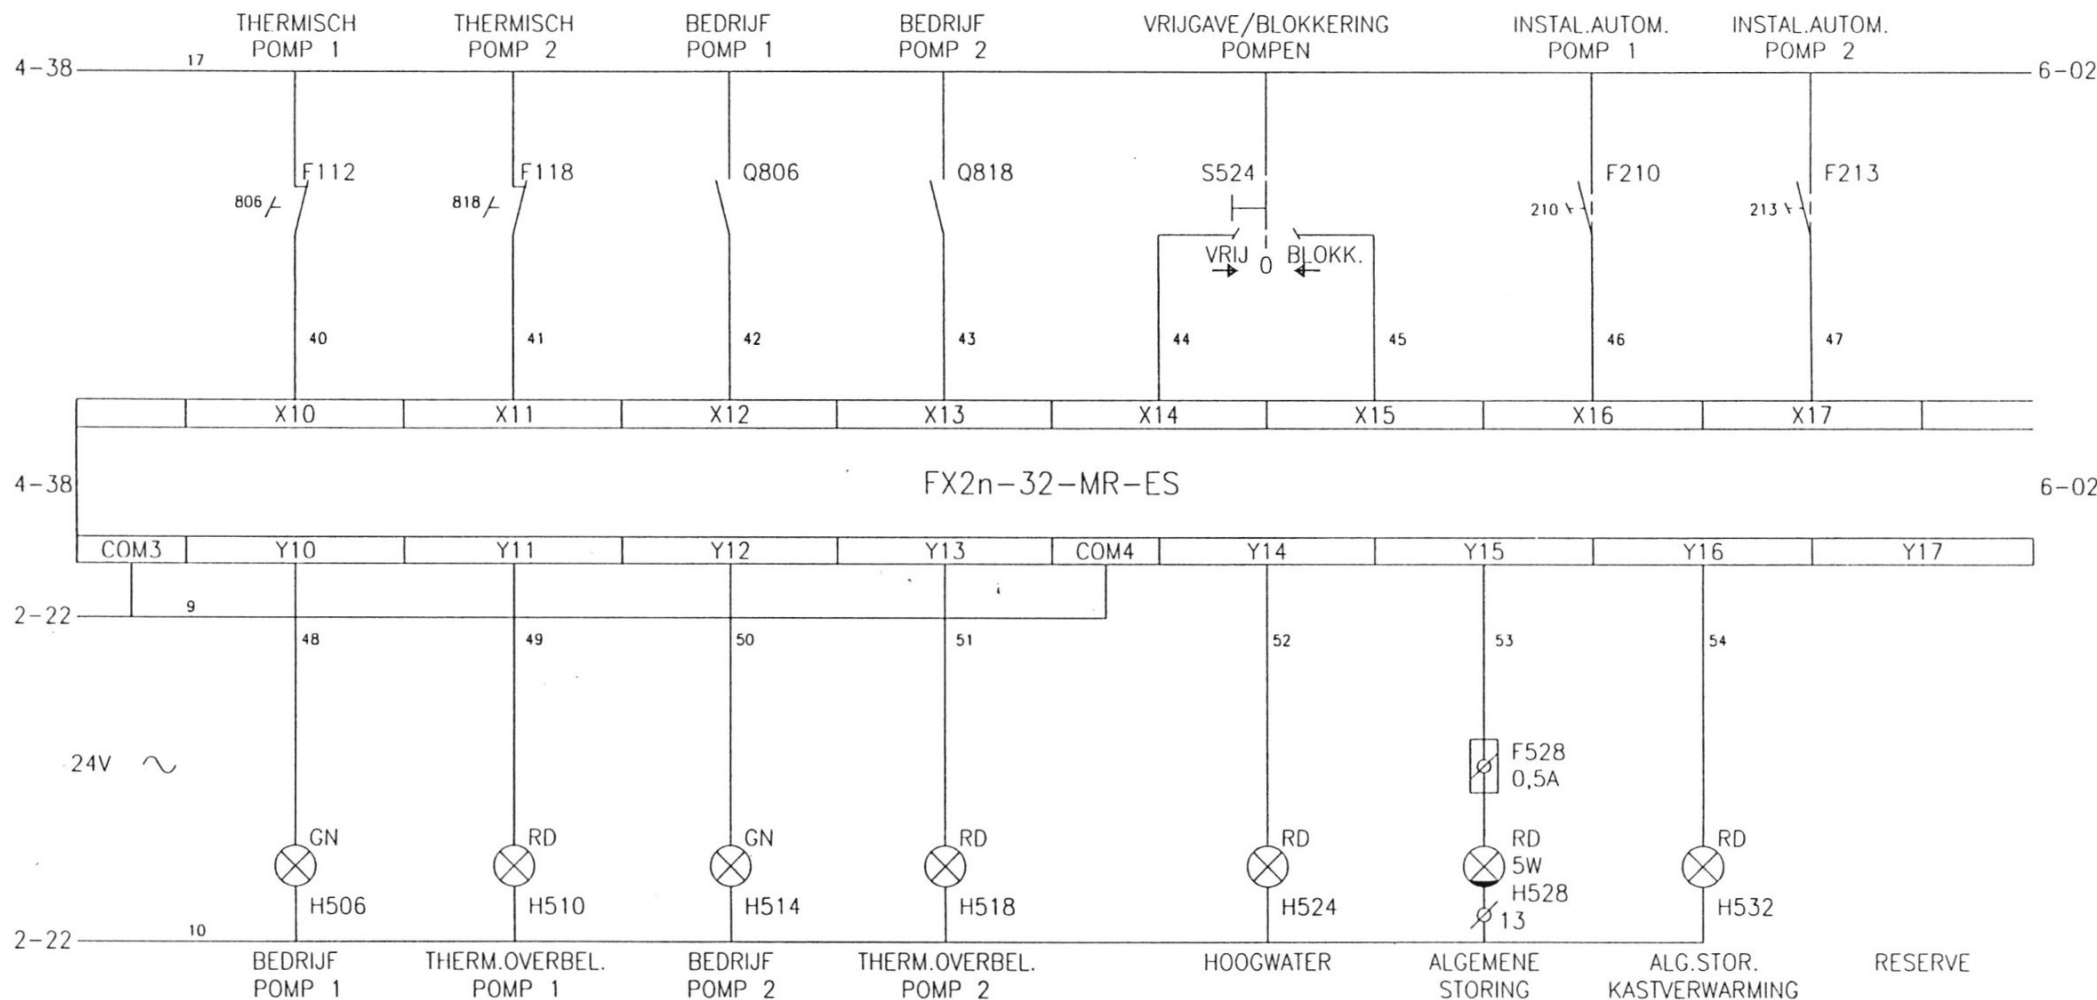

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998	Edition D
Edition B:	Edition E:
Edition C:	Rev :
Drawing No: P-980328	Sheet: 5
Edition:	

All rights reserved

MOUS POMPENBOUW B.V.
Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*

Design: P. SWART Date: 28-05-1998 *alt. P. J. J. J.*
STUURSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

INSTAL.AUTOM.
KASTVERW.
17

5-38	KASTVERW.	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
17							
5-38							7-02

F227

227 v. 71

60

5-38 FX2n-16EX-ES/UL 7-02

FX2n-16EX-ES/UL

[illegible]

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998	Edition D:
-----------------------	------------

Edition B:	Edition E:
------------	------------

Edition C:	Rev	:
------------	-----	---

Drawing No:	Sheet
-------------	-------

P-9803286

					Edition:
--	--	--	--	--	----------

All rights reserved

MOUS POMPEBOW B.V.

Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*

SWART	Date: 28-05-1998	all
-------	------------------	-----

STUURSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS


Drawing No:	P-980328	Sheet	6
-------------	----------	-------	---

					Edition:
--	--	--	--	--	----------

All rights reserved





01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

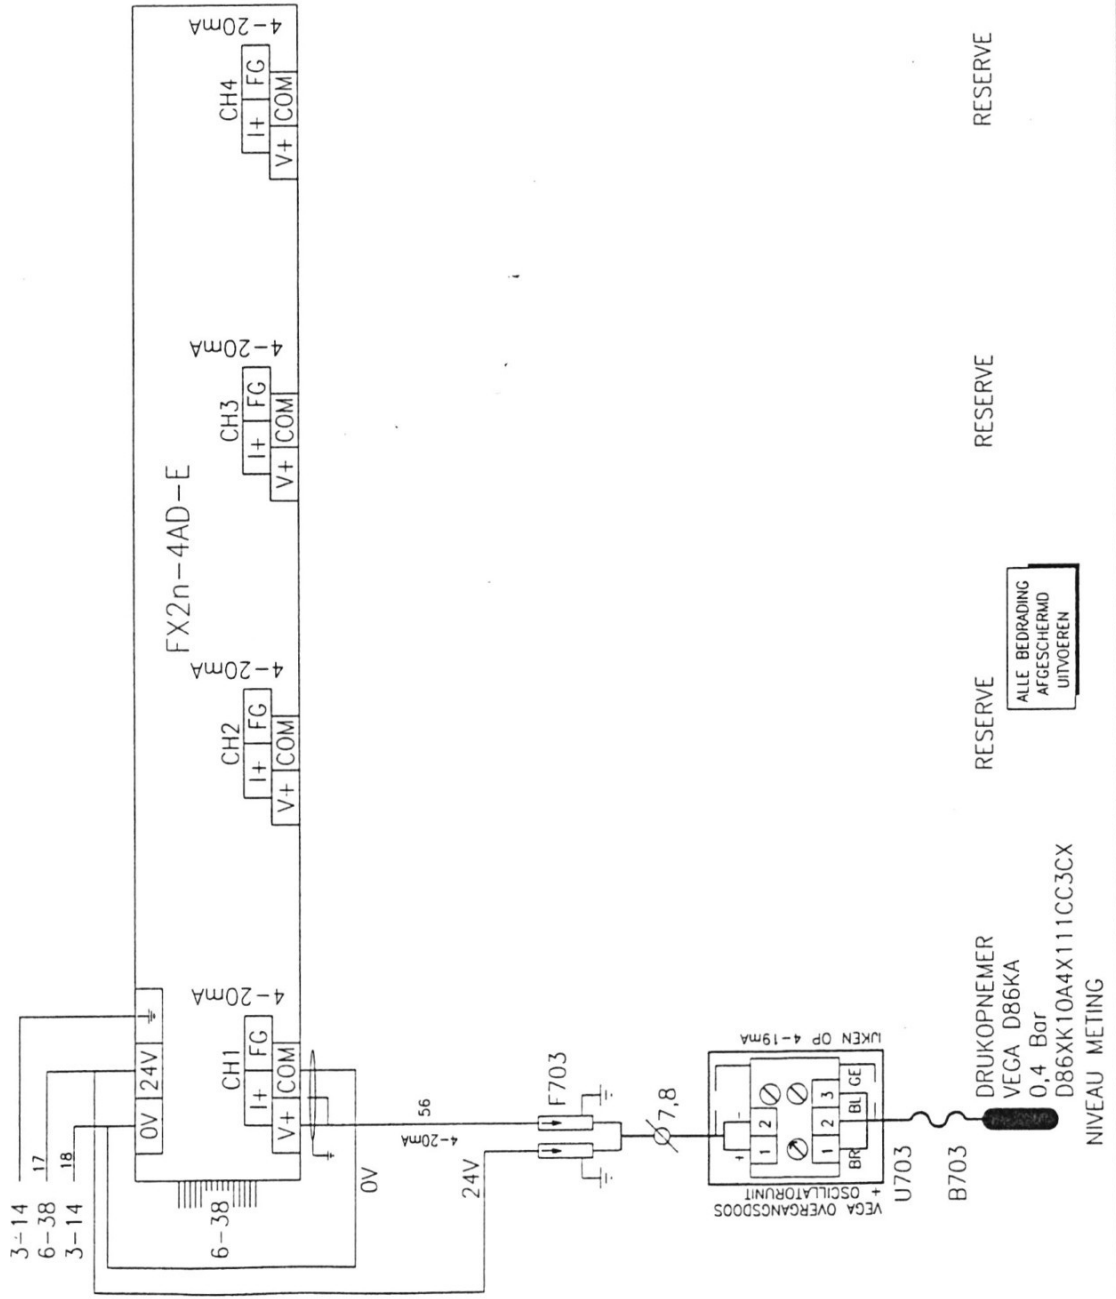

Datum van wijziging		Edition A: 03-07-1998		Edition D:	
Edition B:		Edition C:		Edition E:	
Drawing No:		P-980328		Sheet: 7	
Edition:		Rev:			
MOUS POMPENBOUW B.V.					
Tj. de Boerstraat 14 Balk tel: 0514-603943*					
NIVEAU METING PLC ANALIN					
SCHAGEN ZWOLLE					
RG BARBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS					



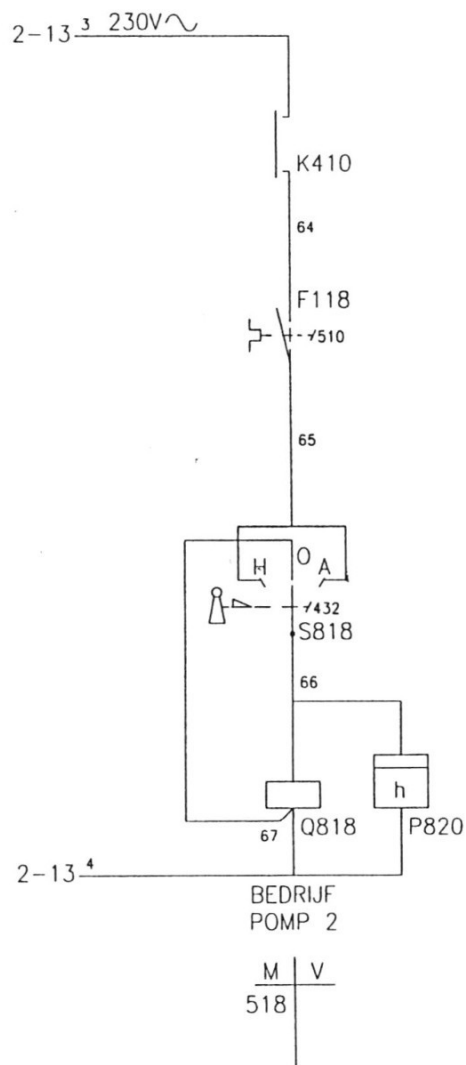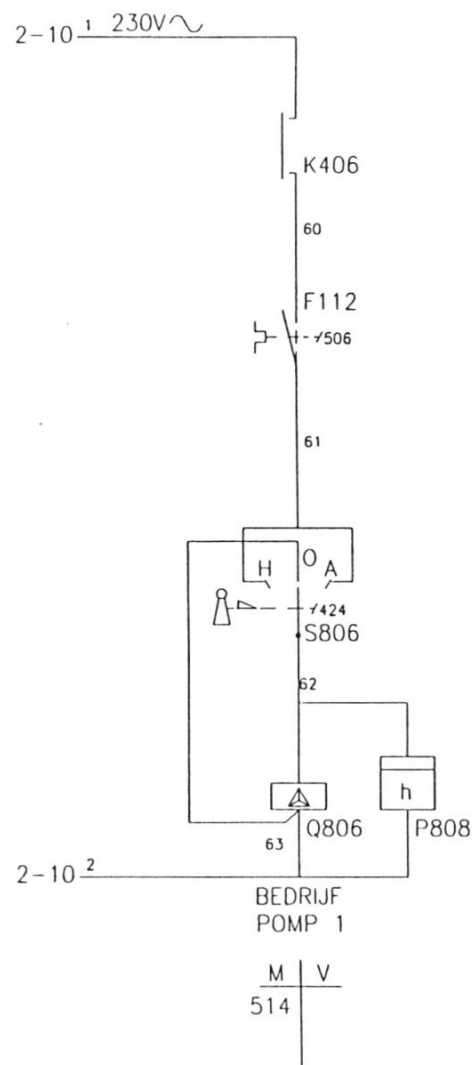

Datum van wijziging	
Edition A: 03-07-1998	Edition D:
Edition B:	Edition E:
Edition C:	Rev:
Drawing No:	Sheet:
P-980328	8
Edition:	

All rights reserved

MOUS POMPENBOUW B.V.
Tj. de Boerstraat 14 Balk tel: 0514-603943*

Design: P. SWART Date: 28-05-1998

STUURSTROOMSCHEMA

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

VANAF METING
ENERGIELEV. BEDRIJF

YMKV 5x6 mm²
PG21

RECHTSTREEKS AAN-
SLUITEN OP S106

AARDING

COP.P.W. 1/2"

25mm²

6mm²
6mm²

KOPPELEN AAN
METALEN KAST

POMP 1
M118

H05RRF4G1,5mm²

PG21 SPECI

POMP 2
M112

H05RRF4G1,5mm²

PG21 SPECI

NIVEAU METING
B703-U703

AANGEG. KABEL

VEGA O.K.

CYflex 3x0,75mm²

PG13,5

PG11

160x120

VERWARMING
E238

EDRATEEN 3x1,5mm²

PG11

WCD 220V
X227

YMKV 3x2,5mm²

PG13,5

ALG.STOR.LAMP
H528

H05RR-F2G1,5


PG11

DEURCHAK.
S410

YMKV 2x1,5mm²

PG11

BOVEN IN KAST

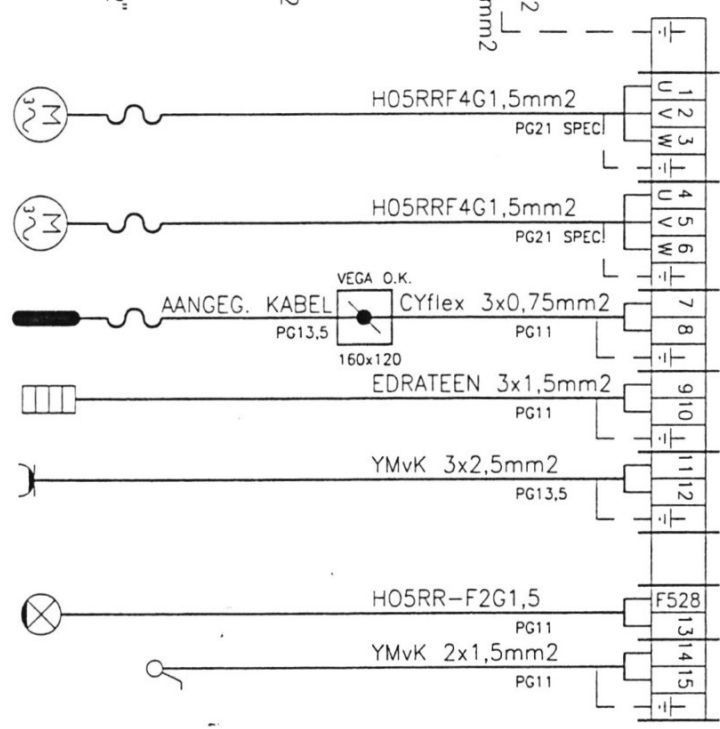

MOUS POMPENBOUW B.V.
tj. de Boerstraat 14 Bolk tel: 0514-603943*


Design: P. SWART Date: 28-05-1998
KLEMMENTEKENING

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSBEBERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS

Datum van wijziging	
Edition A: 03-07-1998	Edition D
Edition B	Edition E
Edition C	Rev :
Drawing No: P-980328	Sheet: 9

All rights reserved



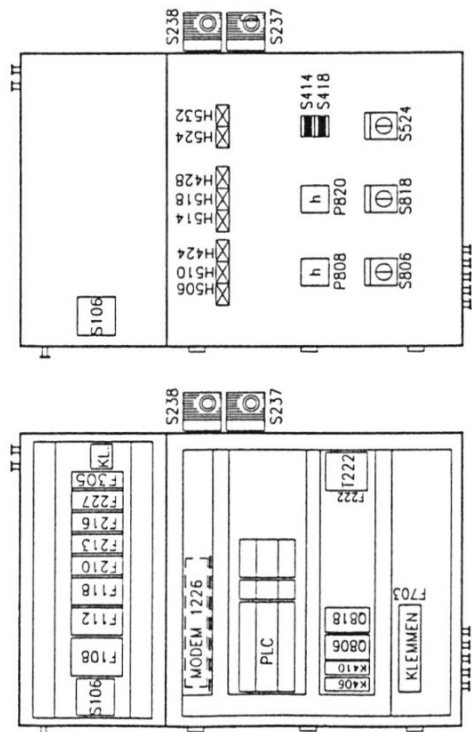

FABRIKAAT;
TYPE;
AFMETINGEN;
MATERIAAL;
SLOT;
KAST V.Z.V. STALEN TEKENINGHOUDER
EN PVC WARTELPLAAT

FABRIKAAT	HES
TYPE	E5427+E5454H
MATERIAAL	KUNSTSTOF
KLEUR	GRIJS/TRANSPARANT
AFMETINGEN	810x540x205mm (HxBxD)

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS

Date: 28-05-1998

MOUS POMPENBOUW B.V.
Tl. de Boersstraat 14 Balk tel: 0514-603943*


All rights reserved



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ALGEMENE
STORINGSLAMP

H528

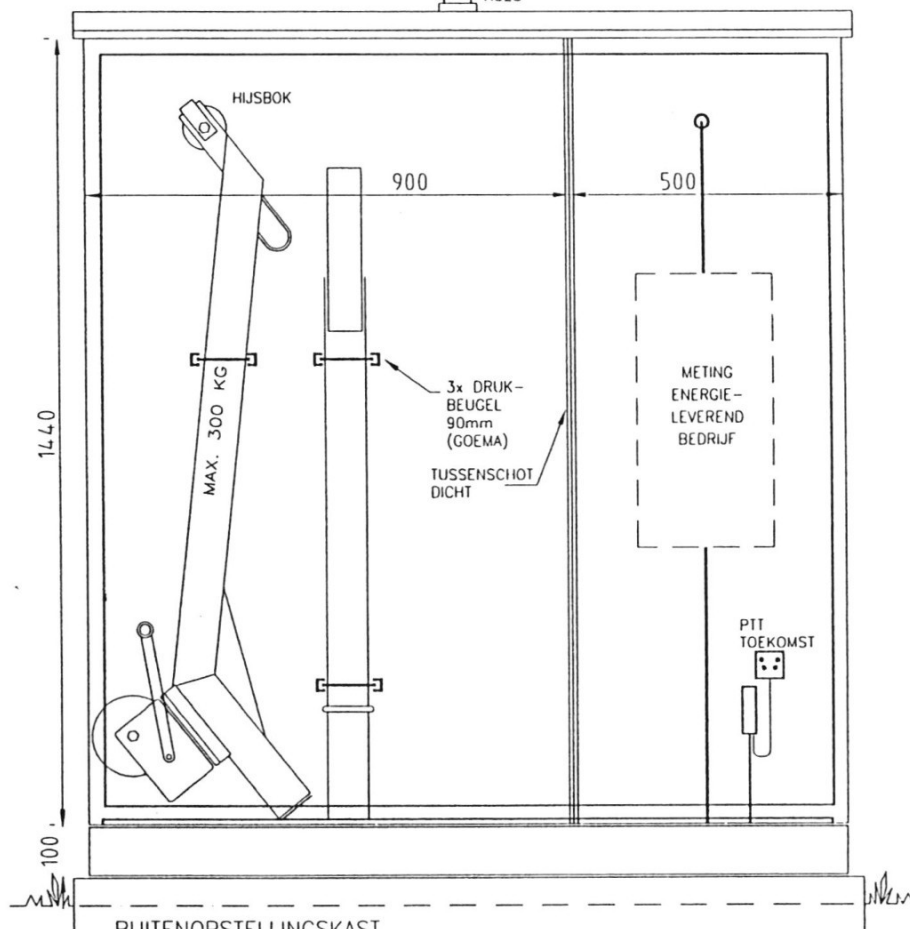

BUI TENOPSTELLINGSKAST

FABRIKAAT; MOUS
TYPE; SPECIAAL DONKERGROEN RAL6005
AFMETINGEN; 1440x1400x650 (HxBxD)
MATERIAAL; RVS 2mm
SLOT; ABUS & EGD CIL.
KAST V.Z.V. STALEN TEKENINGHOUDER
EN PVC WARTELPLAAT

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998

Edition D

Edition B:

Edition E:

Edition C:

Rev :

Drawing No:

P-980328

Sheet:

11

Edition:

All rights reserved

MOUS POMPENBOUW B.V.

Tj. de Boerstraat 14 Bolk tel; 0514-603943*

Design: P. SWART

Date: 28-05-1998

KASTINDELING ACHTERZIJDE

SCHAGEN ZWOLLE

RG BARSBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS






01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

VOORAANZICHT

ACHTERAANZICHT

ZIJAANZICHT

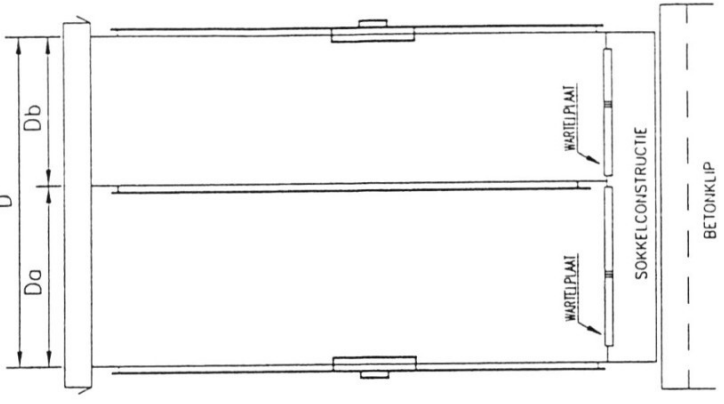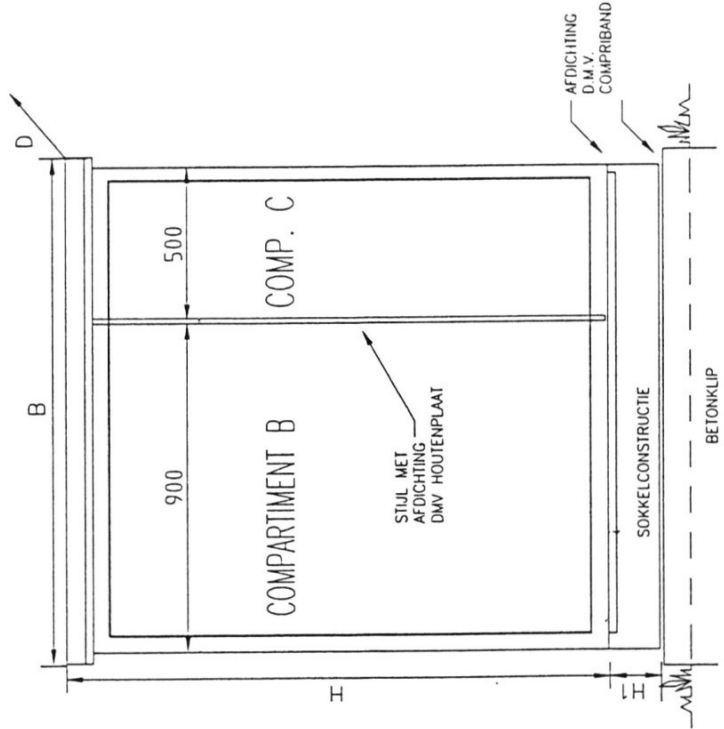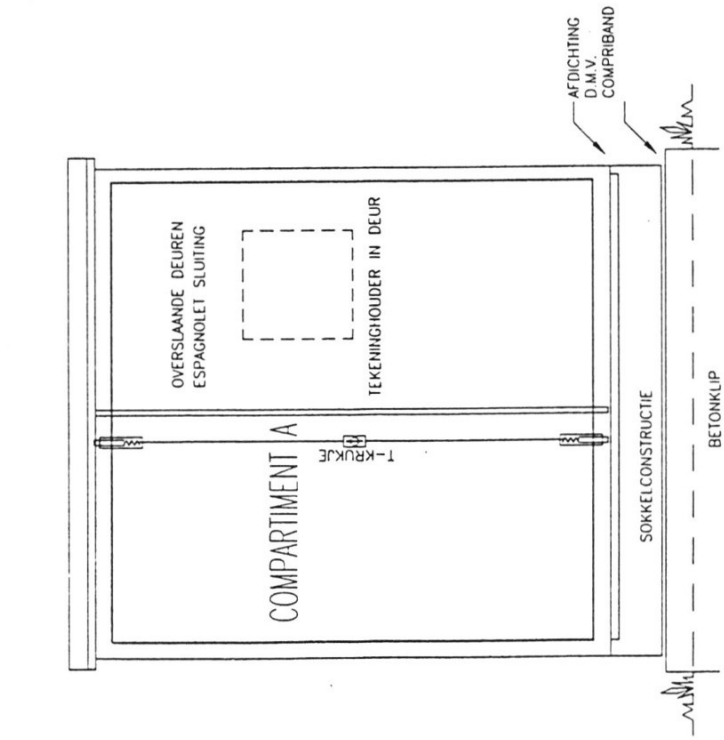


BUITENOPSTELLINGSKAST

FABRIKAAT: MOUS
TYPE: SPECIAAL
AFMETINGEN: 1440x1400x650 (HxBxD)
COMPARTIMENTEN: 3
PLINTKONSTRUCTIE: U-PROFIEL 100mm HOOG
MATERIAAL: RVS 304 2mm
SLOT COMP. A: LIPS KESO 22mm
SLOT COMP. B: LIPS KESO 22mm
1e OPENGAANDE DEUR: COMP A = DEUR 2
DEUR VERGRENDING: NVT
UITZETHOUDERS: ELKE DEUR
DAK: AFLOPEND-2Gr+VENTILATIE
LAKBEHANDELING: IN/UITWENDIG GESPOTEN RAL 6005
LAKBEHANDELING: AFLAK POLYURETHAAN LAK
LAAGDIKTE: 70 MIRCON

SLEUTELKASTJE
MONTAGEPLAAT
TEKENINGHOUDER:
GAT ALG.STOR.LAMP:
BEVEST.TL-ARMATUUR:
BEVEST.DEURSCHAK.:
VENTILATIE:
WARTELPLATEN:
DIVERSEN 1:
DIVERSEN 2:
DIVERSEN 3:

N.V.T.
WPB HECHTHOUT 15mm
VAN TOEPASSING
VAN TOEPASSING
VAN TOEPASSING
VAN TOEPASSING
DAK REGENINSLAG DICT
VAN TOEPASSING
COMPARTIMENT C V.Z.V. SLOT YC
COMP B & C GESCHIEDEN UITVOEREN
DEUR 3 V.Z.V. EXTRA VERSTEVIGING

BOVENAANZICHT

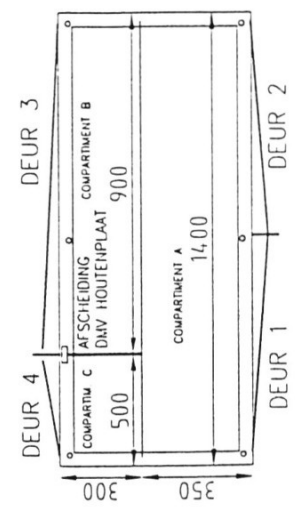

MOUS POMPENBOUW B.V.
Tj. de Boerststraat 14 Balk tel: 0514-603943*

Design: P. SWART Date: 28-05-1998
CONSTRUCTIE BOK

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS

Drawing No: P-980328
Edition: 12
Sheet: 12



AANRAKINGS VEILIGHEID

☐	DOORZICHTIGE PLAAT
☒	GRIJZE PLAAT
☐	STICKER MET PIJL
☐	AFSCHERM. F.O.
☐	AFSCHERM. SOFTSTARTER
☐	
☐	
☐	

AFSTAND GOOT

☒	D.Z. KAST VOLGENS TEKENING
☐	PL.ST. KAST VOLGENS TEKENING
☐	D.Z. KAST mm
☐	PL.ST. KAST mm
☐	KUNSTSTOFKAST VOLG. TEK.
☐	
☐	
☐	

DIVERSEN

☒	OVERGANGSKAST(EN)
☐	REGENKAPJE(S)
☐	BESCHERMING KAP BUITEN
☐	
☐	
☐	KATHODISCHE BESCHERMING
☐	BLIKSEMBEV. LEV DERDEN

AARDING

☐	AARDRAIL TYPE WOHNER
☐	AARDRAIL TYPE PHOENIX
☐	PEN RAIL
☐	AARDING RINGLEIDING
☐	DIEPTE AARDING MOUS
☒	DIEPTE AARDING SPECIAAL
☒	DIEPTE AARDING LEV. DERDEN
☐	KATHODISCHE BESCHERM.

BEDRADING

☐	SEPARAAT LICHT/KRACHT
☐	AFSCHERMING 4-20mA/0-10V
☐	VOED. VANAF KL.STR.SEPARAAT
☐	
☐	
☒	BEDRADING ST.STR.+SIGN. 0,75
☐	BEDRADING ST.STR.+SIGN. 1,0
☐	BEDRADING ST.STR.+SIGN. 1,5

RESOPAL PLAAT

☐	INGANGEN
☐	UITGANGEN
☒	DATA REGISTERS
☐	IN POMPPUT
☐	IN POMPENKELDER
☐	
☐	

ADER HULSJES

☐	DRAADBUSJES PHOENIX of T.M.
☐	KLEMKO
☒	AMP
☐	SCOTCH 3M
☐	
☐	
☐	

CODERING

☒	RESOPAL + SPREIDNIETJES
☐	P-TOUCH
☒	FRONT RESOPAL + SPREIDN.
☐	LENZEN/DRIKKNOP GRAVEREN
☒	CODERING OP DRAADGOOT
☐	CODERING OP COMPONENT
☒	COMPONENTEN B.O.K. RESOPAL

WARTELS

☒	STANDAARD DIN 46320
☐	HSK-K TYPE VAST LOPER
☐	HSK-K TYPE DICHTRING
☐	TROMPET
☐	TROMPET + TREKONTLASTING
☐	
☐	

ADER KODERING

☒	DRAADNUMMERS
☐	COMPONENTENNUMMER
☐	KABELADERS
☐	KABEL
☒	DRAADCODERING WEIDMULLER
☐	
☐	HOOFDSTROOM
☒	STUURSTROOM

DIVERSEN

☒	TREKONTLASTING RAIL
☐	RESERVE DRADEN NAAR DEUR
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

B.O.K.

☒	TL VERLICHTING
☒	DEURSCHAKELAAR
☐	VENTILATIE SPECIAAL
☐	ISOLATIE SPECIAAL
☐	AANSL. BLIKSEMBEV.
☐	
☒	STALEN TEKENINGHOUDER
☒	PVC WARTELPLAAT

KLEURCODE BEDRADING

HOOFDSTROOM		
FASEN	380V ~	ZWART
NUL	380V ~	BLAUW
LICHT		
FASE	220V ~	BRUIN
NUL	220V ~	BLAUW
SCHAKELDRAAD	220V ~	ZWART
STUURSTROOM		
FASE	220V ~	ZWART
NUL	220V ~	BLAUW
SCHAKELDRAAD	220V ~	ZWART
SIGNALERING/STUURSTROOM		
FASE	24V ~	ROOD
NUL	24V ~	ROOD
INGANGEN PLC		
PLUS	24V ~	VIOLET
MIN	24V ~	VIOLET
SIGNALERING/STUURSTROOM		
PLUS	24V ~	BLAUW
MIN	24V ~	BLAUW
MEETSIGNALLEN	DIVERSEN	GEEL
2 ADERS AFGESCH.		BLAUW 2x0,75
1 ADER AFGESCH.		GRUJ 1x0,75
0-20mA		TRANSPARANT
4-20mA		TRANSPARANT
0-10V		TRANSPARANT
STROOMTRAFO-AMP.METER		GRUJ
INTRINSIEK-VEILIG		LICHT-BL.
POTENTIAAL VRIJ		LICHT-BL.
VREEMDE SPANNING		ORANJE
KONTAKTEN ALARMELDERS		WIT
AARDE		GROEN/GEEL

EXPLOSIE VEILIG

☐	AANSLUITEN KLIKSON
☐	O.K. EXPLOSIE VEILIG
☐	W.S. EXPLOSIE VEILIG
☐	WARTELS EXPLOSIE VEILIG
☐	WIPPER EXPLOSIE VEILIG
☐	B.O.K. IN ZONE ..
☐	
☐	

Datum van wijziging

Edition A: 03-07-1998

Edition D

Edition B:

Edition E:

Edition C:

Rev :

Drawing No:

P-980328

Sheet

13

Edition

All rights reserved

MOUS POMPENBOUW B.V.

Tj. de Boerstraat 14 Balk tel; 0514-603943*

Design: P. SWART

Date: 28-05-1998

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

SCHAGEN ZWOLLE
RG BARSEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS





Mous Pompenbouw b.v. Balk Tel. 0514-603943* Fax. 0514-603820

Materiaallijst Electrisch

Opdrachtgever : Schagen Zwolle B.V.					
Omschrijving : RG Barsbekerbinnenpolder te Zwartsluis					
Project : 980328		Datum : 29-05-98		Blz. :	1
Tekenaar : [REDACTED]		Revisiedatum : 3-07-98		Revisienr : A	
Code	Srt.	Aantal	Fabrikaat	Omschrijving	B
		9,00			
	BI	1,00 Stuks		Wartel glasv.vst.polym. PG11 korte tap	
	BI	2,00 Stuks		Wartel glasv.vst.polym. PG13,5 korte tap	
	BI	1,00 Stuks		Wartel glasv.vst.polym. PG16 korte tap	
	BI	1,00 Stuks		Wartel glasv.vst.polym. PG21 korte tap	
	BI	2,00 Stuks		Wartel+uienring OBO PG21	
	BI	1,00 Stuks		Wartelmoer PG11	
	BI	2,00 Stuks		Wartelmoer PG13,5	
	BI	1,00 Stuks		Wartelmoer PG16	
	BI	3,00 Stuks		Wartelmoer PG21	
F112 F118	BI	2,00 Stuks	ABB	Motorbev. schak. M25-TM 6 -10A 1m+1v	J
F210 F213 F216	BI	4,00 Stuks	ABB	Hulpcontactblok S2...H11 1m+1v	
F227					
F210 F213	BI	2,00 Stuks	ABB	Automaat S271 K4NA 1P+N	J
F216	BI	1,00 Stuks	ABB	Automaat S271 K10NA 1P+N	J
F227	BI	1,00 Stuks	ABB	Multi-stotz DS 651 B16 30mA	
Q806 Q818	BI	2,00 Stuks	ABB	Magn.schak B9-30-10 220V 4kW	J
S806 S818	BI	2,00 Stuks	Abus	ABUS hangslot No 85/20 GL HK0196	J
				<u>gelijksluitend</u>	
DIV	BI	8,00 Stuks	EAO	Signaalarmatuur direkt 02-021.001	J
S414 S418	BI	2,00 Stuks	EAO	Druknop 1WC onverl 02-611.011	J
S106	BI	1,00 Stuks	EGA	Inspektievenster norm. klapdeksel 4M	J
T222	BI	1,00 Stuks	ETI	ETI CT126NN 230/24V 63VA	J
P808 P820	BI	2,00 Stuks	Faget	Urenteller UIS48 5 cijferig 230Vac 50Hz	J
	BI	1,00 Stuks	HES	Kast + transp. deksel 540x270x170	J
	BI	1,00 Stuks	HES	Kast + transp. deksel 540x540x205	J
	BI	1,00 Stuks	HES	Pertinax montagepl. 540x270	J
	BI	1,00 Stuks	HES	Pertinax montagepl. 540x540	J
S106	BI	1,00 Stuks	Holec	Lastscheider Dumeco DMM 40/4 40Amp 4polig 32570	J
S806 S818	BI	2,00 Stuks	Kraus & Naimer	Schakelaar CG8-NLN139-622-E-SO-V840A/A21	
				vergrendeling in 0 en A stand onderschrift H-0-A	
SS524	BI	1,00 Stuks	Kraus & Naimer	Bovenschrift Pomp 1 of Pomp 2	J
	BI	1,00 Stuks	Mitsubishi	Schakelaar CG8-A214-621-E-SO-F990/A1B-PR	J
PLC	BI	1,00 Stuks	Mitsubishi	FX2N-4AD-E analoge ingangsmod.	
PLC	BI	1,00 Stuks	Mitsubishi	FX2N-16EX-ES/UL uitbr.ing. 16/0	J
DIV	BI	10,00 Stuks	Olten	FX2N-32MR-ES basis relais 16/16	J
DIV	BI	2,00 Stuks	Olten	Frontraam vlak zwart 02-965.0	J
DIV	BI	6,00 Stuks	Olten	Groene lens translucet met relief 02-901.5	J
DIV	BI	8,00 Stuks	Olten	Rode lens translucet met relief 02-901.2	J
DIV	BI	2,00 Stuks	Olten	SignaallampT6,8 02-061.001	J
DIV	BI	2,00 Stuks	Olten	Zwarte lens translucet met relief 02-901.0	J
	BI	15,00 Stuks	Phoenix	Aansluitklem UK5-N	J
	BI	6,00 Stuks	Phoenix	Aardklem USLKG4	J
F108	BI	4,00 Stuks	Phoenix	Basiselement VAL-MS230BE	J
F108	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Doorverb.brug MPB18/1-4	J
F108	BI	4,00 Stuks	Phoenix	Steker VAL-MS230ST	J
F222	BI	2,00 Stuks	Phoenix	Zekeringklem UK-SI 3118012	J
F305	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Basiselement UAK2-PE/S-230AC-BE/L6	J
F305	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Steker UAK2-PE/S-X-230AC-ST	J
F528	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Zekeringklem UK-SI 3118012	J
F703	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Basiselement UFBK 2/2-24DC-BE	
F703	BI	1,00 Stuks	Phoenix	Stekmoduul UFBK 2/2-24DC-ST	
	BI	2,00 Set	Power Controls	Dekselscharnier 1set	J
K406 K410	BI	2,00 Stuks	Releco	Hulpelais C7-A20/230VAC, 2 w.c., standaard	
K406 K410	BI	2,00 Stuks	Releco	Relaisvoet S7-MP 8-pol.	
F222	BI	2,00 Stuks	Weber	Glaszekering traag 20x5mm 2,5A	
F528	BI	1,00 Stuks	Weber	Glaszekering traag 20x5mm 0,5A	
	BU	3,00 Kilo		Aarddraad 25mm E-Cu57 zacht vertind	
	BU	0,11 Kilo		Aarddraad 6mm E-Cu57 zacht vertind	

alt. p 6-7-98






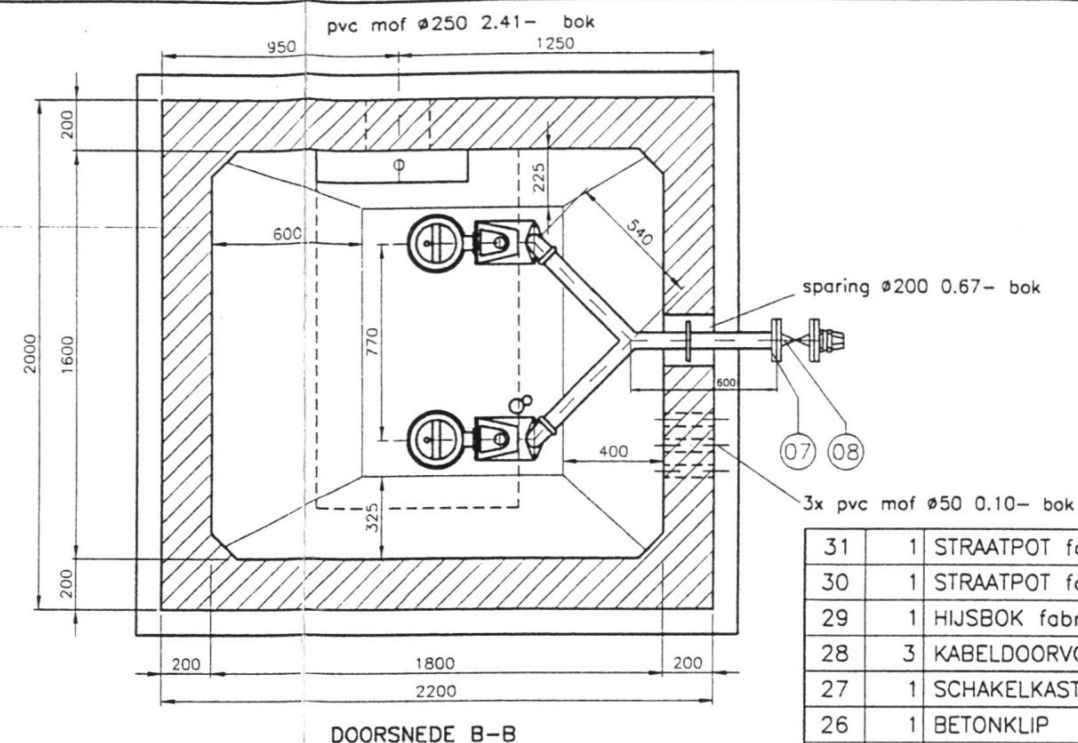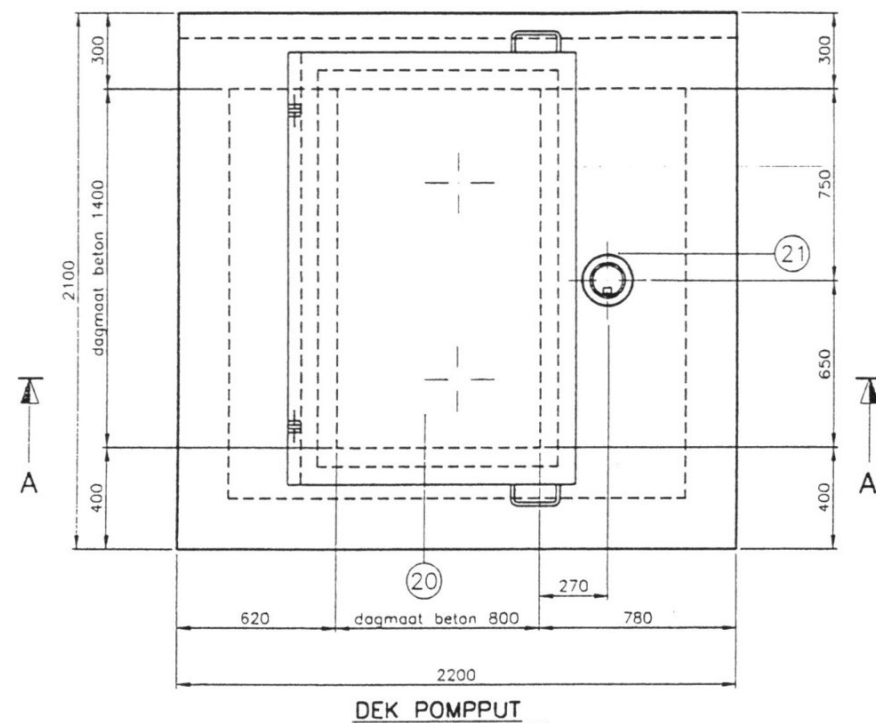

OPM: - Conservering gij.ond.: 3-verlagen epoxy systeem op twee componenten basis.
- Pomp wordt voorzien van een chloor-rubber coating.


SCHAGEN ZWOLLE BV
Exemplaar Bedrijfsbureau


31	1	STRAATPOT fabr.GF		gij	type 14162
30	1	STRAATPOT fabr.MOUS		gij	in betontegel gestort
29	1	HIJSBOK fabr.MOUS	HB01	thver	2-delig
28	3	KABELDOORVOERBUIS		hpe	ø50 L=5000
27	1	SCHAKELKAST fabr.MOUS		rvs304	1440x1400x650(hxbxd)
26	1	BETONKLIP		beton	1400x650x450(1xbxh)
25	1	BESCHERMBUIS+ BEUGELS		pvc	ø110 L=3000
24	1	DRUKOPNEMER fabr.VEGA		div	type D86 KA
23	4	CLICKER		thver	M10x85
22	1	RIOOLSPINDELSCHUIF fabr.TBS		hpe	ø250 type PRA-G
21	1	DRAAIBUS fabr.MOUS		gij	
20	1	AFDEKLUIK fabr.MOUS+doorvalbev. Zs843011		al	1490x890 stankdicht
19	2	OPHANGHAAK		rvs304	
18	2	HIJSKETTING		rvs316	ø6 L=4100
17	2	GELEIDEBUIS		rvs304	1" L=2970
16	1	STOP		rvs304	2"
15	1	BLINDFLENS vv 2" draadgat		rvs304	NW65/2"
14	1	VLAKKE LASFLENS		rvs304	NW65
13	1	T-STUK tbv foampig		rvs304	2" / 2 1/2" L=500/950
12	2	KOPPELING fabr.PLASSON		pp	2" x ø63 PVC
11	1	KOPPELING fabr.PLASSON		pp	NW50x ø63 PVC
10	1	T-SLEUTEL		st	
09	1	VERLENGSPINDEL+ SCHUTBUIS		st	L=800
08	1	SCHUIFAFSLUITER fabr.MAW	z.vr.br	gij	NW50 type HD/KB
07	1	DRAADFLENS		rvs304	2" x NW50
06	2	KNIE		rvs316	2" bi bu
05	2	DRIEDELIGE KOPPELING		rvs304	2" bi bi
04	2	LEIDING		rvs304	2"
03	2	VOETSTUK fabr.ABS		gij	2" met ingebouwde bkk
02	2	DOMPELPOMP fabr.ABS		div	type AS 0840 M26/2D
01	1	POMPPUT		beton	1800x1600x3600
stuk nr.	aan-tal	benaming	tek.nr	mat.	omschrijving

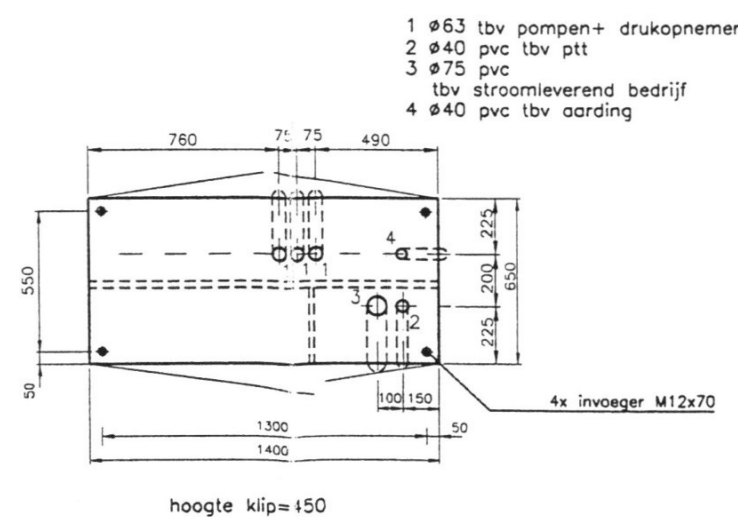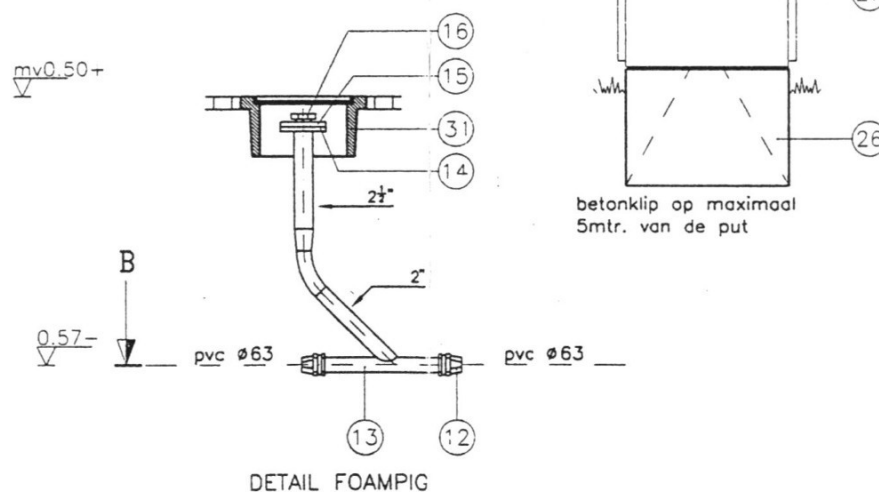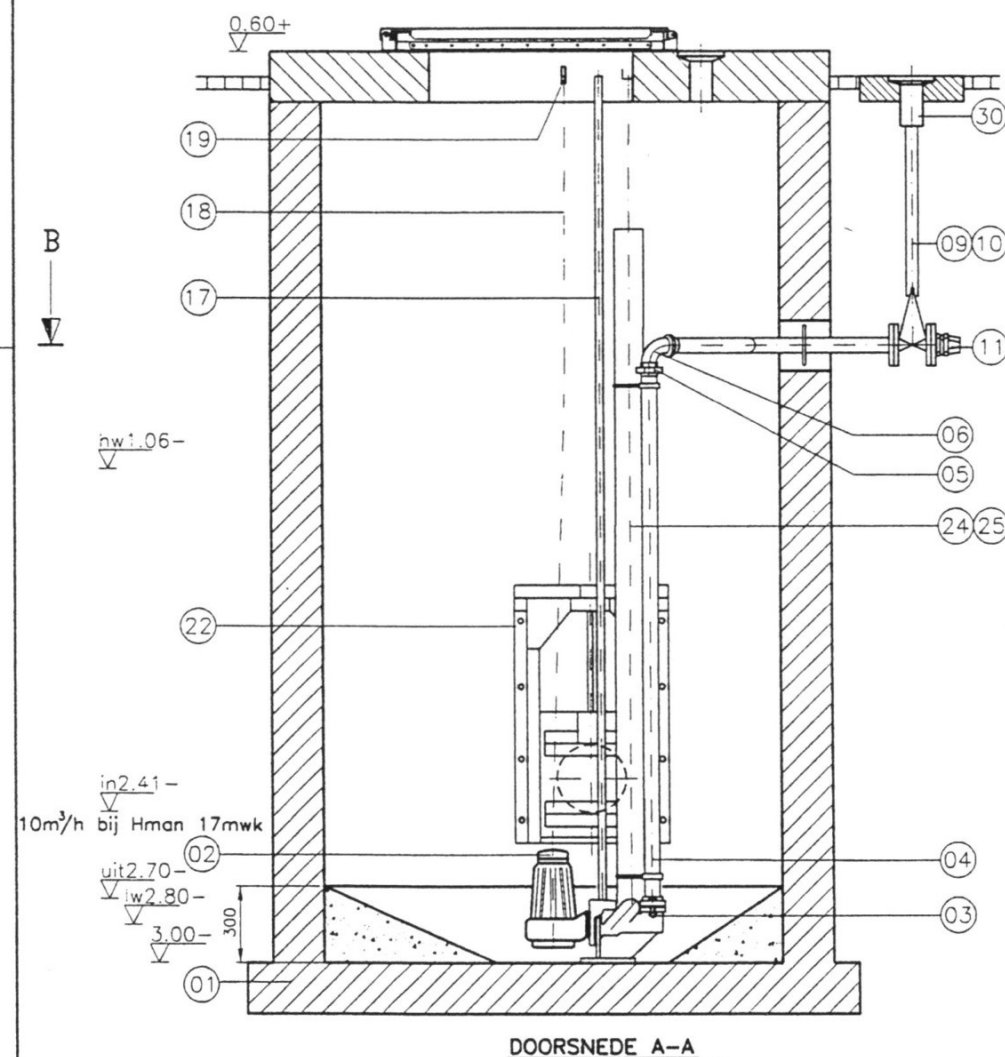


DIRECTIE
OPDRACHTGEVER SCHAGEN ZWOLLE
PROJECT RG BARSBEKERBINNENPOLDER ZWARTSLUIS
sparings- en opstellingstekening

REV.	D.D.	D.D.	D.D.	D.D.	gewijzigd	26/06/98
						datum: 08-04-98 schaal: 1 : 20 (bij A2) maten in m.m. projekt nr.: 980328 getekend: RH gez.: © copyright M: blad: 1

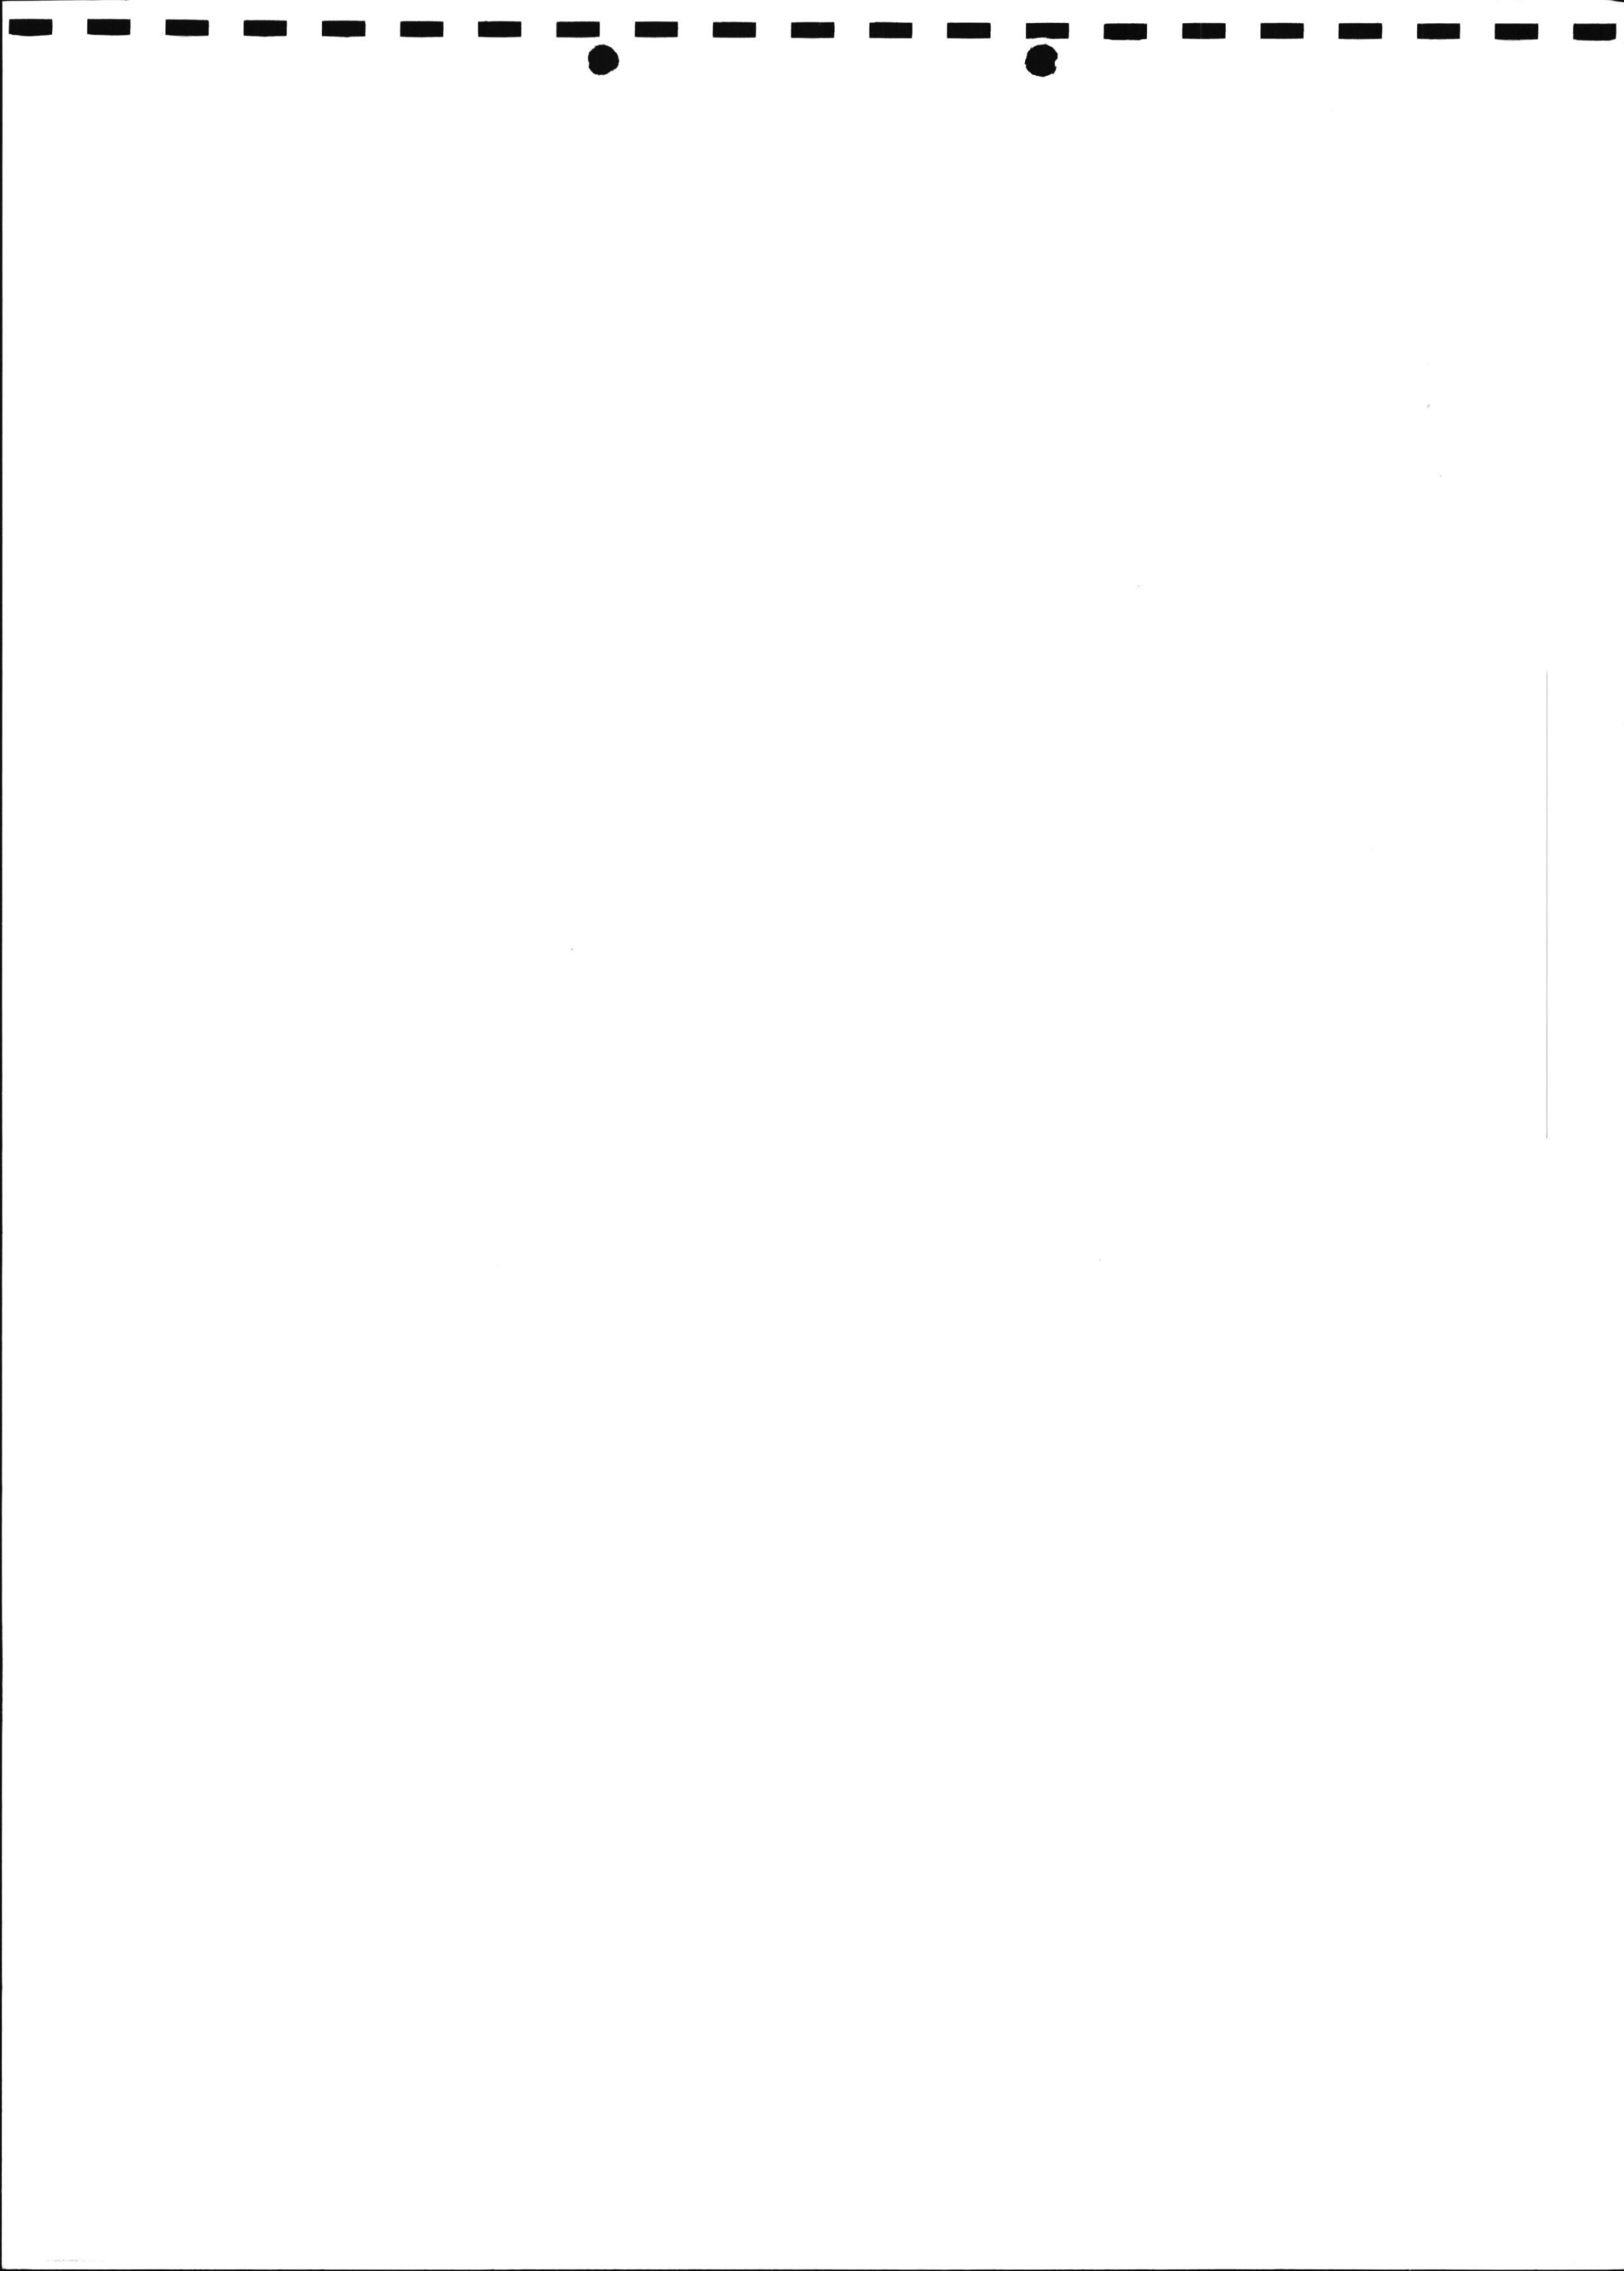

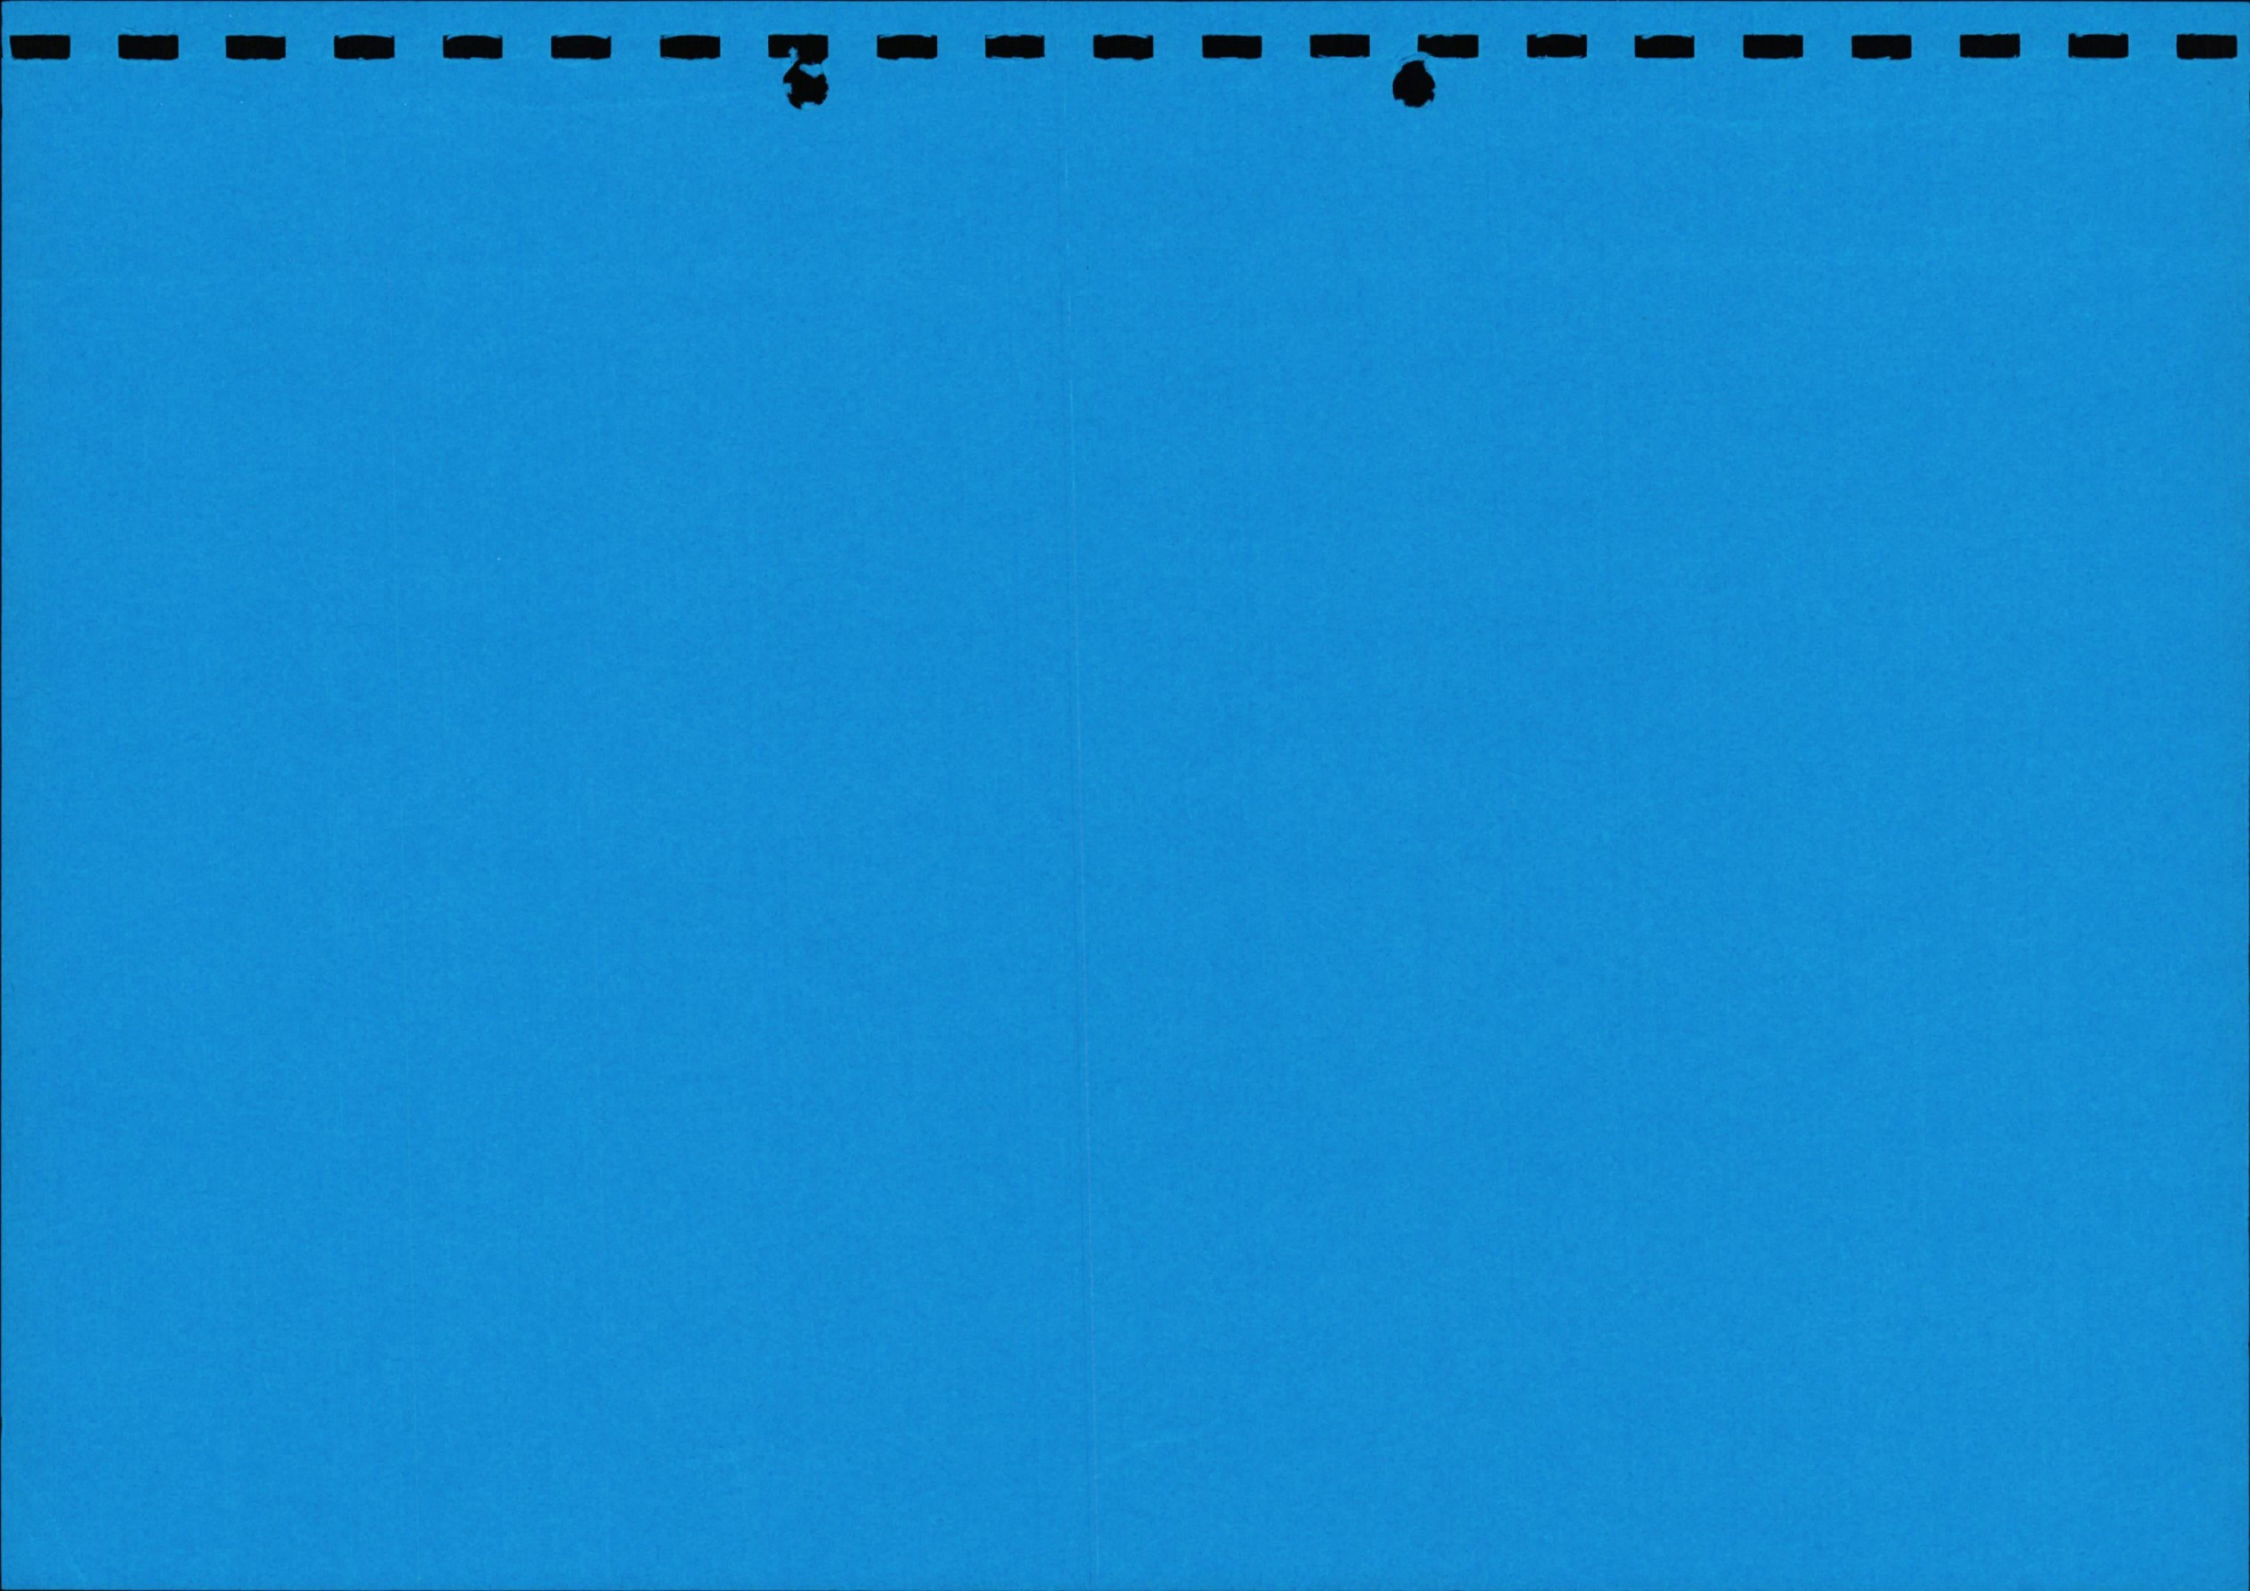

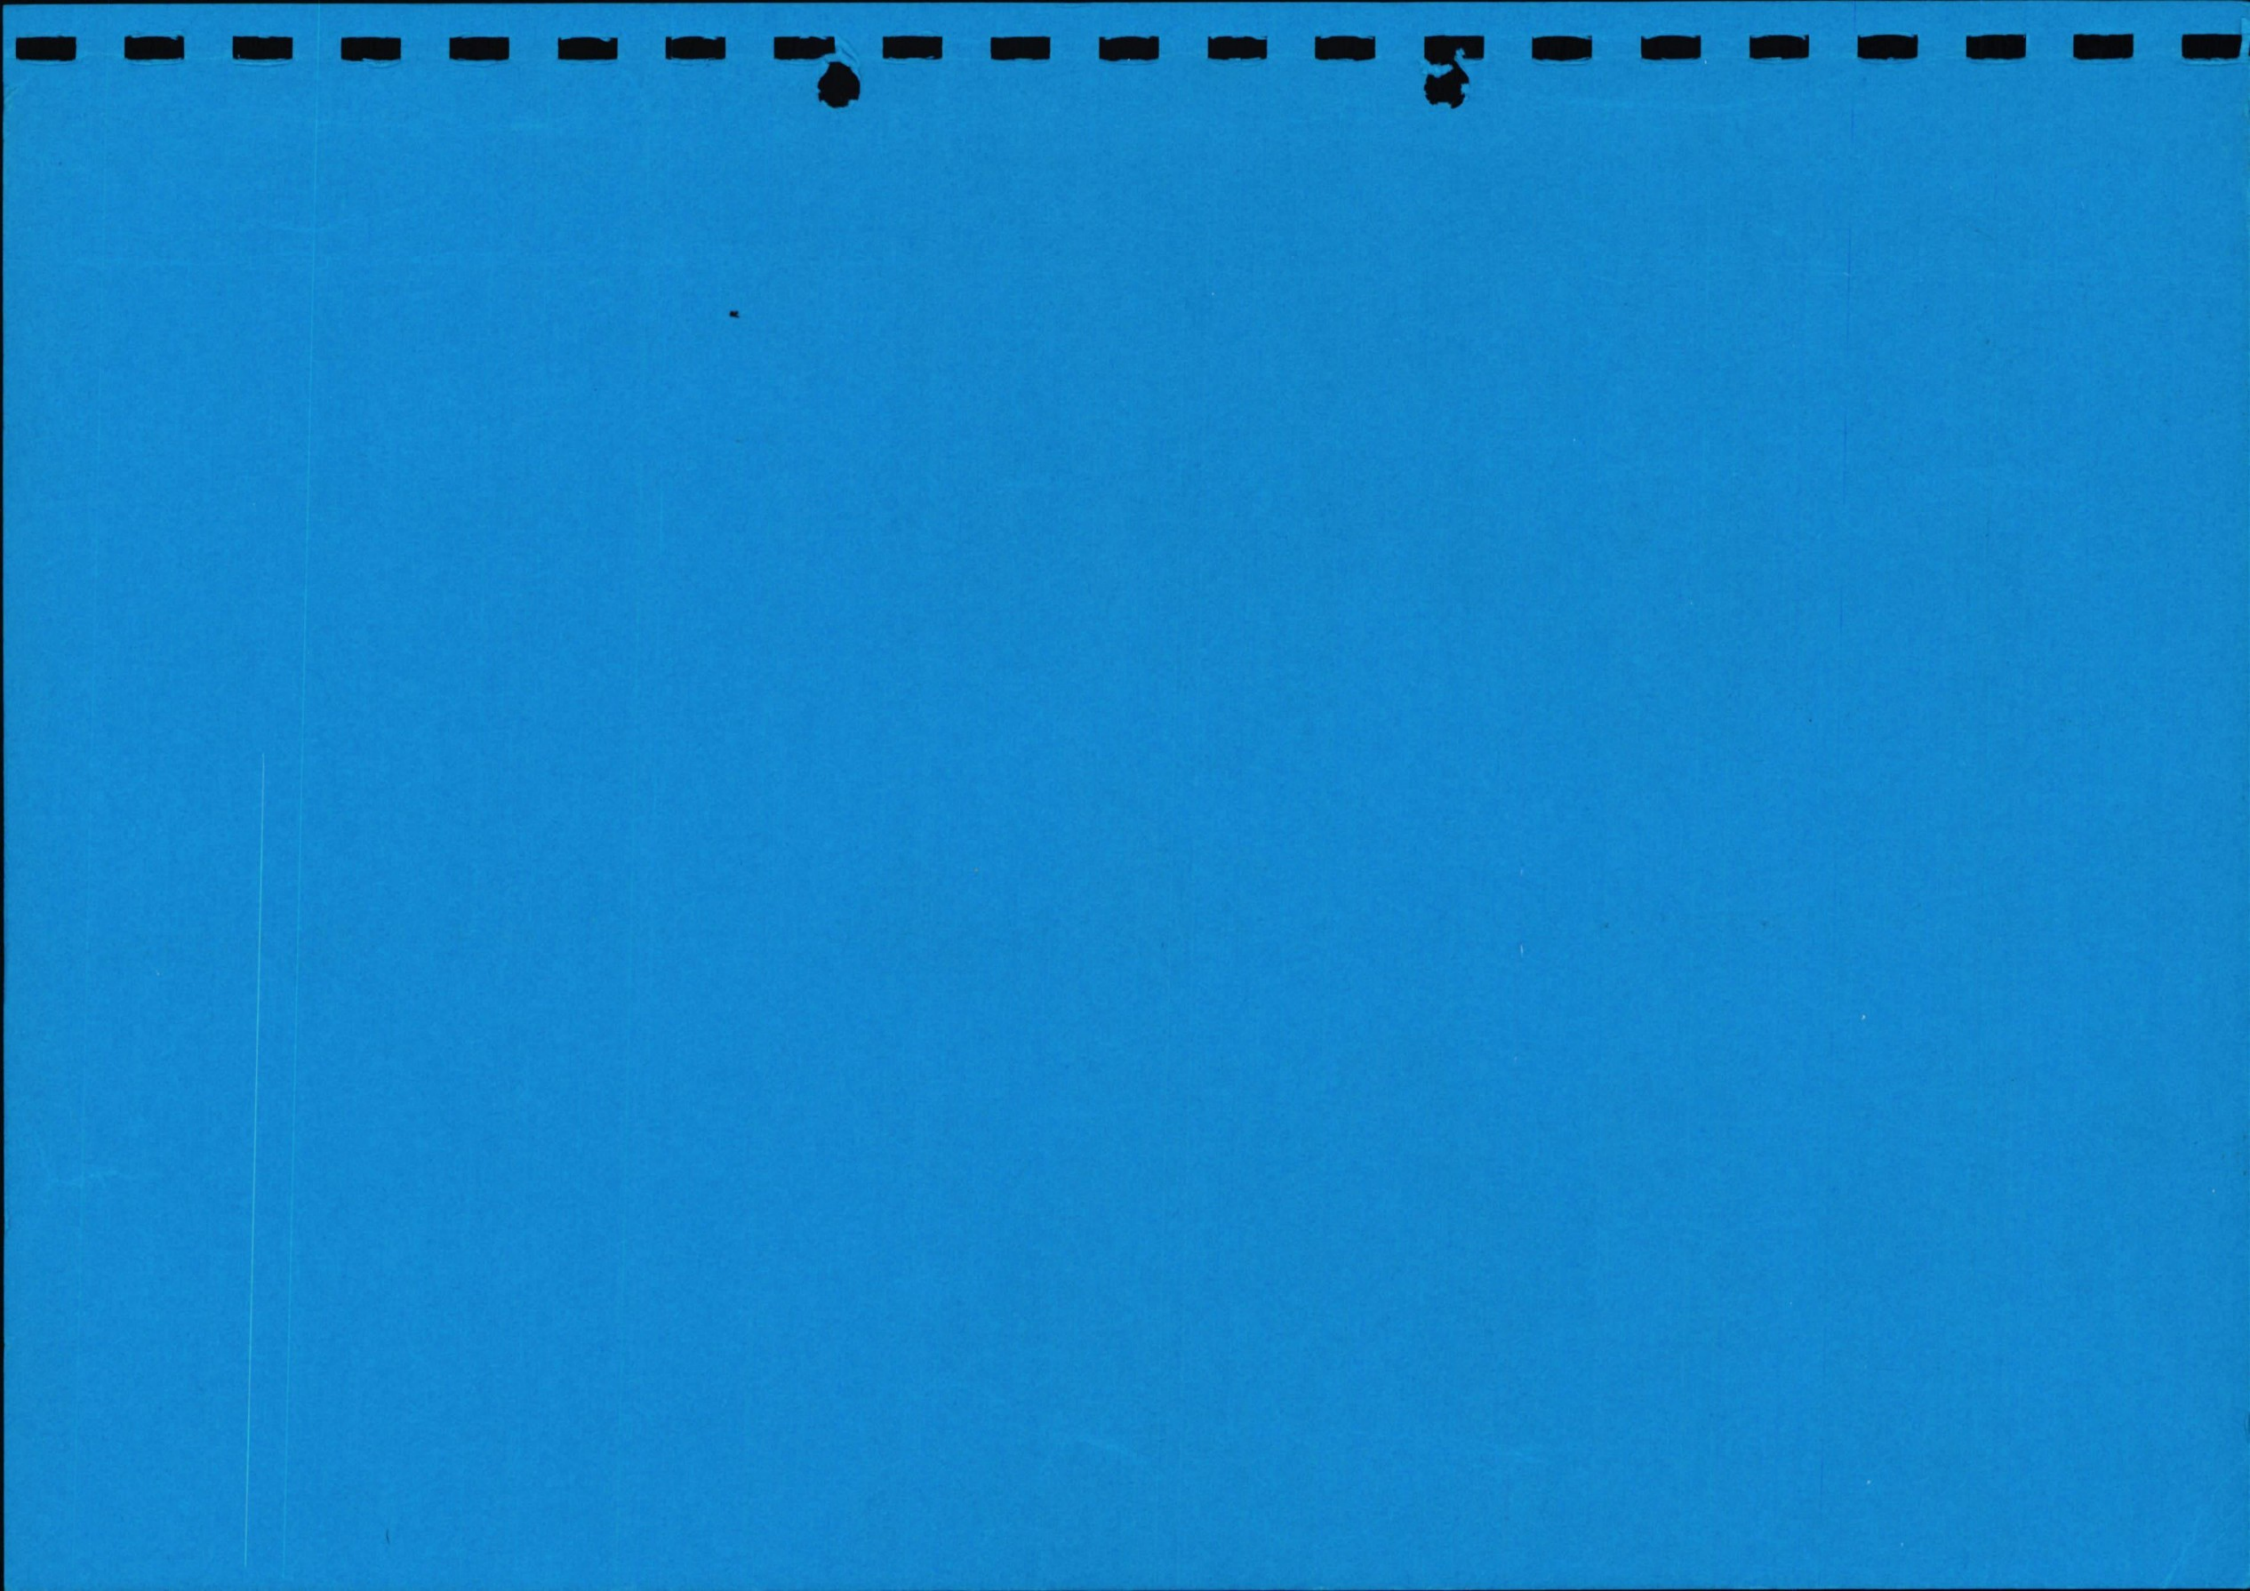

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
