JelleBijlsmaBv
GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Concept blokkenplanning v1.2
Vervangen Rwa riool Gytsjerk zuid-west

don 13-10-22
Binne van der Wal
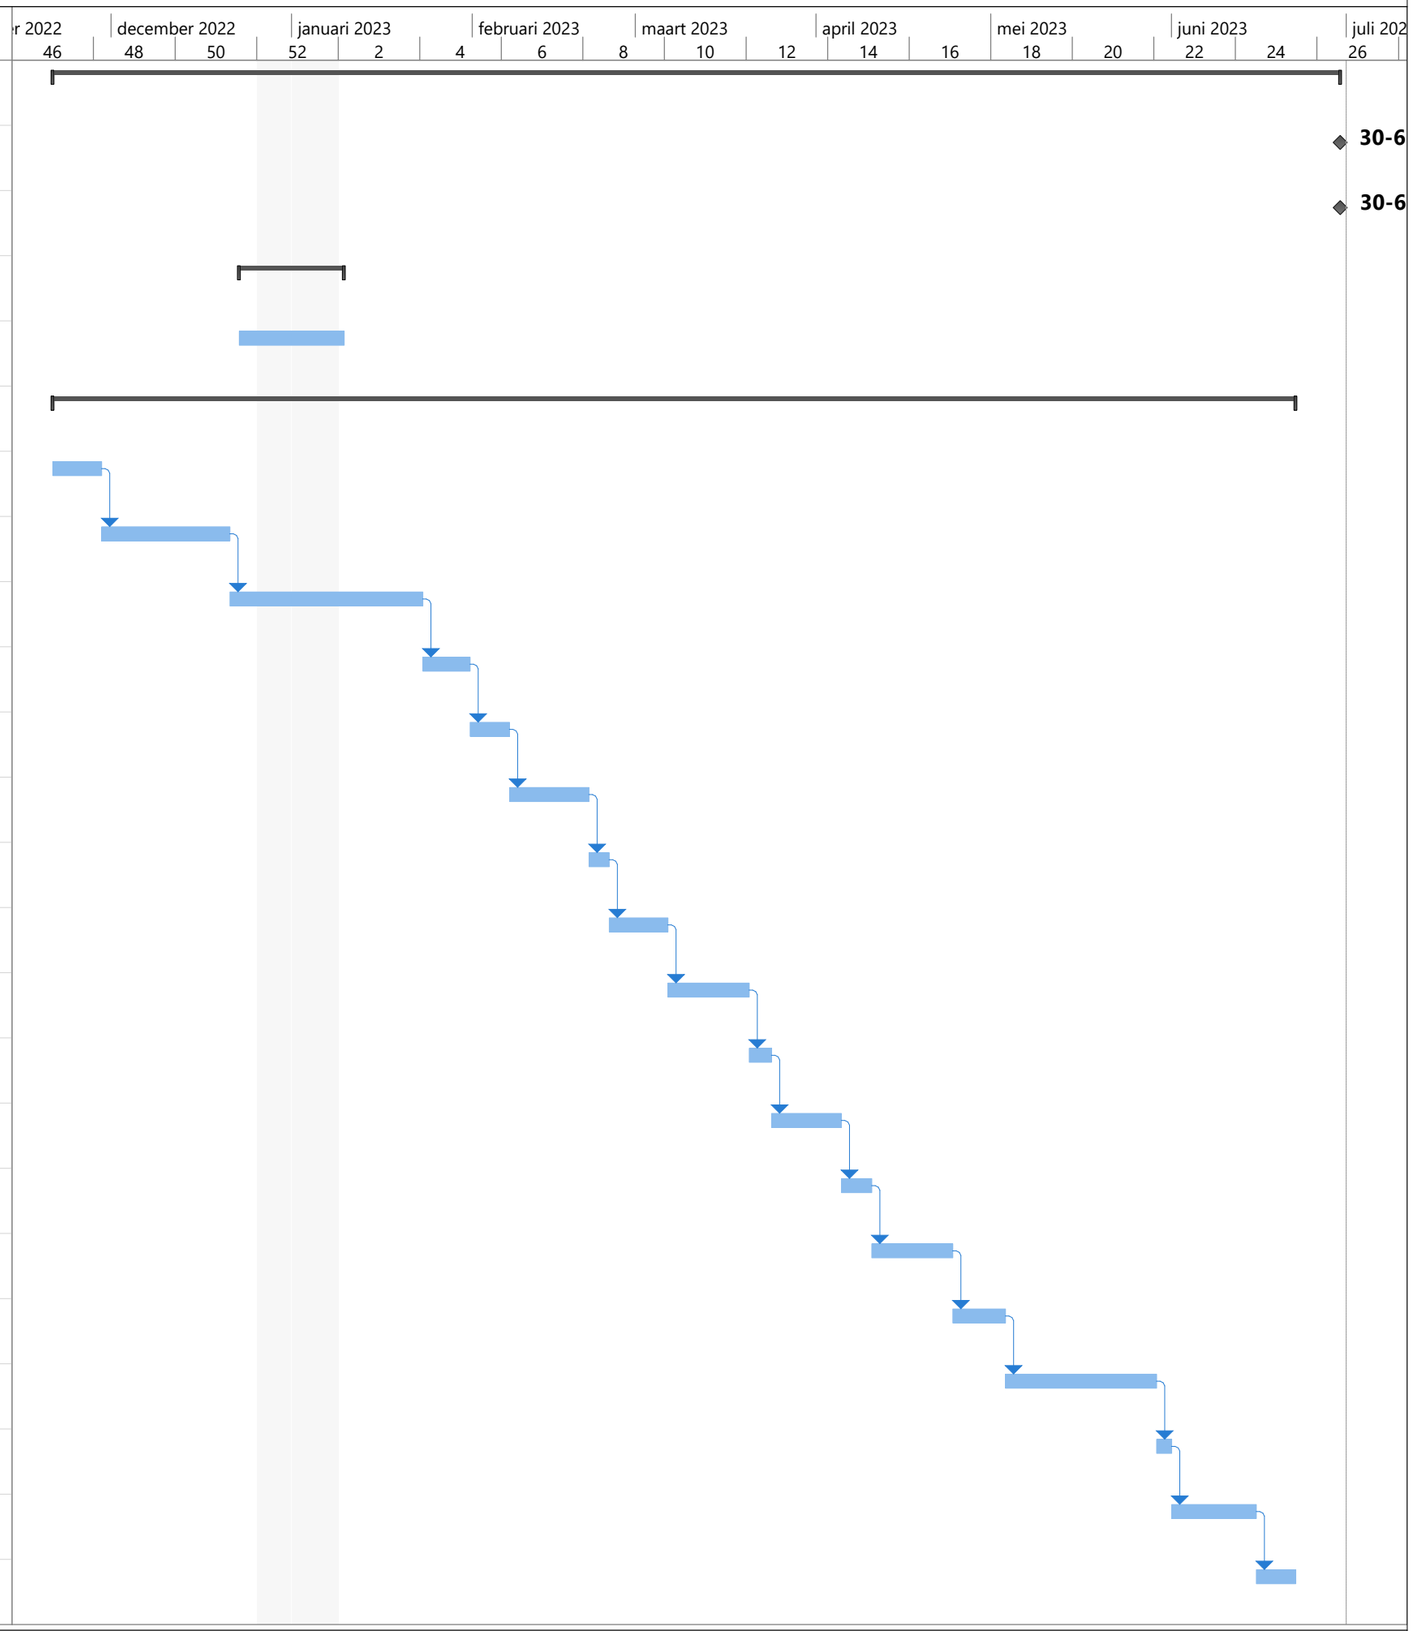
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Tekst1
1	**Blokkenplanning RWA Riool Gytsjerk**	**167,63 dager**	**maa 21-11-2**	**vri 30-6-23**	**Leidinglengte**
2	**Mijlpalen**	**0 dagen**	**vri 30-6-23**	**vri 30-6-23**	
3	Oplevering project	0 dagen	vri 30-6-23	vri 30-6-23	
4	**Vakanties**	**2,25 dagen**	**vri 23-12-22**	**maa 9-1-23**	
5	Kerstvakantie	2,25 dagen	vri 23-12-22	maa 9-1-23	
6	**Rioolwerkzaamheden**	**161 dagen**	**maa 21-11-2**	**don 22-6-23**	
7	Fase 1	7 dagen	maa 21-11-2	din 29-11-22	50m1
8	Fase 2	18 dagen	din 29-11-22	woe 21-12-2	250m1
9	Fase 3	15 dagen	woe 21-12-2	maa 23-1-23	110m1
10	Fase 4	7 dagen	maa 23-1-23	din 31-1-23	100m1
11	Fase 5	5 dagen	din 31-1-23	din 7-2-23	80m1
12	Fase 6	11 dagen	din 7-2-23	maa 20-2-23	200m1
13	Fase 7	4 dagen	din 21-2-23	vri 24-2-23	60m1
14	Fase 8	7 dagen	vri 24-2-23	maa 6-3-23	90m1
15	Fase 9	11 dagen	maa 6-3-23	maa 20-3-23	200m1
16	Fase 10	4 dagen	maa 20-3-23	vri 24-3-23	60m1
17	Fase 11	9 dagen	vri 24-3-23	woe 5-4-23	100m1
18	Fase 12	4 dagen	woe 5-4-23	maa 10-4-23	45m1
19	Fase 12A	11 dagen	maa 10-4-23	maa 24-4-23	150m1
20	Fase 13	8 dagen	maa 24-4-23	woe 3-5-23	140m1
21	Fase 14	20 dagen	woe 3-5-23	maa 29-5-23	200m1
22	Fase 14A	3 dagen	maa 29-5-23	woe 31-5-23	30m1
23	Fase 15	12 dagen	don 1-6-23	don 15-6-23	125m1
24	Fase 15A	5 dagen	don 15-6-23	don 22-6-23	75m1
