

**Samenwerkingsovereenkomst Planvoorbereiding en
Aanleg waterberging tuinbouwgebied Heemskerk**

tussen

Gemeente Heemskerk

PWN

LTO Heemskerk e.o.

HHNK

en

Provincie Noord-Holland

Samenwerkingsovereenkomst

Planvoorbereiding en Aanleg waterberging tuinbouwgebied Heemskerk

DE ONDERGETEKENDEN:

- I. De publiekrechtelijk rechtspersoon **Gemeente Heemskerk**, zetelend te Heemskerk, Maarten van Heemskerkplein 1, krachtens artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet vertegenwoordigd door wethouder klimaat, natuur en milieu, [REDACTED] J, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.: “**Gemeente**”; d.d.4 maart 2025, met kenmerk D/2025/710155
- II. **N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland**, statutair gevestigd te Velsbroek, Rijksweg 501, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34072007, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar sectormanager, [REDACTED] J, hierna te noemen: “**PWN**”;
- III. **LTO Noord** (afdeling Heemskerk) gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 08130650, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door provinciaal voorzitter LTO Noord, Noord Holland, [REDACTED] J, hierna te (blijven) noemen “**LTO Heemskerk e.o.**”;
- IV. de publiekrechtelijke rechtspersoon **Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier**, gevestigd te Heerhugowaard, Stationsplein 136, te dezen op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, namens deze [REDACTED] J, in zijn hoedanigheid van hoogheemraad, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 11 februari 2025, met kenmerk 25.0013021, hierna te noemen “**HHNK**”;

Alle vier partijen (I t/m IV) gezamenlijk hierna aan te duiden als de “**Vier Partijen**”;

- V. de publiekrechtelijke rechtspersoon **Provincie Noord-Holland**, gevestigd te Haarlem, Dreef 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34362354, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde [REDACTED] J, portefeuillehouder Natuur, Landschap en Klimaatadaptatie, ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland d.d. 4 maart 2025, met besluitnummer 2374775/2374778 op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), en als zodanig de provincie Noord-Holland te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend op grond van het bepaalde in artikel 1, lid 1 van het besluit van de commissaris van de Koning van 18-07-2023, nummer PRB-2023-8481 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland), hierna te noemen: “**de Provincie**”;

Alle vijf partijen (I t/m V) gezamenlijk hierna aan te duiden als de “**Partijen**”;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- Wereldwijd verandert het klimaat. Dit leidt onder andere tot langere periodes van (extreme) droogte en hevige neerslag;

- In Heemskerk zijn specifiek in het tuinbouwgebied Heemskerkerduin de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar. Er is regelmatig sprake van ernstige wateroverlast bij bewoners en bedrijven in het tuinbouwgebied. De hevige neerslag in combinatie met de ter plaatse zeer beperkt beschikbare waterberging in het watersysteem zijn hier debet aan;
- Vanuit de Kaderrichtlijn Water liggen er opgaven in het stroomgebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder om de waterkwaliteit in dit gebied te verbeteren. Hiervoor is de Intentieovereenkomst Gezond water in de Uitgeester- en Heemskerkerbroek getekend op 22 februari 2022;
- Eveneens liggen er kansen voor verbetering van de waterkwaliteit, natuurwaarden en versterking van het landschap in het tuinbouwgebied;
- Bovenstaande ontwikkelingen hebben de Vier Partijen doen besluiten om samen een waterberging te realiseren die bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van het tuinbouwgebied, het verbeteren van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit op basis van de KRW doelen, het versterken van de landschappelijke waarde en het creëren van een recreatieve groene verbindingszone voor mens en natuur;
- Met het oog op hun gezamenlijke doelen hebben de Vier Partijen op 10 oktober 2023 de Intentieovereenkomst Klimaatbestendig tuinbouwgebied Heemskerk gesloten;
- Op basis van de intentieovereenkomst heeft PWN de gronden kadastraal bekend als gemeente Heemskerk sectie E K en K totaal 1,57 hectare groot in 2023 aangekocht om de aanleg van de waterberging met bijbehorende nevenfuncties mogelijk te maken. De aankoop van de gronden heeft PWN zelf gefinancierd;
- De Vier Partijen hebben de Provincie als vijfde partij uitgenodigd om te participeren in het Project, mede omdat het aansluit op provinciale opgaven zoals klimaatadaptatie, waterkwaliteit, natuur en recreatie en omdat het de onderlinge samenwerking in de regio kracht bij zet.
- Bij de realisatie van het Project wordt een beroep gedaan op provinciale instrumenten. De Provincie heeft een subsidie beschikt aan PWN vanuit het Landschapsfonds. Daarnaast doet HHNK een bijdrage aan de gemeente Heemskerk vanuit de Uitvoeringsregeling Klimaatadaptatie.
- In het Omgevingsplan blijft de waterberging de functie 'Agrarisch-Tuindersgebied' behouden. . Het huidige Omgevingsplan biedt ruimte voor kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen en het realiseren van een waterberging. De waterberging krijgt een waterrijke en groene inrichting die past bij het tuindersgebied, waardoor deze ook van toegevoegde waarde is voor wat betreft de biodiversiteit, de waterkwaliteit en dagrecreatie. De waterberging krijgt een belangrijke functie om het water wat door het tuindersgebied stroomt in kwaliteit te verbeteren vanuit zowel de chemische samenstelling als ecologische waarde.
- Gemeente Heemskerk en PWN hebben financiële middelen beschikbaar gesteld of aangevraagd via subsidieregelingen. Op basis van de SSK raming (SO kostenraming) is geconcludeerd dat het Project financieel haalbaar is.
- LTO Heemskerk draagt bij aan het Project door de relevante ontwikkelingen in het gebied actief te monitoren en te signaleren richting de overige partijen. LTO Heemskerk draagt voorts zorg voor het zorgvuldig overleggen met tuinders en bewoners rondom het Projectgebied om het Project optimaal te

integreren in de omgeving. Daarnaast spant LTO Heemskerk zich in om de vrij toepasbare grond die beschikbaar komt in het Projectgebied te verwerken op nabij gelegen percelen om deze op te hogen en zo minder gevoelig te maken voor wateroverlast.

- Partijen spreken af nu de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en het Projectgebied verworven is het Project verder voor te bereiden en te realiseren door onderhavige Samenwerkingsovereenkomst Planvoorbereiding en Aanleg waterberging tuinbouwgebied Heemskerk (hierna te noemen: 'de Overeenkomst') te ondertekenen zoals aangekondigd in de intentieovereenkomst.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGESKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Het project

1. Partijen verklaren gezamenlijk de planvoorbereiding en de aanleg van de Waterberging tuinbouwgebied Heemskerk (hierna: het Project) uit te voeren.
2. De Vier Partijen hebben in de voorfase een schetsontwerp (zie bijlage A.) opgeleverd die de scope van het Project weergeeft.
3. Het geografisch afgebakende gebied waar de waterberging aangelegd zal worden is weergegeven in bijlage B (hierna: het Projectgebied).
4. Binnen het Project vinden onder andere de volgende activiteiten plaats en worden de volgende bijbehorende producten opgeleverd.
 - a. Het aanbesteden van de planvoorbereiding en contracteren van een ingenieursbureau met als resultaat een ontwerp bureau benodigd om de deelontwerpen op te leveren.
 - b. Het uitvoeren van de planuitwerking met als tussenproducten het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO).
 - c. Het doorlopen van de noodzakelijke procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen met als resultaat de vergunningen en toestemmingen om de waterberging aan te kunnen leggen.
 - d. Het opstellen van een bestek en bijbehorende uitvoeringstekeningen voor de aanleg.
 - e. Het aanbesteden van de werkzaamheden van de aanleg van de waterberging.
 - f. Het aanleggen en opleveren van de waterberging.
 - g. Het opstellen en opleveren van een door de Partijen gedragen Beheer- & onderhoudsplan voor de gebruiksfase.
 - h. Het oprichten en begeleiden van een klankbordgroep.
 - i. Het actief betrekken en informeren van belanghebbenden bij het Project en belanghebbenden in en rond de omgeving van het Projectgebied over de geplande werkzaamheden.

Artikel 2 – Financiering en subsidie

1. De Vier Partijen hebben bij het tekenen van de intentieovereenkomst afgesproken gezamenlijk te investeren in het Project om de uitvoering mogelijk te maken. Op het moment van ondertekening van onderhavige overeenkomst zijn de volgende financiële middelen beschikbaar gesteld en/of subsidies aangevraagd en beschikt volgens onderstaand overzicht.

Aanvrager	Naam subsidie (verstrekker)	Bedrag (euro)
PWN	Subsidie vanuit het Landschapsfonds Provincie Noord-Holland	█ G
Gemeente Heemskerk	Bijdrage HHNK vanuit het Programma KRW aan de gemeente Heemskerk	█ G
Gemeente Heemskerk	Subsidie HHNK aan gemeente Heemskerk op grond van de Subsidieverordening Klimaat actief Noorderkwartier (KAN);	█ G
Gemeente Heemskerk	Impulsregeling Klimaatadaptatie, Rijkssubsidie aan gemeente Heemskerk	█ G
TOTAAL		█ G


- In totaal is door de Vier Partijen bij elkaar een budget van € █ G beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding en aanleg van het Project.
- Het in lid 2 genoemde budget geldt als plafond bedrag. Dit betekent dat het Project voor dit plafondbedrag gerealiseerd dient te worden.
- De raming van het schetsontwerp (Bijlage B.) zal geactualiseerd worden bij mijlpaalmomenten VO, DO en voor aanbesteding (besteksraming). Op deze momenten in de planvoorbereidingsfase kan bijgestuurd worden in de scope van het Project en daar waar mogelijk dient het ontwerp aangepast te worden om binnen budget te blijven.
- Indien uit de besteksraming blijkt dat er naar verwachting voldoende ruimte is voor de opdrachtverlening voor de aanleg van de waterberging binnen het in lid 2 genoemde budget, zal er overgegaan worden tot de aanbesteding.
- Aanbesteding zal plaatsvinden onder voorbehoud van financiering. Dit betekent dat indien de inschrijving dusdanig hoog uitvalt dat het plafondbedrag voor het Project wordt overschreden de aanbesteding stopgezet kan worden. Vervolgens kan het ontwerp aangepast worden waarbij er opnieuw aanbesteed dient te worden.
- Bij een overschrijding van het plafondbedrag tijdens aanlegfase zullen de Vier Partijen in overleg treden. Waar mogelijk dient het ontwerp aangepast te worden om binnen het budget te blijven of er dient aanvullende financiering gezocht te worden.
- De Partijen zullen de kosten van eigen personeel niet bij elkaar in rekening brengen.
- PWN zal als penvoerder en initiatiefnemer van aanbestedingen optreden en dus contractpartners zijn van een uitvoerende partij.
- PWN zal het totale Project voorfinancieren.
- Na oplevering van het Project zal PWN de verantwoording uitvoeren naar de Provincie om de subsidie te ontvangen. De deadline voor het opleveren van het werk voor deze subsidie is 31 december 2026. De deadline voor het indienen van de aanvraag voor de vaststelling van de beschikking is 1 april 2027.
- Op basis van de totale eindafrekening zal de Gemeente de in lid 1 beschreven financiële bijdrage leveren aan PWN. Hierbij dient inzichtelijk te zijn wat de totale projectkosten zijn geweest.
- PWN voert het Project van de waterberging uit in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten (schoon drinkwater). Dit betekent dat de btw op de gemaakte kosten door PWN in aftrek kan worden genomen in de reguliere btw-aangifte van PWN.
- De Gemeente draagt █ G bij in de kosten van het Project. PWN brengt de kosten in rekening bij de Gemeente zonder btw.

Artikel 3 – Rollen en organisatie

- Partijen blijven bij de uitvoering van deze overeenkomst gehouden aan hun individuele (publiekrechtelijke) verantwoordelijkheden, voortvloeiende uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wetten en regelgeving. Het bepaalde in deze overeenkomst doet aan deze

verantwoordelijkheden (en de daaraan verbonden bevoegdheden) niet af en zal er niet toe leiden dat de bevoegde organen van Partijen niet meer de vrijheid hebben om bij het uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheden hun eigen belangen dan wel belangen van derden op een zorgvuldige wijze te wegen. Partijen zullen ter zake nimmer aansprakelijk zijn ten opzichte van elkaar.

2. Partijen hebben voor de planvoorbereiding en aanleg een projectgroep samengesteld met van elke partij een afvaardiging om (i) de inhoudelijke doelen (volgens artikel 1) van het project te behalen en (ii) de projectbeheersing op orde te houden. Zie figuur hieronder.

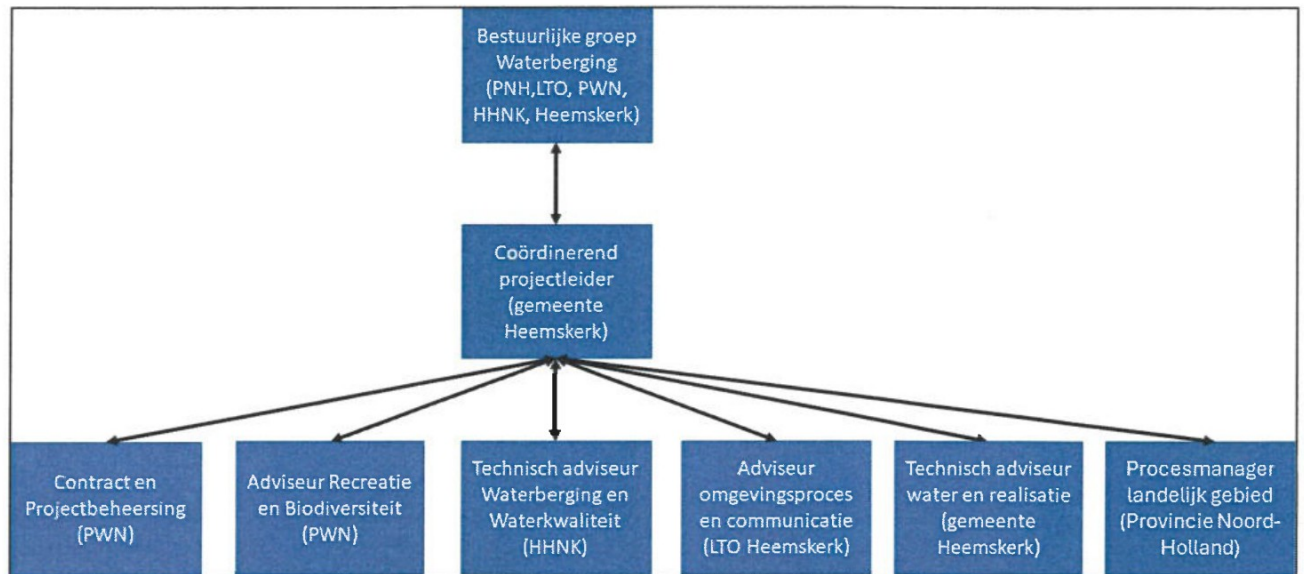

3. PWN en de Gemeente trekken samen op in de projectbeheersing en de verantwoording in verband met de financiële bijdragen en subsidies. Dit zijn PWN en de Gemeente vanuit de subsidieregelingen van de Provincie en HHNK verplicht in verband met de verantwoording van de gemaakte kosten ten behoeve van de subsidievaststelling.
4. Naast de projectgroep is er een stuurgroep. Deze bestaat uit:
 - a. de wethouder van de Gemeente Heemskerk;
 - b. een hoogheemraad van HHNK;
 - c. de Sectordirecteur Natuur en Beleving van PWN;
 - d. een bestuurslid van de LTO Heemskerk van LTO Noord;
 - e. een Gedeputeerde van de Provincie.
5. De stuurgroep kan in overleg treden op verzoek van de projectgroep.
6. De stuurgroep komt in ieder geval bij elkaar bij het tekenen van voorliggende overeenkomst, de start van de aanleg van de waterberging en de oplevering van het Project.
7. De projectgroep heeft mandaat om besluiten te nemen die nodig zijn om tot uitvoering van het Project te komen, uitsluitend voor zover deze besluiten passend zijn binnen het in artikel 2, lid 2 genoemde budget. Besluiten kunnen uitsluitend genomen worden wanneer er consensus is binnen de gehele projectgroep.

Artikel 4 Samenwerking en communicatie

1. De projectgroep komt 1x per maand bij elkaar voor een projectgroep overleg. Er wordt een verslag gemaakt en een actielijst bijgehouden en actueel gehouden.
2. Indien Partijen naar buiten treden naar de media of het publiek overleggen zij voorafgaand daaraan over een gezamenlijke boodschap of reactie.
3. De projectgroep richt een klankbordgroep in voor het Project. Deze klankbord groep komt geregeld bij elkaar bij ontwerprijpalen. Daarnaast geeft de klankbordgroep input voor de eisen waar het project aan moet voldoen. De klankbordgroep adviseert de projectgroep, maar de klankbordgroep kan niet

beslissen. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden en ondernemers rondom of nabij het projectgebied.

Artikel 5 Eigendom en Beheer

1. De percelen [K] en [K] waarop de waterberging met nevenfuncties gerealiseerd gaat worden zal in eigendom blijven bij PWN tijdens de aanleg van de waterberging en daarna tijdens de in gebruiksfase.
2. Het westelijk gelegen perceel kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie E, nummer [K] is op het moment van ondertekening van de Overeenkomst nog uitgegeven in pacht. Het perceel is eigendom van de Provincie en in beheer bij PWN. Provincie en PWN voeren de gesprekken om het perceel beschikbaar te krijgen voor de aanleg van de waterberging.
3. Bij het opstellen van het DO zal definitief besloten worden of het in lid 2 genoemde perceel onderdeel wordt van het Project of niet.
4. De Gemeente, HHNK, de Provincie en PWN verlenen toestemming om het project aan te leggen op de percelen [K] [K] [K] [K] [K] en [K] zoals weergegeven in Bijlage B van voorliggende overeenkomst.
5. PWN is na aanleg van de waterberging verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Projectgebied met uitzondering van de onderdelen waarvoor HHNK verantwoordelijk is. PWN is onder andere verantwoordelijk voor de groenvoorzieningen, wandelpaden en overige recreatieve objecten in het Projectgebied.
6. HHNK is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hoofdwatersysteem. Daartoe onderhoudt HHNK de primaire watergang en de peilregulerende werken. De Legger zal aangepast worden aan de nieuwe situatie na oplevering van het Project waarbij onder andere de waterberging zal worden opgenomen in de Legger.
7. Een en ander zal nader gedetailleerd en vastgelegd worden in een Beheer- & onderhoudsplan (inclusief beheerkaart met objecten en verantwoordelijke instantie) op te stellen door HHNK en PWN gezamenlijk.
8. Gemeente Heemskerk is verantwoordelijk voor openbare voorzieningen buiten het Projectgebied (parkeren, hondenuitlaten, paarden etc.).

Artikel 6 – Proces en planning

1. De planning van het Project is opgenomen in bijlage D.
2. Partijen spannen zich in om de gezamenlijk bepaalde planning te behalen.
3. Partijen spannen zich in voor een voortvarende uitvoering van het Project en dragen zorg voor tijdige voorbereiding en agendering van de noodzakelijke besluiten voor de stuurgroep die buiten het mandaat van de projectgroep vallen.
4. Het Project dient opgeleverd te worden uiterlijk 31 december 2026. Dit in verband met de verplichtingen die aan de subsidie van de Provincie, verleend aan PWN zijn verbonden. Deze verplichtingen zijn leidend voor de planning.
5. Bij het niet halen van bovengenoemde planning dient PWN tijdig in overleg te treden met de subsidieverstrekker om eventuele verlening van de subsidie aan te vragen. Dit zal gedaan worden bij de mijlpalen van het VO, DO en besteksraming.

Artikel 7 Risico's

1. Partijen dragen ervoor zorg dat de werkzaamheden, zoals beschreven in deze overeenkomst tijdig uitgevoerd wordt. Voor zover dit onverhoopt niet mocht lukken, spannen Partijen zich in om de vertraging van werkzaamheden van de desbetreffende opdrachtnemer zoveel mogelijk te beperken.
2. Mochten ondanks het gestelde in lid 1 zich toch onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor een situatie van stagnatie dreigt te ontstaan, dan overleggen de Partijen tijdig teneinde het probleem onder controle te houden.
3. Wanneer een van de Vier Partijen verzoekt om een wijziging van de scope van het project en de andere partij gaat met deze wijziging akkoord, zijn de eventuele meerkosten daarvan voor rekening van de verzoekende partij.

Artikel 8 Schade

1. Afstemming over de behandeling van verzoeken om schadevergoeding en aansprakelijkstellingen vindt plaats binnen de projectgroep. Deze onderzoekt en beoordeelt de situatie en draagt zorg voor overdracht van de casus aan de meest gereede partij, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verzoeken om nadeelcompensatie/planschade en aansprakelijkstellingen wegens onrechtmatige daad. Indien de projectgroep na afronding van het Project is opgeheven, is de Gemeente voor derden die menen schade te lijden het eerste aanspreekpunt. De Vier Partijen, voor zover zij relevant zijn voor de schadeafhandeling, wijzen dan op verzoek van de Gemeente contactpersonen aan om de in de volgende leden opgenomen afspraken uit te voeren.
2. Bij de afstemming als bedoeld in lid 1 wordt mede gezien in hoeverre de schade gedekt is onder een verzekering. Indien dat het geval is wordt de zaak voorgelegd aan de verzekeraar. Als blijkt dat nader onderzoek naar de exacte schadeoorzaak noodzakelijk is, los van eventueel onderzoek door een door de verzekeraar in te schakelen expert, overleggen de Vier Partijen binnen de projectgroep over een opdracht en de betaling ervan. De projectgroep draagt vervolgens zorg voor onderzoek en rapportage. De Vier Partijen en verzoeker(s) krijgen gelegenheid tot correctie op feitelijke onjuistheden in de rapportage. De bestuurlijke besluitvorming vindt plaats na het advies van de projectgroep.
3. Nadeelcompensatie ten gevolge van het Project wordt evenredig verdeeld tussen Gemeente en PWN tenzij de schadelijdende partij op grond van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet in aanmerking komt voor schadevergoeding of nadeelcompensatie van HHNK.
4. De partijen PWN en Gemeente en de Provincie zullen geen schadevergoeding of nadeelcompensatie als bedoeld in lid 3 van HHNK verlangen in verband met het Project of de aanwezigheid en het gebruik van de waterberging en de eventueel daaruit voortvloeiende wateroverlast.
5. Indien PWN de percelen die als waterberging worden ingericht laat gebruiken door derden via een zakelijk recht of ander (gebruiks)recht zoals huur, pacht etcetera, vrijwaart PWN HHNK van de verplichting tot het betalen van nadeelcompensatie of schadevergoeding aan die derden. Indien PWN de percelen in eigendom overdraagt aan een derde zal het deze vrijwaring zodanig contractueel vastleggen, bijvoorbeeld middels een kwalitatieve verplichting, dat HHNK ook na overdracht van de percelen niet gehouden zal zijn schadevergoeding of nadeelcompensatie toe te kennen vanwege het gebruik en de aanwezigheid van de waterberging op de percelen en de eventueel daaruit voortvloeiende wateroverlast.
6. Schadevergoedingen op grond van onrechtmatige daad komen voor rekening van de partij die hiervoor aansprakelijk is.

Artikel 9 – Slotbepaling

1. Met deze samenwerkingsovereenkomst leggen de Partijen vast om gezamenlijk een waterberging met bijbehorende nevenfuncties aan te leggen in het Heemskerkerduin. Partijen committeren zich aan de inhoud van deze overeenkomst.
2. Voorliggende Overeenkomst treedt in werking bij het ondertekenen van de Overeenkomst.
3. De Overeenkomst eindigt wanneer PWN de beschikking heeft ontvangen van de Provincie Noord-Holland en de bijdrage van de gemeente Heemskerk aan PWN is voldaan, echter geldt dat artikel 8 (Schade) voor onbepaalde tijd van kracht is.
4. Elke Partij kan, onverminderd de eventuele andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere Partij(en) schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Voor wijziging van deze overeenkomst is voorafgaande schriftelijke instemming van alle Partijen vereist.
5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 10 – Bijlagen

De volgende bijlagen van de Overeenkomst, maken nadrukkelijk onderdeel uit van de Overeenkomst:

- A. Schetsontwerp Waterberging tuinbouwgebied Heemskerk 2024 (apart als PDF)
- B. Projectgebied Waterberging tuinbouwgebied Heemskerk

- C. SSK raming schetsontwerp 2024 (apart als PDF)
- D. Planning
- E. Rolverdeling projectgroep van de Partijen
- F. Begrippenlijst

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt en ondertekend op: 6 maart 2025

Heemskerk
namens deze

PWN
namens deze

HHNK
namens deze

LTO Heemskerk e.o.
namens deze



Provincie Noord-Holland
Namens deze



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
