

Van: " " J Document 24
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 16:27
Aan: " " J@zuidplas.nl>; " " J@zuidplas.nl>;
"Wybe Zijlstra" <wybe.zijlstra@zuidplas.nl>; " " J@zuidplas.nl>; "Bestuurssecretariaat
Zuidplas" <bs@zuidplas.nl>
Onderwerp: Agenda + stukken stuurgroep Duurzaamheid 3 november
Bijlage(n): Agenda stuurgroep Duurzaamheid 3 november 2025.pdf, 1. Financieel voorstel 2026 om tekort te
dekken.pdf, 2. Voortgangsrapportage Duurzaamheid oktober 2025 versie stuurgroep.pdf, 3. BW Planning Duurzaamheid versie
Stuurgroep.pdf, 4. Resultaatplanning Programma Duurzaamheid.pdf, 5. Afronding opdracht SG DZH.pdf

Beste allemaal,

Bijgevoegd vinden jullie de agenda en de stukken voor de stuurgroep Duurzaamheid van aanstaande
maandag 3 november.

Met vriendelijke groet,

" J
Cluster Project Management Bureau (PMB)
Bereikbaar: ma-vr
T 06 - " J

Stuurgroep Duurzaamheid 03-11-2025

Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: 1.13

Deelnemers:

Wethouder Wybe Zijlstra

Ambtelijk opdrachtgever [REDACTED] 

Programma manager, tijdelijk geen invulling

Bestuursadviseur [REDACTED]  (voorzitter)

Programmastrateeg [REDACTED] 

Programmasecretaris [REDACTED]  (notulist)

Agenda

1. Financieel voorstel Duurzaamheid 2026

Bijlage 1: Financieel voorstel 2026 om tekort te dekken

2. Voortgangsrapportage Duurzaamheid

Bijlage 2: Voortgangsrapportage najaar 2025 Duurzaamheid

3. B&W planning Duurzaamheid

Bijlage 3: B&W planning Duurzaamheid

Ter bespreking: Er is geen definitieve eindcheck meer voor stukken. Hoe gaan we hiermee om? Er staat veel op de planning voor Q4/Q1

4. Resultaatplanning Duurzaamheid

Bijlage 4: Resultaatplanning

5. Tijdelijk geen programmamanager

Bijlage 5: Afronding opdracht SG DZH

Ter bespreking.

Wie neemt de programmataken op zich? bv voorbereiden raadsvergadering nov, controleren en aansturen voortgangsrapportage. Hoe aankomende stuurgroepen?

Financieel voorstel 2026

Het college stelt in de begroting 2026-2029 voor om alleen de Rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor Duurzaamheid. Deze middelen heeft het Rijk beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Klimaatadaptatie en biodiversiteit valt hier niet onder. De middelen uit 2025 die overgeheveld hebben vallen onder de zogenoemde CDOKE-regeling. Is geormerkt geld en kan meegenomen worden naar 2026.

Op basis van de laatste berekeningen is het tekort voor 2026 G Hierbij is de extra inzet voor de RES conform motie raad als verwerkt en is ook de subsidie SMP ter hoogte van G verwerkt. Omdat onlangs is gebleken dat vanaf 1 januari de werkzaamheden op het gebied van Electrolyser zijn gestopt, zijn de geraamde kosten hiervoor in mindering gebracht.

Tekort	
Samenvoegen programmamanager Duurzaamheid en opgavemanager landschappelijk ZP (dekking zit dan ergens anders)	G
Schrappen duurzame mobiliteit conform teksten begroting	
WOCO's benaderen om mee te betalen aan SMP	
Schrappen programmacommunicatie/ minder communicatie- en participatie duurzaamheid	
Overheveling middelen 2025, omdat de kosten van SMP in 2026 vallen ipv in 2025 is ruim G	
NB. Financieel doorbelasting klopt nu niet. Dit jaar 3 zwangerschapsverloven zowel inhuur als vaste medewerkers worden doorbelast. Gecorrigeerd worden.	
Regionale middelen Zorgen dat niet besteedde regionale middelen worden verdeeld over de 5 gemeenten. Na herhaaldelijk opdracht hiervoor te hebben gegeven, zit hier geen beweging in.	G
Herverdeling planfinanciering of toekenning planfinanciering Zuidplas heeft subsidie aangevraagd bij RVO voor herziene aanpak warmte. De vraag is of dit wordt toegekend. Daarnaast worden niet uitgegeven planfinanciering vanuit Rijk herverdeeld over de gemeenten.	
	PM

Programma Duurzaamheid

Voortgangsrapportage najaarsnota 2025

Opdrachtgever	
Programmamanager	
Huidige stadium of fase	Uitvoeringsfase

Eerdere rapportages

Nr.	Datum	Verstuurd aan
1	15-5-2024	Stuurgroep Duurzaamheid
2	10-7-2024	Stuurgroep Duurzaamheid
3	17-10-2024	Stuurgroep Duurzaamheid
4	16-01-2025	Stuurgroep Duurzaamheid
5	22-05-2025	Stuurgroep Duurzaamheid

1. Stand van zaken

Legenda		
+	Goed	Loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst
0	Matig	Lichte afwijking van plan verwacht, aandacht gewenst
-	Zorgwekkend	Stevige afwijking van plan verwacht, extra aandacht en maatregelen

Aan de hand van THEFD en bovenstaande legenda wordt de voortgang gerapporteerd over programmadoelen, inspanningen en middelen

	Tempo	Haalbaarheid	Efficiënte	Flexibiliteit	Doelgerichtheid
Operationele doelen	Haal ik mijn doelen snel genoeg?	Zijn mijn doelen haalbaar?	Voegen de doelen waarde toe?	Kunnen de doelen worden bijgesteld?	Dragen de doelen voldoende bij aan de ambitie?
Inspanningen	Worden de inspanningen op tijd uitgevoerd?	Zijn de inspanningen haalbaar?	Zijn de inspanningen rendabel?	Kunnen de inspanningen worden bijgesteld?	Dragen de inspanningen voldoende bij aan de doelen?
Middelen	Zijn de middelen op tijd beschikbaar?	Zijn de middelen beschikbaar?	Vragen de middelen veel offers?	Kunnen de middelen herstemd worden voor een andere inspanning en/of doel?	Dragen de middelen voldoende bij aan de inspanningen?

1. Totstandkoming van doelen

Status doelen energietransitie

Doel	Status vorige voortgangsrapportage zomernota 2025	Status najaarsnota 2025
Het behalen van: 1. Regionaal doel 0,435 TWh duurzame elektriciteit. 2. Lokaal doel: 0,097 TWh duurzame elektriciteit.	Er kan eind 2025 meer gezegd worden over het behalen van het beoogde regionale doel. Het doel is regionaal bepaald en kan niet lokaal worden bijgesteld. In het monitoren van de RES moet bekeken worden of we op schema liggen met het doel. Ook hier kan nog geen volledig beeld van gegeven worden. De verwachting is dat het lokale doel behaald wordt. In 2024 is versnellingsaanpak Zon op Dak vastgesteld waarmee in 2030 84% van het collegedoel behaald kan worden met Zon op Dak. In het eerste jaar wordt ingezet op de 20 grootste daken. Aanpak wordt per kwartaal geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Zonne-energie die wordt opgewekt op kleine daken is hier niet in meegerekend. Begin 2025 is door het college een principebesluit voor Zon op Veld genomen waarmee potentieel 46% van het collegedoel behaald kan worden. Op lokaal niveau vindt monitoring al plaats in de vorm van een dashboard. In samenwerking met het ODMH wordt gewerkt om de bereikte resultaten, projecten in pijplijn en ambities te integreren binnen het lokale monitoringssysteem.	Regionaal doel Het regionaal bod van 0,435 TWh duurzame elektriciteit blijft binnen bereik. In juni/juli 2025 is een regionaal monitoringsinstrument opgezet dat door ODMH wordt gevuld en bewaakt. Uit de inventarisatie van september 2025 blijkt dat het realiseren van het bod mogelijk is zonder provinciale aanwijzing voor afwijkende windlocaties. Lokaal doel Voor het behalen van het lokale doel wordt er momenteel gewerkt aan de Lokale Energie Uitvoeringsstrategie (LEUS), die aansluit op de RES-monitoring. De LEUS geeft inzicht in de lokale mogelijkheden voor zonne-energie en vormt de basis voor het monitoren van de voortgang richting 2030. Hiermee kan beter worden gestuurd en waar nodig worden bijgestuurd. Om de lokale doelstelling van 0,097 TWh te behalen is naast de lopende projecten en de verwachte autonome groei extra inzet nodig. Meer informatie hierover is terug te lezen in de LEUS.
In 2026 hebben we zicht op de verduurzamingsopgave van ondernemers en hun bedrijven. We hebben een plan opgesteld om ze klimaatneutraal te maken richting 2050.	Dit doel wordt niet behaald. Vanwege gebrek aan personele capaciteit ligt de inspanning om te komen tot een plan van aanpak stil.	Dit doel wordt niet behaald. De status sinds de vorige voortgangsrapportage is ongewijzigd.
In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid	Per 1 januari 2025 zijn er precies 200 laadpalen in de openbare ruimte. 14 mei 2025 wordt het ontwerpbesluit voor nieuwe laadpalen gepubliceerd. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een	Deze doelstelling is reeds gehaald.

tot elektrisch laden van de auto uitgebreid ten opzichte van 2022.	prognose van de vraag naar elektrische oplaadpunten in 2030. Volgens onze prognose moeten er in 2030 nog 373 laadpalen bij om aan de toekomstige vraag te voldoen. Bewoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Vervolgens volgt een verzamelverkeersbesluit. Deze wordt begin Q3 2025 gepubliceerd.	
Vastgestelde visie op verduurzamen van eigen mobiliteit.	Dit doel wordt niet behaald. Er mist capaciteit bij HR om een visie op te stellen voor het verduurzamen van eigen mobiliteit. Er worden wel maatregelen getroffen om de eigen mobiliteit te verduurzamen. Zie inspanning 'Vaststellen visie op verduurzamen van eigen mobiliteit'.	Vanuit HR hebben wij geen informatie ontvangen over de status van dit doel.
Alle gemeente-voertuigen die aan vervanging toe zijn, worden vervangen door een zo duurzaam mogelijk alternatief.	Ondanks dat het door netcongestie lastig is om nieuwe aansluitingen voor laadpalen voor elkaar te krijgen wordt zo veel mogelijk verduurzaamd. Zo is er een oude vorkheftruck op gas vervangen door twee nieuwe elektrische vorkheftrucks en rijden er inmiddels zes elektrische wijkteamauto's rond. Ook wordt onderzocht of een vrijblijvende samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rotterdam haalbaar en wenselijk is.	Het doel blijft haalbaar , al vormt netcongestie nog steeds een uitdaging bij het realiseren van nieuwe laadvoorzieningen. Desondanks wordt waar mogelijk verduurzaamd. Het plan voor een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Rotterdam wordt binnenkort ter besluitvorming aan de directie voorgelegd.

Status doelen warmtetransitie

Doel	Status vorige voortgangsrapportage zomernota 2025	Status najaarsnota 2025
Eind 2030 wordt 80% van de geclusterde glastuinbouw van duurzame warmte voorzien.	Dit doel lijkt behaald te gaan worden. Op basis van de laatste planningsinzichten is duurzame warmte voor de glastuinbouw voorzien voor fase 1 vanaf eind 2028; fase 2: 2029; en fase 3 en 4: 2030. Daarmee is nu in de planning dat ca 80% van de geclusterde tuinbouw wordt aangesloten. Deze planning is mede afhankelijk van toekenning van subsidies aan NetVerder.	Het doel lijkt haalbaar. NetVerder werkt aan een aangepaste opzet van het project om de uitrol van het warmtenet binnen een sluitende businesscase mogelijk te maken. De daadwerkelijke aansluiting zal in overleg tussen de glastuinbouwondernemers en NetVerder plaatsvinden.
In 2030 zijn 3.600 woningen aardgasvrij gemaakt.	Op landelijk niveau is er nog steeds een achterstand om woningen van het gas af te krijgen, zo ook in Zuidplas. Zonder aanvullend Rijksbeleid en instrumentarium, inclusief middelen vanuit het Rijk, zullen de 3600 aardgasvrije woningen in 2030 niet worden	Het beperkte Rijksbeleid en de landelijke vertraging vormen een risico voor het behalen van de doelstelling van 3.600 aardgasvrije woningen in 2030. De gemeente anticipeert hierop door in te zetten op realistische, lokaal uitvoerbare stappen en door

3 warmteplannen: Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle en Zevenhuizen.	bereikt. In het nieuwe regeringsprogramma wordt gesteld dat de landelijke doelen blijven staan, echter wordt er bezuinigd op middelen en zijn enkele verplichtingen teruggetrokken, zoals de aanschaf van een hybride warmtepomp en verhoging energielabels voor particulieren. In Q1 2025 is gestart met de herziene aanpak, deze wordt in Q3 2025 opgeleverd. Tevens wordt een handelingsperspectief uitgewerkt voor de stappen die mensen zelf alvast kunnen zetten, deze wordt ook in Q3 2025 openbaar gemaakt. Er is nog geen personele invulling gevonden voor de overall opgave aardgasvrij, wel start per 1 juni de projectleider warmtetransitie die verder gaat met de zaken die alvast opgepakt kunnen worden vanuit de herziene aanpak.	inwoners beter te ondersteunen bij eigen initiatieven richting aardgasvrij wonen. De uitvoering van de warmtetransitie in Zuidplas verloopt volgens planning. De herziene aanpak ligt op koers en wordt in het vierde kwartaal van 2025 opgeleverd. Op 1 juni 2025 is een nieuwe projectleider gestart die verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van deze aanpak. Het handelingsperspectief speelt hierbij een belangrijke rol. Het biedt inwoners praktische handvatten en informatie om zelf stappen te zetten richting duurzame warmteoplossingen. De oplevering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025.
In 2026 is de CO ₂ -uitstoot van het gemeentelijk vastgoed met 20% gedaald ten opzichte van. 2022.	Van Vastgoed hebben wij geen informatie ontvangen over de status van dit doel.	De exacte uitstootcijfers over 2025 zijn op dit moment nog niet bekend, aangezien het verslagjaar nog niet is afgesloten. Deze gegevens zullen worden opgenomen zodra de monitoring over 2025 is afgerond.

Status doelen klimaatbestendigheid en biodiversiteit

Doel	Status zomernota 2025	Status najaarsnota 2025
Vanaf 2026 voldoen alle nieuwbouwprojecten minimaal aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en aan de wettelijke verplichtingen.	Deze doelstelling loopt volgens planning, en er is een aanpassing van het plan van aanpak. Het behalen van deze doelstelling is tweeledig. Allereerst is het zo dat de provincie op gaat nemen in de provinciale verordening dat alle bouwprojecten en opgaven moeten voldoen aan het convenant klimaatadaptief bouwen. Hierdoor ontstaat de verplichting ook voor de gemeente. Daarnaast werken we als gemeente aan een handreiking en toetsingskader voor klimaatbestendig bouwen. Hiermee bepalen we als gemeente hoe wij vinden dat ontwikkelingen voldoende	De doelstelling is vooralsnog haalbaar, maar vraagt wel wat aandacht voor 2026. Inspanningen zijn hierop aangepast. De update van de tekst zoals hiernaast is beschreven is voor een groot deel nog van toepassing. Op dit moment loopt er een proces bij de RvS tussen Cortelande en HHSK. In overleg met Cortelande en Strategisch adviseur is het op dit moment niet verstandig om beleid of andere regels vast te stellen op het gebied van klimaatadaptatie en water. De planning voor de handreiking in Q4-2025 wordt daardoor niet gehaald.

	klimaatbestendig zijn. Hiermee voldoen we ook aan de verplichting van de provincie. De planning is dat de handreiking in Q4-2025 wordt vastgesteld door college.	Voor 2026 is de inspanning in de programmabegroting 2026-2029 opgenomen om deze handreiking en toetsingskader alsnog af te ronden. Hierbij wordt goed gekeken of de handreiking en het toetsingskader in grote lijnen overeenkomt met de uitgangspunten bij Cortelande. Wel zijn we afhankelijk van dit lopende traject en de planning of iets kan worden vastgesteld. Een oplossing waar nu op wordt ingezet is om de handreiking niet vast te laten stellen door het college, maar als handreiking te publiceren ter ondersteuning aan de collega's en ontwikkelaren. Op deze manier geven we als gemeente aan hoe wij vinden dat ontwikkelingen voldoende klimaatbestendig zijn en dus voldoen aan de verplichting van de provincie en het convenant. Op deze wijze heeft dit geen invloed op het traject bij de RvS. Dit wordt in 2026 verder uitgewerkt. Dit maakt dat de verplichting komt vanuit de provincie (omgevingsverordening) en niet vanuit de gemeente.
Vanaf 2026 voldoen alle ontwikkelingen in de openbare ruimte minimaal aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en aan de wettelijke verplichtingen.	Deze doelstelling loopt volgens planning, en er is een aanpassing van het plan van aanpak. De bovenstaande tekst klopt ook voor deze doelstelling. Na vaststellen van de handreiking kan klimaatadaptatie opgenomen worden in het DIOR. Daarnaast is het beleidsplan riolering vastgesteld door de raad. Hiermee hebben we wel een vastgesteld beleid waarvoor alles omtrent wateroverlast kan worden geborgd in het DIOR.	Deze doelstelling loopt volgens planning Voor deze doelstelling is het belangrijk om de gemeentelijke klimaatstresstesten volledig uit te voeren. In 2025 zijn de knelpunten en kwetsbaarheden in kaart gebracht en opgeleverd middels een storymap en digitale kaartviewer. In Q4-2025 en begin 2026 worden de risicodialogen gevoerd, zodat in beeld wordt gebracht welke locaties echt een risico zijn en waar we als gemeente wat aan moeten doen. Op deze wijze brengen we in kaart welke locaties aanpassingen nodig hebben, zodat zij voldoen aan het convenant en dus voldoende klimaatbestendig worden ingericht. Dit wordt verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. Locaties waar geen knelpunten of risico's zijn voldoen al aan het convenant en is op korte termijn geen actie nodig. De handreiking zoals hierboven is beschreven zal in 2026 ook opgenomen worden in het DIOR.

Vanaf 2026 wordt al het gemeentelijk vastgoed bij verbouwing of herinrichting klimaatadaptief gerealiseerd en voldoen aan het Covenant Klimaatadaptief Bouwen.	Het behalen van dit doel loopt volgens planning Met het aanpassen van de inspanning loopt dit doel weer op schema. De Nota Vastgoed is het juiste document om klimaatadaptatie in op te nemen. Zodra het concept af is, wordt deze voorgelegd aan het programma duurzaamheid. Daarnaast wordt gewerkt aan een handreiking klimaatbestendig bouwen. Indien deze wordt vastgesteld door het college, dienen in ieder geval alle ontwikkelingen op gemeentelijke grond (gemeentelijk eigendom) te voldoen aan klimaatbestendig bouwen waarmee deze doelstelling is behaald.	Vooralsnog lijkt deze doelstelling haalbaar Uitgaande dat de Nota Vastgoed er nu daadwerkelijk aan zit te komen, dan zal deze doelstelling haalbaar moeten zijn. Daarnaast loopt het traject van de handreiking klimaatbestendig bouwen en inrichten. Hiermee geven we uitwerking hoe wij als gemeente vinden dat een omgeving voldoende klimaatbestendig is ingericht. Deze handreiking is ook van toepassing op het eigen gemeentelijk vastgoed. Uit de klimaatstresstesten kan ook inzichtelijk worden gemaakt of er locaties zijn (gemeentelijk vastgoed) die onvoldoende klimaatbestendig zijn. Dit wordt dan meegenomen in de uitvoeringsagenda.
In 2030 is een versterking van de biodiversiteit te zien ten opzichte van 2024	Het behalen van dit doel loopt volgens planning De nulmeting van de biodiversiteit is afgerond. De resultaten zijn in april gedeeld met het college en de raad. Op basis van het advies uit dit rapport wordt nu ingezet op de inspanningen: • Beleidsregels en toetsingskader voor natuurinclusief bouwen opstellen. • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een transitie naar ecologisch beheer. Voor het vraagstuk omtrent ecologisch beheer loopt er nog een regionaal onderzoek. Met dit regionaal onderzoek wordt voor Zuidplas duidelijk welke kansen er liggen voor ecologisch beheer en wat de kosten zijn. Na ontvangst van dit onderzoek gaan we met beheer in gesprek om te kijken welke kansen er liggen voor ecologisch beheer, binnen de capaciteit en middelen die er momenteel beschikbaar zijn. Ook wordt gekeken hoe de informatie van de groenstructuurvisie hierin gebruikt kunnen worden, en wordt onderzocht of een interactieve kansenkaart opgesteld kan worden voor inwoners. De capaciteit en middelen bij BOR zijn wel een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te behalen. Vooralsnog hebben we de tijd en ruimte om dit doel te realiseren	Het behalen van dit doel loopt volgens planning Inmiddels zijn er al diverse inspanningen uitgevoerd die eraan bijdragen om deze doelstelling te behalen. Op basis van de biodiversiteit nulmeting en (landelijke) ontwikkelingen is gewerkt aan: • Vaststellen beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten gemeente Zuidplas 2025; • Transitie naar ecologisch beheer door de verplichting vanuit de gedragscode van stadswerk. BOR is dit verder aan het implementeren in het beheer van de openbare ruimte; • Opnemen van biodiversiteit en kwalitatief goed groen in nieuw beleid, zoals in de groenstructuurvisie. Voor 2026 zijn inspanningen opgenomen in de programmabegroting 2026-2029, zoals dat biodiversiteit wordt opgenomen in de herijking van de Omgevingsvisie; en er liggen inmiddels concept regels klaar voor het omgevingsplan. Op regionaal niveau loopt er nog een onderzoek naar ecologisch beheer. Dit is door wisselingen bij de ODMH wat vertraagd. Dit

		heeft verder geen invloed op de doelstelling van Zuidplas. Het is wel een mooie aanvulling zodra dit rapport beschikbaar is. Kanttekening blijft wel dat op dit moment wordt ingezet op het realiseren van gunstige omstandigheden zodat natuur een betere kans krijgt om zich te ontwikkelen en zo de biodiversiteit zich kan versterken. De natuur gaat altijd zijn eigen gang en in 2030 hopen we eerste tekenen te zien (in de monitoring) dat de genomen maatregelen bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Het is wenselijk om in 2027 een tussenmeting te doen van het meetnet. Na 2030 wordt dan iedere 5 jaar een meting uitgevoerd. Hier dient wel budget voor beschikbaar te worden gesteld.
--	--	--

2. Realisatie van inspanningen en resultaten

Status inspanningen energietransitie

Inspanning	Resultaten	Status zomernota 2025	Status najaarsnota 2025
Monitoring en als nodig herijking Regionale Energiestrategie bod van 0,435 TWh + Uitvoering geven aan de regionale energiestrategie door Zon op Veld, Zon op Dak en Zon op Infra	Wijzigen in Zomer 2025	Deze inspanning is niet rendabel en draagt onvoldoende bij aan de doelen. Monitoring en herijking is een van de kerntaken uit het klimaatakkoord. Hier wordt weinig aandacht aan besteed. Op lokaal niveau vindt al monitoring plaats op het halen van het collegedoeel. Dit gebeurt voor Zon op Veld en Zon op Dak. Op dit moment is Zuidplas bezig om in gesprek met ODMH de bereikte resultaten, projecten in pijplijn en ambities te integreren binnen het lokale monitoringssysteem. De bedoeling is dat er ook gestructureerde regionale monitoring komt om de voortgang ten opzichte van het regionale RES-bod te monitoren. Er worden gesprekken met de ODMH gevoerd over de mogelijkheid om de lokale monitoringssystemen in te zetten voor een regionaal monitoringssysteem. Hier is gemeente Waddinxveen de trekker van. Het is vooralsnog onduidelijk wat de planning van de RES op het regionale monitoringssysteem is. De monitoring van het regionale RES-bod maakt onderdeel uit van het RES Voortgangsdokument, welke de stand van zaken in het bereiken van	De inspanning draagt bij aan het doel. De ODMH heeft in september 2025 een volledige regionale monitoring opgezet. Met deze monitoring blijkt dat de RES MH in staat is om het afgesproken bod te realiseren binnen de gemaakte regionale afspraken. Hulp vanuit de provincie is daarbij niet nodig en ook niet wenselijk.

	Voortgangsdokument RES, 31 juni	de doelen in de regio weergeeft. Dit Voortgangsdokument dient op 1 juli 2025 bij NPRES te zijn ingediend. In juni 2025 wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het lokale, Zuidplas-aandeel binnen de RES-opgave. Hierin zal onder anderen de voortgang van Zon op Dak, Zon op Veld, en Zon langs infra worden behandeld. Op basis van de huidige inschattingen kan door middel van Zon op Dak tot 84% van het lokale RES-doel behaald worden, door Zon langs infra tot 15% en door Zon op Veld tot 46%. Potentieel zou dus 146% (0,141 TWh) van het lokale RES-doel behaald kunnen worden. Dit laat zien dat, mocht de regio het RES-doel niet halen, wij verwachten ons deel hiervan wel te halen.	Eind oktober/ begin november 2025 zal de raad een nieuwe raadsinformatienota ontvangen. In deze nota zal aangegeven worden dat de RES-regio met de staande regionale monitoring in staat zal zijn om het bod van 0,435 TWh zelfstandig te realiseren. De opgave vanuit de gemeente Zuidplas (0,141 TWh) is daarin meegenomen (LEUS).
Zon op Veld realiseren	Principebesluit ingediende initiatieven, Q2 2025 [Behaald] Vergunningverlening initiatief PZoV, Q1 2026	Deze inspanning loopt conform planning en draagt bij aan het doel. Binnen Zuidplas is er momenteel 1 initiatief, binnen het zoekgebied Moerkapelle-zuid, dat voldoet aan de randvoorwaarden van Programma Zon op Veld. Op 25-03-2025 is door het college een positief principebesluit genomen over het ingediende initiatief. De initiatiefnemer is aan zet om voor het project een vergunning aan te vragen. Vanuit de RES-organisatie wordt gekeken of het mogelijk is om met aanvullende maatregelen nieuwe initiatiefnemers alsnog te activeren. Een van de aanvullende mogelijkheden daarbij is het inzetten van het kwaliteitsbudget Energie in Natuur en Landschap. Dat budget kan financieel hulp bieden aan initiatiefnemers, die hun initiatief niet rendabel krijgen ten gevolge van de diverse kwaliteitseisen. Met behulp van het kwaliteitsbudget dat beschikbaar is voor de RES-regio kan met het realiseren van duurzame energieprojecten meteen ook de biodiversiteit verbeterd worden. In 2025 is er voor de gehele RES-regio  beschikbaar om dit te realiseren.	Conform de planning heeft het college in 2025 een principebesluit genomen over het initiatief dat door de gemeente Zuidplas is ontvangen voor het zoekgebied Moerkapelle-Zuid. Met dit besluit zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om het vergunningentrajec op te starten. De volgende stap ligt bij de initiatiefnemer, die nu aan zet is om een formele vergunningsaanvraag in te dienen. Zodra de aanvraag door de gemeente is ontvangen, kan het vergunningentrajec daadwerkelijk van start gaan. Aangezien de gemeente vooralsnog geen officiële aanvraag heeft ontvangen, is het niet haalbaar om het eerste kwartaal van 2026 een definitieve vergunning te verlenen. Parallel hieraan worden ambtelijk verkennende werkzaamheden verricht om de potentie van de

		Deze inspanning vraagt veel middelen in relatie tot de bijdrage aan het doel. Advies is voortaan kritischer te kijken welke samenwerking nodig is om doelen te bereiken.	resterende zoekgebieden voor de ontwikkeling van zon-op-veldprojecten te beoordelen.
Versnellingsaanpak Zon op dak	Start stimuleren op 20 grootste daken, Q2 2025 Communicatie- en participatieplan ZoD, Q2 2025	Deze inspanning loopt conform planning. Versnellingsaanpak Zon op Dak is vastgesteld en er is een opdracht vergeven om te starten met het stimuleren van opwek door zonne-energie op de 20 grootste daken. In Q2 2025 wordt een participatie en communicatieplan aan het college voorgelegd om vast te stellen. Hierna kan worden gestart met het participatietraject met de betrokken doelgroepen. Deze inspanning is rendabel en draagt goed bij aan de doelen. De inspanning vraagt relatief weinig inzet en heeft een grote bijdrage aan het RES-doel en het lokale doel van Zuidplas.	De uitvoering van deze inspanning verloopt conform planning. Het participatie- en communicatieplan is vastgesteld en de uitvoering hiervan is gestart. Naar verwachting wordt het uitvoerende deel van het participatietraject eind 2025 afgerond. Dit omvat een eindverslag met conclusies en aanbevelingen. Op basis van de uitkomsten van het participatietraject wordt eind 2025 tevens het plan van aanpak afgerond voor verdere stimulering van zonnepanelen in 2026. Daarnaast wordt ambtelijk verkend of samenwerking met een energieloket voor mkb-ondernemers mogelijk en wenselijk is. Dit energieloket biedt onafhankelijk advies aan ondernemers, onder andere over wettelijke verplichtingen en beschikbare financiële voordelen. Een eventuele samenwerking met het energieloket is kosteloos voor de gemeente.
pMIEK – provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat	Vaststellen pMIEK 2.0, Q1 2025 [Behaald] Bepalen lokale inzet pMIEK, Geen planning	Het is onduidelijk in hoeverre deze inspanning bijdraagt aan het doel of aan welk doel het bijdraagt. Het doel van de pMIEK 2.0, het op provinciale schaal bevorderen van de realisatie van de energie-infrastructuurprojecten, is een algemene ambitie en niet SMART geformuleerd. pMIEK 2.0 is op 7 april 2025 vastgesteld in de provinciale staten maar wat de rol van de gemeenten precies is, is nog niet duidelijk. Vooralsnog is er geen directe inzet nodig vanuit de gemeente op de uitvoering pMIEK. Vooralsnog pakt de provincie	De lokale inzet van Zuidplas is sterk afhankelijk van ontwikkelingen bij provincie en Rijk, waardoor deze nog niet definitief kan worden vastgesteld. De haalbaarheid van verdere inzet wordt momenteel beperkt door de hoge werkdruk van gemeenten als gevolg van lopende projecten op het gebied van opwek, warmte, netcongestie en netimpactanalyses.

		dit op. Het is mogelijk dat er in de loop van tijd onderwerpen naar boven komen waarbij de ambtelijke inzet vanuit Zuidplas wenselijk is.	In 2026 wordt gewerkt aan de voorbereiding van pMIEK 3.0, waarvoor aanvullende input van gemeenten wordt gevraagd. Tegelijkertijd is er behoefte aan extra ondersteuning vanuit Rijk en provincie, omdat gemeenten door de huidige werkdruk beperkt in staat zijn het bredere energiesysteem zelfstandig op te pakken. De gemeente kan haar inzet vaststellen zodra landelijke en provinciale kaders duidelijk zijn.
Verkenning benodigde aanpak verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen	Plan van aanpak: verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen, maart 2025	Deze inspanning ligt stil. Vanwege gebrek aan personeel wordt deze inspanning voor het plan van aanpak niet opgepakt. Daar waar deze inspanning overlapt met Zon op Dak wordt nog wel inspanning geleverd (zie inspanning: Versnellingsaanpak Zon op dak)	Deze inspanning ligt stil. Vanwege gebrek aan personeel wordt deze inspanning voor het plan van aanpak niet opgepakt. Daar waar deze inspanning overlapt met Zon op Dak wordt nog wel inspanning geleverd (zie inspanning: Versnellingsaanpak Zon op dak)
Onderzoeken energiebehoefte laadinfra en opstellen laadinfrabeleid en laadpalenplan	Ontwerpbesluit nieuwe laadpalen, Q1 2025 Behaald Verzamelbesluit, Q4 2025	Deze inspanning draagt bij aan het doel en loopt conform planning. In december 2024 zijn de nieuwe beleidsregels voor openbare laadinfrastructuur van elektrische voertuigen vastgesteld. Met de nieuwe beleidsregels kan de gemeente op basis van data en eigen inzicht zelf elektrische laadvoorzieningen aanvragen. Het verzamelbesluit voor de datagestuurde laadpalen wordt Q3 2025 gepubliceerd.	Deze inspanning draagt bij aan het doel en loopt conform planning. In december 2024 zijn de nieuwe beleidsregels voor openbare laadinfrastructuur van elektrische voertuigen vastgesteld. Met de nieuwe beleidsregels kan de gemeente op basis van data en eigen inzicht zelf elektrische laadvoorzieningen aanvragen. Het verzamelbesluit voor de datagestuurde laadpalen wordt Q4 2025 gepubliceerd.
Doorgaan met de regionale laadvisie en de plankaart	Vaststellen Regionale Laadvisie, Q1 2026	Deze inspanning is vertraagd maar draagt wel bij aan de doelstellingen. De regionale laadvisie heeft een tijd on hold gestaan. Er is door de gemeente Gouda begin 2025 een regionale trekker aangesteld. Volgens de nieuwe planning is de regionale laadvisie in Q4 2025 af en zal deze naar de raad ter vaststelling worden verzonden. De nieuwe concessie voor openbare laadvoorzieningen is geen onderdeel van de regionale laadvisie. Voor deelname aan een nieuwe concessie voor openbare laadvoorzieningen is een	Deze inspanning is vertraagd maar draagt wel bij aan de doelstellingen. De regionale laadvisie heeft een tijd on hold gestaan. Er is door de gemeente Gouda begin 2025 een regionale trekker aangesteld. Volgens de nieuwe planning is de regionale laadvisie in Q1 2026 af, en zal deze naar de raad ter vaststelling worden verzonden.

		geactualiseerde plankaart nodig. In 2024 is de plankaart geactualiseerd.	
Het uitwerken van een visie op verduurzaming van eigen mobiliteit en hoe dit raakt aan arbeidsvoorwaarden	Visie verduurzaming van eigen mobiliteit, datum onbekend Uitwerken gewenste maatregelen, 2025	Voor het opstellen van een visie op het verduurzamen van eigen mobiliteit is geen capaciteit beschikbaar bij HR. Er worden wel maatregelen getroffen om de eigen mobiliteit te verduurzamen maar er mist capaciteit om hier een visie voor op te stellen. De verduurzaming van eigen mobiliteit loopt via de herziening van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Door middel van een enquête zijn wensen opgehaald bij de collega's in dienst. In de zomer worden bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de arbeidsvoorwaarden met een positief effect op duurzaamheid, opnieuw onder de aandacht gebracht bij medewerkers. In de tussentijd wordt gewerkt aan gewenste maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan een verruiming van het bestaande fietsplan of eventueel een fietslease constructie. Hierover wordt in Q3 beslist. De nieuwe maatregel zal dan per 1 januari 2026 in moeten gaan.	Vanuit HR hebben wij geen informatie ontvangen over de status van deze inspanning.
Daar waar mogelijk het aanschaffen van duurzame voertuigen	Transitieplan verduurzaming wagenpark - datum onbekend Plan samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Rotterdam – datum onbekend	Deze inspanning loopt volgens planning en draagt bij aan het doel. Vanwege netcongestie kan alleen op kleine schaal verduurzaamd worden. Door een voordelige inruilactie is een oude vorkheftruck op gas omgeruild voor twee nieuwe elektrische vorkheftrucks. Hiernaast zijn ook 6 elektrische wijkteam auto's aangeschaft. Los van deze gevallen worden voertuigen nog steeds vervangen door voertuigen met hetzelfde brandstoftype. Een manier om dit te versnellen zou een vrijblijvende samenwerkingsovereenkomst kunnen zijn. Momenteel wordt verkend of een overeenkomst met gemeente Rotterdam haalbaar en wenselijk is. Uit eerste gesprekken lijkt het erop dat een leaseconstructie voordelig zou kunnen zijn. In dat geval zou Zuidplas op het moment van afschrijving een vervangend duurzamer voertuig leasen bij Rotterdam. Door schaalvoordelen en bestaande expertise bij Rotterdam zou dit ook het plaatsen van nieuwe laadpalen kunnen vergemakkelijken. Mocht dit inderdaad een wenselijke optie zijn, volgt hierover voor de zomervakantie een collegevoorstel.	De status op deze inspanning is ongewijzigd. Het plan voor de samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Rotterdam is ongewijzigd en wordt binnenkort ingediend bij de directie.

Status inspanningen warmtetransitie

Inspanning	Resultaten	Status zomernota 2025	Status najaarsnota 2025
Verkennen warmtenet Zuidplaspolder (ook wel WSO-samenwerking)	Indienen SWIG2 subsidie, Q1 2025 - Behaald Opleveren update Grand Design: mei 2025 - Behaald Besluit intentieovereenkomst regionaal warmtenet Oostland (RWO): mei 2025 - Behaald Besluit samenwerkings-overeenkomst (SOK) RWO en SOK Zuidplaspolder: Q3/Q4 2025 Afspraken commitment regionaal warmtenet Oostland: Q3/Q4 2025 Investeringsbesluit, Q4 2025	Inspanning loopt conform planning en draagt bij aan het doel. In het procesplan zijn twee proceslijnen opgenomen en de politieke besluitvorming is hier onderdeel van. De ene lijn betreft het warmtenet glastuinbouw en de andere proceslijn betreft het verkennen van een mogelijke aansluiting van de gebouwde omgeving. In 2025 zijn belangrijke ontwerpkeuzes en investeringsbesluiten aan de orde voor de ontwikkelaars in het project Noordpolder-Zuidplaspolder. De warmtenetbeheerder NetVerder vraagt om een commitment voor de realisatie van regionaal warmtenet Oostland binnen de gemeente Zuidplas. Het gesprek over een bijdrage is gestart. NetVerder vraagt vanuit haar rol verschillende subsidies aan. De aanvraag voor de SWIG1 is gehonoreerd. De aanvraag voor SWIG2 is Q1 ingediend. Daarnaast loopt een subsidietraject vanuit de Provincie Z-H. Het engineering traject en de onderhandelingen met de warmtecoöperatie (WaCo ZPP) lopen.	Investeringsbesluit Op dit moment vindt er door NetVerder een doorrekening plaats op het kunnen realiseren van een sluitende business case voor de Zuidplaspolder. Bij een sluitende business case kan een volgende grote stap (het maken van een detail ontwerp) gezet worden in de realisatie van het Zuidplaspolder warmtenet. Het investeringsbesluit zal mogelijk doorgeschoven worden naar Q1 in 2026. SOK RWO Het opstellen van een SOK RWO is met het afsluiten van het IOK RWO niet noodzakelijk. Het opstellen wordt daarom doorgeschoven naar Q3 of Q4 in 2026. De SOK heeft verder geen invloed op het bereiken van onderliggende doelstelling. SOK Zuidplaspolder De SOK Zuidplaspolder en de inhoud van deze SOK wordt momenteel ambtelijk bekeken en besproken, ook in samenhang van toegevoegde waarde van deze SOK in relatie tot de stand van zaken van dit project en de rol van de gemeente Zuidplas daarbinnen. Ook voor deze SOK geldt dat het ontbreken van deze SOK niet van invloed is op het bereiken van deze doelstelling.
Opstellen Uitvoeringsplannen Zuidplas aardgasvrij	Proces aanpak aardgasvrij, Q4 2025	Deze inspanning loopt op schema. Met een externe partij wordt het procesaanpak aardgasvrij bekeken en verduidelijkt. Om een beter beeld te krijgen van de huidige status en het startpunt vinden er meerdere interne sessies plaats met collega's die betrokken zijn	Procesaanpak aardgasvrij De voortgang van de procesaanpak aardgasvrij verloopt conform planning. Op 1 juni 2025 is de nieuwe projectleider gestart die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking van deze aanpak. Vanuit

	Opleveren handelingsperspectief, Q4 2025 Lange termijn participatie- en communicatiestrategie samenwerkingsproces Zuidplas aardgasvrij, Q4 2025	bij het proces. Daarnaast wordt er samen met deze partij gekeken hoe we de stakeholders kunnen betrekken bij de herziene aanpak en het aardgasvrij worden in Zuidplas. De vacature voor projectleider warmtetransitie is ingevuld. Op 1 juni 2025 start de nieuwe projectleider. Zij zal onder andere werken aan de herziene aanpak aardgasvrij. De eerste helft van 2025 stond in het teken van de verkenningsfase voor het handelingsperspectief. Alle vragen van inwoners die afgelopen jaren bij de gemeente zijn binnengekomen zijn verzameld om te beantwoorden in het handelingsperspectief. Dit wordt aangevuld met landelijke relevante informatie en relevante inbreng van collega's binnen én buiten team Duurzaamheid waarmee de verdere route wordt bepaald. In de tweede helft van 2025 wordt gewerkt aan de uitvoering en uitwerking van het handelingsperspectief. Hierbij werken we toe naar een betrouwbaar, toegankelijk en aantrekkelijk handelingsperspectief voor inwoners. Naar verwachting wordt het handelingsperspectief gepresenteerd voor het einde van 2025.	de ambitie van de gemeente om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, wordt samen met een externe partij een procesaanpak ontwikkeld die beter aansluit op de behoeften van stakeholders, met oog voor de diverse doelgroepen onder inwoners. De uiteindelijke aanpak wordt afgestemd met netbeheerders en woningcorporaties. Binnen deze kaders wordt inwoners informatie en stimulans geboden over mogelijke oplossingen, zonder dat de gemeente een voorkeursoplossing presenteert. De oplevering van de procesaanpak staat gepland in het vierde kwartaal van 2025. Handelingsperspectief De ontwikkeling van het handelingsperspectief verloopt eveneens volgens planning. De huidige fase richt zich op de uitvoering en uitwerking van het handelingsperspectief, waarbij een communicatiebureau het proces ondersteunt. Het handelingsperspectief biedt inwoners praktische handvatten voor de overstap naar alternatieve warmtevoorzieningen zonder aardgas. Het doel is om duidelijke, concrete en toegankelijke informatie te verstrekken over duurzame oplossingen voor woningen. De informatie wordt zowel online als fysiek beschikbaar gesteld en is afgestemd op alle relevante doelgroepen. Met de lange termijn participatie- en communicatiestrategie samenwerkingsproces Zuidplas aardgasvrij wordt gestart na definitieve levering van de procesaanpak aardgasvrij (november 2025).
Gemeentebrede communicatie	Continueren Duurzaam Bouwloket in 2025	Momenteel zitten we nog steeds in dezelfde fase waarbij gesprekken gevoerd worden met het	Er is een definitief akkoord voor een voortzetting van de samenwerking met het energieloket in 2026 en

	Nieuw contract energieloket voor 2026, Q4 2025	energieloket. In verband met personele wisselingen is er een kans dat dit verschoven wordt tot na de zomer. Tot die tijd gaan we er nog steeds van uit dat we een nieuw contract aangaan voor 2026.	2027. De inspanning wordt op tijd uitgevoerd en is haalbaar. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwde en actuele website voor het energieloket, onder de nieuwe naam <i>energielokketten.nl</i>. Zodra deze website live gaat, wordt er een gerichte communicatiestrategie ingezet om inwoners hierover tijdig en adequaat te informeren.
Voor 10 VvE's wordt door een adviserende partij verduurzamingsadvies aangeboden om ondersteuning te bieden aan het verduurzamingsproces.	10 VVE's van duurzaamheidsadvies voorzien, 2025 Helderheid over aanpak en nieuwe communicatiestrategie, Q2 2025	Deze inspanning loopt niet volgens planning en er wordt een nieuwe aanpak opgesteld. Er is ruimte om 10 VvE's te helpen met het inzichtelijk maken van de eigen situatie. Hierbij worden de advieskosten vergoed door de gemeente. In 2025 wordt het aanbod opnieuw bij de VvE's onder de aandacht gebracht. De huidige aanpak leidt tot onvoldoende VvE's die gebruik maken van het advies. Daarom wordt gestart met een pilot met oudere VvE's waar verduurzaming meer impact kan hebben. Ook worden de afgehaakte VvE's uit 2024 benaderd om hun feedback op te halen en de aanpak verder te verbeteren.	Deze inspanning verloopt momenteel niet volgens planning. Er is daarom een nieuwe aanpak opgesteld, inclusief een herziene planning. Er is ruimte om 10 VvE's te helpen met het inzichtelijk maken van de eigen situatie. Per 2025 zijn 5 VvE's voorzien van verduurzamingsadvies. De voorgaande aanpak heeft geleid tot onvoldoende VvE's die gebruik maken van het advies. Om dit te verbeteren, is per november 2025 gestart met een pilot gericht op oudere VvE's, waar de potentie voor verduurzaming groter is. Deze pilot loopt tot uiterlijk medio 2026. De pilot bestaat uit twee fasen: - Fase 1 (uiterlijk eind 2025): intakegesprekken en het verstrekken van verduurzamingsadvies. - Fase 2 (2026): verdieping advies en begeleiding bij de aanvraag van middelen.
Actualiseren beleid bodemenergie	Geactualiseerde Bodemenergiebeleid, datum onbekend	Deze inspanning wordt momenteel niet opgepakt. Middengebied heeft bodemenergiebeleid specifiek voor het Middengebied wel opgepakt. Er wordt binnen het team gekeken of er capaciteit vrijgemaakt kan worden om dit op te pakken.	Deze inspanning is vertraagd. Middengebied heeft bodemenergiebeleid specifiek voor het Middengebied wel opgepakt. Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het al dan niet actualiseren van het bodemenergiebeleid

			gemeentebreed in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. Op basis van de uitkomsten wordt een advies opgesteld over het wel of niet aanpassen van het beleid. Indien uit het advies blijkt dat actualisatie nodig is, kan hiervoor extern een opdracht worden uitgezet. Met de beschikbare capaciteit en de lage prioriteit kan er op dit moment geen concrete datum worden gegeven voor deze inspanning
Verkennen elektrolyser als warmtebron	B&W en RIN Procesopdracht elektrolyser, Q2 2025 • Behaald Regioadvies van provincie waar Zuidplas op heeft geadviseerd, Q4, 2025	Deze inspanning loopt conform planning. De gemeente is nauw betrokken bij het programma 'Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ) en heeft de benodigde input geleverd voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We verkennen de mogelijkheden en kansen qua inpassing van de hiervoor benodigde ontwikkelingen met als doel om de vrijgekomen warmte te benutten voor een toekomstig warmtenet ten behoeve van het glastuinbouwgebied en eventueel voor de rest van de gebouwde omgeving. In Q2 2025 wordt de procesopdracht vastgesteld en voorgelegd aan B&W. Er wordt ook een Raadsinformatienota voorgelegd aan de Raad over de procesopdracht elektrolyser. De start loopt iets achter op planning, maar eindmijlpaal blijft staan.	Deze inspanning loopt conform planning. De gemeente is nauw betrokken bij het programma 'Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ) en heeft de benodigde input geleverd voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We verkennen de mogelijkheden en kansen qua inpassing van de hiervoor benodigde ontwikkelingen met als doel om de vrijgekomen warmte te benutten voor een toekomstig warmtenet ten behoeve van het glastuinbouwgebied en eventueel voor de rest van de gebouwde omgeving. In Q4 2025 wordt een Raadsinformatienota voorgelegd aan de Raad over het regioadvies en de conclusie van de verkenning.
Aanpak energiearmoede	Start waterzijdig inregelen in woningen wooncorporaties, Q1 2025 • Behaald	Deze inspanning loopt volgens planning. De afspraken voor middelgrote maatregelen zijn ingepland en het Regionaal Energieloket is bezig met de bezoeken om waterzijdig in te regelen.	De inspanning is vertraagd. Er deden minder bewoners mee dan verwacht en dus is er in overleg met de woningcorporaties besloten meer adressen aan te schrijven. De actie loopt door tot de doelen zijn behaald, naar verwachting Q4 2025

	In 88 woningen zijn maatregelen getroffen tegen energiearmoede, Q4 2025		
In samenwerking met een intermediair worden huishoudens bereikt die subsidie krijgen voor het (laten) uitvoeren van een isolatiemaatregel. Streven is om 371 huishoudens te bereiken. (Aanpak Isolatie)	Start Europese aanbesteding, Q1 2025 - Behaald Opdracht gegund, Q2 2025 - Behaald Communicatieplan subsidie isolatieaanpak, Q2 2025 B&W besluit gemeentelijke subsidie isolatieaanpak, Q3 2025	De inspanning is vertraagd. De aanbesteding is gegund. Vanwege de hoogte van het bedrag van de opdracht hoeft deze niet door het College goedgekeurd te worden. De gemeentesecretaris kan hiervoor tekenen. Na het gunnen van de opdracht duurt het in verband met de nota van inlichtingen in ieder geval 3 maanden tot de aanpak kan beginnen. Na het goedkeuren van een subsidieverordening kan de aanpak gemeentelijke subsidie isolatieaanpak starten door middel van een B&W besluit. Nu de opdracht is gegund zal met de uitvoerende partij ook een communicatieplan worden uitgewerkt.	De inspanning loopt volgens planning, op 13 oktober liggen de subsidiebeleidsregels voor in het college. Direct na goedkeuring start de actie. In eerste instantie om 371 woningen te isoleren.
In 2027 is een Soort Management Plan opgesteld	Presentatie Quickscan, Q1 2025 Behaald Start aanbesteding uitvoering SMP, Q2 2025 Gunnen opdracht SMP, Q4 2025 Eindrapportage SMP, 2026	Deze inspanning is iets vertraagd. De Quickscan is afgerond en gepresenteerd aan de wethouder, collega's en stakeholders. Om het proces tot de aanbesteding soepel te laten verlopen wordt de Quickscan besproken met de Omgevingsdienst Haaglanden. Samen met Inkoop wordt bekeken hoe de aanbesteding, gelet op het beperkte aantal marktpartijen, het best in de markt gezet kan worden. De planning voor het starten met de aanbesteding en het gunnen van de opdracht voor het SMP is verplaatst naar Q2 2025. Vanwege de aard van het SMP – het meten van o.a. nestjes in verschillende jaargetijden – duurt de uitvoering hiervan minimaal een jaar.	De inspanning is iets vertraagd, maar draagt wel bij aan de doelstelling. Vanwege de constant veranderende regels van ODH en de daarmee samenhangende kosten heeft het geduurd voordat de begroting rond was. Op dit moment wordt door inkoop gewerkt aan Vrijwillige Transparantie zodat wij het aanbestedingstraject kunnen overslaan. De gunning zou dan nog dit jaar kunnen waardoor wij volgend jaar kunnen starten met meten.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	Duurzaamheid opnemen in nota vastgoed en opnemen in MJOP(/Nota Vastgoed), Q1 2026	De planning is dat de nota vastgoed in Q4 naar de raad gaat. Van Vastgoed hebben wij verder geen informatie ontvangen over de status van deze inspanning.	De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed wordt geïntegreerd in de Nota Vastgoed, die in januari 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Na goedkeuring zal de verdere uitwerking en implementatie plaatsvinden in

			afstemming met het team Duurzaamheid, zodat de maatregelen optimaal aansluiten bij de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. In dit kader is reeds gestart met de aanbestedingsprocedure voor het eerste gebouw, De Batavier. De uitvoering hiervan wordt voorzien in het eerste of tweede kwartaal van 2026. Met deze stap wordt een concrete bijdrage geleverd aan de reductie van de CO₂-uitstoot en aan de verdere verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
--	--	--	---

Status inspanningen klimaatbestendigheid en biodiversiteit

Inspanning	Resultaten	Status zomernota 2025	
Het vastleggen van het Convenant Klimaat adaptief bouwen in gemeentelijk beleid in 2025	Monitoringssysteem en plan van aanpak, Q3 2025 Opstellen handreiking klimaatbestendig bouwen en testen op bruikbaarheid, Q4 2025	Monitoringssysteem en plan van aanpak Voor de monitoring van biodiversiteit wordt advies opgevraagd bij Naturalis. De verwachting is nog steeds dat dit in Q3 opgeleverd kan worden. De monitoring van klimaatbestendigheid zal rusten op de uitkomsten van de stresstesten die eind juni worden opgeleverd. Hiervan wordt ook verwacht dat Q3 haalbaar is. Opstellen handreiking klimaatbestendig bouwen Door middel van een integrale aanpak wordt de handreiking uitgebreid met een toetsingskader voor klimaatbestendig bouwen. Hier worden komende weken stappen in gemaakt, waarna afstemming plaats gaat vinden met de	Deze inspanning is voor 2025 niet haalbaar. Inspanning is aangepast in de programmabegroting 2026-2029 Door ontwikkelingen in het proces bij de RvS tussen Cortelande en HHSK is het niet wenselijk om gemeentelijk beleid voor klimaatadaptatie op te stellen. Zie hiervoor ook de toelichting in de doelstelling. De inspanning is in de programmabegroting aangepast naar: <i>Opstellen van de handreiking klimaatbestendig bouwen en ontwerpen inclusief toetsingskader</i>. Hiermee ronden we de handreiking af wat ook bij zal dragen aan de doelstelling.

	Vaststellen klimaatadaptatiebeleid door Raad, Q3 2025	wethouder. Bij akkoord om dit verder op te stellen, is het doel om eind 2025 de handreiking en het toetsingskader vast te laten stellen door het college. Vaststellen klimaatadaptief beleid door de raad Deze inspanning wordt niet uitgevoerd. De bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen ligt bij het college. Met het vaststellen van de handreiking en toetsingskader door het college, wordt het doel bereikt en hebben we een basis om klimaatadaptatie op te nemen in het omgevingsplan.	Opstellen handreiking klimaatbestendig bouwen De handreiking is inmiddels ver gevorderd en zal begin 2026 kunnen worden afgerond. Wel zijn we nog aan het onderzoeken hoe het toetsingskader eruit komt te zien. Dit is nieuw en nog bij weinig gemeenten beschikbaar (waardoor we dus ook geen goede voorbeelden hebben). Vanuit de provinciale verordening ontstaat de verplichting dat iedere ontwikkeling moet gaan voldoen aan het convenant klimaatadaptief bouwen. Dit maakt dat het niet nodig is om echt beleid vast te stellen. Met de handreiking geven we als gemeente invulling aan de verplichting vanuit de provinciale verordening. Komende tijd wordt onderzocht wat hier de beste strategie in zal zijn. Zie hiervoor ook de uitleg onder de doelstelling.
	Opnemen klimaatadaptief bouwen in DIOR, Q4 2025	Klimaatadaptief bouwen implementeren in de werkprocessen De opdracht die Ruimtelijke ordening heeft gegeven om klimaatadaptatie op te nemen in hun werkprocessen, heeft geleid tot een toetsingskader. Dit toetsingskader is in concept gereed en de keuze is gemaakt om deze samen te voegen met de handreiking klimaatbestendig bouwen. Op deze manier ontstaat er een integraal document waarmee gewerkt kan worden.	De handreiking zal voor alle collega's en initiatiefnemers inzichtelijk maken aan welke eisen voor een klimaatbestendige gemeente moet worden voldaan. Hierin staan ook voorbeelden van inrichtingsmaatregelen die we als gemeente kunnen (en willen) nemen. Samen met de klimaatstresstesten geeft dit een mooi beeld van waar en welke maatregelen nodig zijn om voldoende klimaatbestendig te zijn ingericht.
	Het convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in werkprocessen van ruimtelijke ordening, incl. omgevingsplan, 2025	Uiteindelijk wordt het concept handreiking inclusief toetsingskader ook getoetst bij de collega's van gebiedsontwikkeling en BOR.	
	Het convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in werkprocessen van gebiedsontwikkeling, 2025		
	Beleidsplan, richtlijnen en handelingsperspectief Eisen om te verwerken in DIOR Handelingsperspectief, Q4 2025		

Klimaatbestendig bouwen en inrichten meenemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties	Afspraken zijn verwerkt in prestatieafspraken, Q4 2025 Behaald	Deze inspanning is behaald. Conform planning. Klimaatadaptatie is opgenomen in de raamovereenkomst met de woningcorporaties. Vanuit de raamovereenkomst worden elk jaar prestatieafspraken gemaakt. Voor 2025 is in de prestatieafspraken opgenomen dat woningcorporaties meedoen met de participatie tijdens de klimaatstresstesten. Door de stappen vanuit de eerste inspanning (beleid vaststellen) gaat klimaatadaptatie ook gelden voor nieuwbouwprojecten. Ieder jaar als de prestatieafspraken worden vastgelegd, wordt klimaatadaptatie meegenomen.	Behaald Prestatieafspraken Er is goed contact met de woningcorporaties om de gemaakte afspraken voor klimaatadaptatie na te komen. Ze worden actief betrokken bij de klimaatstresstesten.
Stimuleren van klimaatbestendige schoolpleinen vanaf 2024	Opnemen voorziening klimaatbestendige schoolpleinen in geactualiseerde Fingel, Q2 2025	Voorziening klimaatbestendige schoolpleinen De inspanning loopt in principe volgens planning. De concept voorziening regels liggen klaar en volgt de verdere planning van de Fingel die in oktober 2025 wordt vastgesteld. Gekeken wordt of we de resultaten van de klimaatstresstesten (die eind mei volgen) nog kunnen gebruiken om met deze voorziening meer te sturen.	Behaald Voorziening klimaatbestendige schoolpleinen De voorziening is opgesteld en aangeleverd bij de collega's van onderwijs om op te nemen in de Fingel. Hiermee hebben we vanuit het programma onze inspanning geleverd en afgerond. Ik begreep dat het nog niet duidelijk is of het gaat lukken de Fingel nog dit jaar vast te stellen. Dit traject loopt echter buiten ons en het programma om.
Uitvoeren van de gemeentelijke stresstesten in 2025	Uitvoeren stresstest Q1 2025 Afsluiten stresstest, uiterlijk Q4 2026	Uitvoeren klimaatstresstesten De inspanning voor het uitvoeren van de stresstesten volgt vanuit het DPRA. Elke gemeente heeft tot en met 2027 de tijd om de stresstesten volledig uit te voeren. De stresstesten bestaan uit vier stappen:	Uitvoeren klimaatstresstesten De inspanning voor het uitvoeren van de stresstesten volgt vanuit het DPRA. Elke gemeente heeft tot en met 2027 de tijd om de stresstesten volledig uit te voeren. De stresstesten bestaan uit vier stappen:

		1. Uitvoeren klimaatstresstesten 2025; 2. Uitvoeren risicodialogen 2026; 3. Opstellen adaptatiestrategie (2026-2027) 4. Opstellen uitvoeringsagenda (2026-2027). De uitvoering van de klimaatstresstesten loopt op schema. Op regionaal niveau worden de resultaten van de klimaatstresstesten eind mei 2025 opgeleverd. De verdieping met de lokale klimaatstresstesten wordt in juni 2025 opgeleverd. Daarnaast loopt er momenteel een participatie door middel van een bewoners-enquête. De resultaten van de participatie worden meegenomen in de oplevering van juni 2025. Communicatie- en participatieplan bewonersenquête Q2-2025 De communicatie- en participatie strategie (Z25.000620) inclusief de participatienota (Z25.000621) zijn vastgesteld door het college. De participatie loopt tot half mei 2025, waarna de resultaten worden meegenomen in de resultaten van de klimaatstresstesten door middel van een storymap. De oplevering van de klimaatstresstesten is in kaart gebracht welke knelpunten en kwetsbaarheden er in de gemeente zijn, zodat we gericht kunnen inzetten wat nodig is om deze locaties klimaatbestendig in te richten (en hiermee te laten voldoen aan het convenant klimaatadaptief bouwen (doelstelling)). Risicodialogen Q3-Q4 2025	1. Uitvoeren klimaatstresstesten 2025 (behaald); 2. Uitvoeren risicodialogen 2026 (gestart); 3. Opstellen adaptatiestrategie (2026-2027) 4. Opstellen uitvoeringsagenda (2026 – 2027) Klimaatstresstesten (behaald) De eerste stap, het uitvoeren van klimaatstresstesten in 2025 is afgerond. Het college en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd (B 1883). Inwoners zijn geïnformeerd via de gemeentelijke pagina. https://www.duurzaamzuidplas.nl/resultaten-inwonersenquête-klimaatstresstesten-zichtbaar-in-storymap-zuidplas Risicodialogen 2026 Gestart wordt met het uitvoeren van de risicodialogen. De eerste stap, het in kaart brengen van echt risico locaties wordt momenteel uitgevoerd. Streven is om in 2025 nog te starten met de gesprekken met externe stakeholders (HHSK, GGD, Veiligheidsregio, woningcorporaties en bedrijventerreinen). De eerste contacten zijn hier inmiddels voor gelegd. De planning van deze inspanning loopt tot Q1 2026. De verwachting is dat dit vooralsnog gehaald kan worden. Communicatie- en participatieplan bewonersenquête (behaald) De resultaten van de bewonersenquête zijn inmiddels beschikbaar gesteld via een storymap en via de nieuwsbrief en de website duurzaam
--	--	--	--

	Risicodialoog Q3 2025 t/m Q1 2026 Klimaatadaptatiestrategie/beleid Q4 2025 Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, 2026	Na oplevering van de resultaten van de klimaatstresstesten en de storymap wordt gestart met de risicodialogen. Op dit moment wordt het communicatie- en participatieplan hiervoor uitgewerkt ter voorbereiding op de risicodialogen. Adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Hier wordt aan gestart zodra de risicodialogen zijn afgerond. Vermoedelijk wordt hier op ingezet in 2026 en 2027.	Zuidplas gedeeld met inwoners. Hiermee is de participatie afgerond. Adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Hier wordt aan gestart zodra de risicodialogen zijn afgerond. Vermoedelijk wordt hierop ingezet in 2026 en 2027.
Convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van alle gebouwen	Eisen convenant zijn verwerkt in (D)MJOP, datum onbekend Vaststellen Nota Vastgoed, Q1 2026	Aanpassen inspanning in Zomernota 2025 In de zomernota 2025 is een voorstel gedaan om deze inspanning aan te passen. De Nota Vastgoed is het juiste instrument om klimaatadaptatie in te laten landen. De MJOP's gaan meer over technisch onderhoud van het vastgoed. Vaststellen Nota Vastgoed Klimaatadaptief bouwen gaat onderdeel uitmaken van de Nota Vastgoed welke in Q3-2025 wordt opgeleverd. Zodra klimaatadaptatie hierin is opgenomen, dient al het gemeentelijk vastgoed hieraan te voldoen. Dit maakt de inspanning haalbaar voor 2026.	Vaststellen nota Vastgoed In januari wordt de Nota Vastgoed ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Er is tot nu toe nog geen uitvraag gedaan bij Duurzaamheid om hierin mee te lezen. Er is hierdoor geen garantie dat deze inspanning (en de doelstelling) behaald kan worden). De inspanning loopt buiten het programma.
Nulmeting biodiversiteit	Rapport nulmeting, januari 2025 • Behaald RIN nulmeting, Q1 • Behaald	Rapportage biodiversiteit nulmeting, januari 2025 De resultaten van de biodiversiteit nulmeting zijn in Q1-2025 opgeleverd. Met een informatienota zijn de resultaten gedeeld met college en de raad (Z25.000638), waarbij ook is benoemd welke inspanningen volgen uit de resultaten van de biodiversiteit nulmeting, welke opgenomen zijn in de programmabegroting 2025-2028. Hiermee	Behaald Rapport biodiversiteit nulmeting Deze inspanning is in Q1-2025 afgerond. Inmiddels is ook hierover gecommuniceerd via de gemeentelijke website. https://www.zuidplas.nl/biodiversiteit-nulmeting-hoe-staan-we-ervoor-in-gemeente-zuidplas.

	Opstellen gemeentelijk beleid om biodiversiteit te versterken, onduidelijk; op zijn vroegst 2026 Transitie naar een ecologisch verantwoord beheer en inrichting om wet natuurbescherming soorten te versterken in 2026	is de inspanning voor het opstellen van de biodiversiteit nulmeting afgerond. Opstellen gemeentelijk beleid De kansen om de biodiversiteit te versterken worden verder uitgewerkt in beleidsregels inclusief toetsingskader voor natuur inclusief bouwen. Onderzocht wordt hoe de kansen om de biodiversiteit te versterken kunnen worden meegenomen in lopende trajecten, bijvoorbeeld bij het opstellen van de groenstructuurvisie en in beheer van de openbare ruimte. Transitie naar ecologisch beheer Inmiddels is het advies van de biodiversiteit nulmeting ontvangen. We zijn nog in afwachting van het advies van het regionaal biodiversiteit beheer rapport. Nadien kan deze inspanning verder worden uitgewerkt. Het is onduidelijk of deze inspanning haalbaar is. Door de bezuinigingen op BOR, zijn er weinig middelen en capaciteit beschikbaar om deze inspanning te realiseren. Na ontvangst van het regionaal adviesrapport wordt gekeken welke kansen er liggen binnen de capaciteit en middelen die er op dit moment zijn. Echter, het aanpassen van beheer is wel de belangrijkste stap in het behalen van de doelstelling (versterken van de biodiversiteit in 2030).	Opstellen gemeentelijk beleid De beleidsregel voor natuurinclusief bouwen en inrichten is in september 2025 vastgesteld door het college. Verder wordt onderzocht hoe de kansen om de biodiversiteit te versterken kunnen worden meegenomen in lopende trajecten, zoals de groenstructuurvisie en beheer van de openbare ruimte. Inmiddels wordt het rapport steeds vaker opgevraagd door projectleiders binnen de gemeente om de kansen mee te nemen in lopende projecten, bijvoorbeeld in opgave restveengebied. Transitie naar ecologisch beheer Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de gedragscode van Stadswerk, waardoor ecologisch beheer standaard dient te worden toegepast in het beheer van groen in de gemeente. De collega's van BOR zijn, samen met een ecooloog, bezig om ecologisch beheer verder uit te breiden over de gemeente zodat voldaan wordt aan de eisen vanuit de gedragscode. Het regionaal onderzoek loopt nog. Door het vertrek van de ecooloog bij de ODMH, loopt dit regionaal onderzoek wat vertraging op. Dit heeft verder geen effect op deze inspanning.
Opstellen van een participatie- en communicatiestrategie biodiversiteit in 2025	RIN communicatiestrategie, Q2 2025	Communicatieplan biodiversiteit Het college en de raad zijn in april 2025 geïnformeerd over de resultaten van de biodiversiteit nulmeting.	Communicatieplan biodiversiteit De resultaten van de biodiversiteit nulmeting zijn inmiddels online gedeeld op de website van duurzaam Zuidplas.

		De resultaten moeten zowel intern als extern gedeeld worden en beschikbaar zijn. Daarom zijn de resultaten intern gepresenteerd en verspreid onder collega's. Via een communicatieplan zal nog onderzocht worden hoe de resultaten van de nulmeting verder intern gebruikt kan worden in projecten. Waar mogelijk worden de resultaten al meegegeven in producten, zoals in de groenstructuurvisie en natuurinclusief bouwen. Op het gebied van externe communicatie wordt er door middel van een participatietraject op informatief niveau gekeken hoe inwoners op de hoogte gehouden kunnen worden van de ontwikkelingen rondom deze inspanning, wat dit voor hen betekent en hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. De stappen die hiervoor gezet worden zijn terug te vinden in het hiervoor bedoelde communicatie- en participatieplan biodiversiteit 2025-2030 die op moment van schrijven (mei) wordt opgesteld.	Op dit moment lopen er twee trajecten. • Voor interne communicatie wordt er een plan uitgewerkt zodat alle collega's op de hoogte zijn dat er een beleidsregel voor natuurinclusief bouwen en inrichten is vastgesteld. Hier worden de eerste acties ook al voor uitgezet. • Ook loopt er een traject voor externe communicatie over biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Dit traject wordt momenteel verder uitgewerkt door de communicatieadviseur. De communicatie en participatie rondom biodiversiteit is een traject dat vraagt om flexibiliteit. Ieder moment wordt goed gekeken wat op welk moment het beste kan worden gecommuniceerd en de strategie wordt hier dan ook steeds op aangepast.
Natuur inclusief ontwikkelen maakt deel uit van nieuwe projecten in 2026	Handreiking natuur inclusief ontwikkelen Eisen zijn meegenomen in omgevingsplan Q4 2025	Beleidsregels natuurinclusief bouwen De uitvoering van deze inspanning is naar voren gehaald en wordt uiterlijk in Q3-2025 aangeboden aan het college. De opdracht is uitgezet en hiermee loopt de inspanning op schema. Na vaststellen van de beleidsregels is deze inspanning behaald, wat een belangrijke stap is het behalen van de doelstelling om in 2030 een versterking te zien van de biodiversiteit. Omgevingsplan Na vaststellen van de beleidsregels, wordt onderzocht hoe deze regels opgenomen worden	Behaald Beleidsregel natuurinclusief bouwen De beleidsregel inclusief het toetsingskader voor natuurinclusief bouwen en inrichten gemeente Zuidplas 2025 is op 30 september 2025 door het college vastgesteld. De beleidsregel is inmiddels ook gepubliceerd op de pagina van de overheid en via een informatienota gedeeld met de gemeenteraad (B1888). Hiermee is de inspanning afgerond. Omgevingsplan De conceptregel voor het omgevingsplan is afgerond. De regel voor natuurinclusief bouwen

		in het omgevingsplan. RO is nauw betrokken bij het opstellen van de beleidsregels.	wordt zo snel als mogelijk opgenomen in het omgevingsplan. Deze inspanning is opgenomen in de programmabegroting 2026-2029 en staat op de lijst bij het team dat over het omgevingsplan gaat.
--	--	--	---

3. Gebruiken en verbruik van middelen:

Op dit moment kan er geen uitspraak gedaan worden over de middelen voor het programma Duurzaamheid. Het programma heeft te maken met dubbele doorbelasting door inhuurkosten voor zwangerschapsverloven waarvoor wij zelf geen compensatie ontvangen.

4. Beoordeling voortgang

Hieronder vindt u een korte beoordeling van de voortgang op alle doelen en inspanningen

1. Doelen

Van de 12 operationele doelen hebben er op dit moment 6 de status 'goed', 3 'matig', en 1 'zorgwekkend'. Over 2 operationele doelen kan geen voortgang worden gerapporteerd door ontbrekende informatie. De status van de doelen 'Het behalen van: 1. regionaal doel 0,435 TWh duurzame elektriciteit 2. Lokaal doel 0,097 TWh duurzame elektriciteit' en 'Vanaf 2026 voldoen alle nieuwbouwprojecten minimaal aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en aan de wettelijke verplichtingen' zijn veranderd van goed naar matig. Het doel 'In 2030 zijn 3.600 woningen aardgasvrij gemaakt' liep in de vorige rapportage ook niet volgens planning. Het doel 'In 2026 hebben we zicht op de verduurzamingsopgave van ondernemers en hun bedrijven. We hebben een plan opgesteld om ze klimaatneutraal te maken richting 2050' blijft net als in de vorige voortgangsrapportage sterk achterlopen.

2. Inspanningen

Er is momenteel 1 inspanning met een zorgwekkende afwijking 'Verkenning benodigde aanpak verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen'. Net als bij de vorige rapportage is er op dit moment geen capaciteit voor deze inspanning. Er zijn momenteel 6 inspanningen met een lichte afwijking. Voor de inspanning 'Voor 10 VvE's wordt door een adviserende partij verduurzamingsadvies aangeboden om ondersteuning te bieden aan het verduurzamingsproces' geldt dat hier net als de vorige keer een afwijking is in de planning, maar er wel is gestart met een nieuwe aanpak. De status van de inspanning 'Aanpak Energiearmoede' is sinds de vorige rapportage veranderd van 'goed' naar 'matig' vanwege een tegenvallend aantal deelnemers. De status van de inspanning 'Het vastleggen van het Convenant Klimaat adaptief bouwen in gemeentelijk beleid in 2025' is in navolging van het doel veranderd van 'goed' naar 'matig' door ontwikkelingen in het proces bij de RvS tussen Cortelande en HHSK.

3. Gebruik en verbruik van de middelen

Er kan op dit moment geen beoordeling worden gegeven over het gebruik en verbruik van de middelen.

4. Risico's

1. Risico's

Wat zijn de grootste risico's?

Nr.	Datum	Omschrijving risico's	Maatregel
1	26-05-2025	Tekort aan capaciteit zorgt ervoor dat zaken niet opgepakt kunnen worden en leidt tot vertragingen. Ondanks de aanwinst van een nieuwe projectleider warmtetransitie per 1 juni is er nog steeds sprake van een tekort aan capaciteit binnen het team	Maatregelen bespreken met de nieuwe ambtelijk opdrachtgever.

		Duurzaamheid. De komende tijd zijn er 5 personele wisselingen. Dit zorgt voor beperkte capaciteit en [redacted] veel tijd en energie.	
2	26-05-2025	Risico's gemeentelijke uitvoering Het risico dat de +- [redacted] CDOKE middelen niet opnieuw beschikbaar komen voor 2026 en later bestaat nog steeds. Eind mei stuurt het KGG een brief waaruit duidelijk moet worden of de gemeenten na 2026 wel of niet op deze CDOKE middelen kunnen rekenen.	Voor nu geen actie.
3	17-10-2024	Politieke doelen en resultaten niet behalen, doordat het programma als kaartenhuis in elkaar stort. Om een programma te kunnen draaien is 'goed' personeel nodig, een balans tussen senioriteit en beginners en een stabiel team. Aan deze voorwaarde wordt <u>niet</u> voldaan. Het afgelopen 1,5 jaar hebben 14 personele wissels plaats gevonden. Dit trekt een wissel op het team. Daarnaast worden veel gaten dicht gelopen door de programmamanager en de programmastrateeg Het enthousiasme om mensen in te werken neemt af en teamgevoel neemt af. Risico hiervan is ook dat mensen geneigd zijn om te vertrekken.	Voorgesteld wordt om niet meer in te huren voor het project Zuidplas aardgasvrij en pas met het project verder te gaan als er vast personeel is geworven. Alle functies ontbreken: projectleider, junior projectleider en communicatie-en participatieadviseur Verkend wordt om de rollen projectleider/procesregisseur Zuidplas aardgasvrij en WSO te combineren om aantrekkelijker te maken in de werving Inzet op talentontwikkeling bestaand personeel -> CLM ->DT Structureel probleem -> organisatievraagstuk -> andere manieren van werving, functies aantrekkelijker maken -> DT
4	17-10-2024	Onprettige samenwerkingscultuur in de regio heeft effect op belastbaarheid van personeel. Is groot risico op ziekteverzuim of vertrek van personeel (zie ook ontwikkelingen en samenwerking in de regio).	Programmamanager en programmastrateeg hebben alle interventies gedaan die er voor handen waren. Er zijn diverse signalen en interventieadviezen voorgelegd bij directie en wethouder.
5	17-10-2024	Het huidige systeem in de regio is 'onvolwassen', zie ook RES-evaluatie. Er is te weinig kwalitatief menskracht in regio en in Zuidplas. Middelen die vanuit het Rijk naar de regio komen zijn daarmee een 'last'. Dit omdat er geen goede mensen zijn om dit uit te werken. Bijvoorbeeld: Voor de nMIEK en integraal programmeren zijn er 3 FTE's aan middelen extra beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Maar lokaal uitvoering is de financiering niet geregeld. Ditto voor netcongestie en energiehubs. VNG lobbyt nog voor ophoging van CDOKE-middelen.	Het kan ook een keuze zijn om te accepteren dat dit is wat het is met alle risico's die daarbij horen.

6	17-10-2024	Het WSO-traject loopt toe naar belangrijke besluitmomenten. Tegelijkertijd is personeel tijdelijk uitgevallen. Op korte termijn moeten wel politieke keuzes worden voorgelegd.	Een nieuw procesregisseur voor de WSO start in de week van 21 oktober.
7	17-10-2024	De organisatie vraagt steeds meer tijd voor inhoudelijke adviezen op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er is niet voldoende capaciteit om aan alle vragen het hoofd te bieden. Verwachting is dat deze vragen zullen toenemen in de komende jaren. Ook wordt capaciteit gevraagd als projectopdrachten en startnoties al zijn vastgesteld, zonder dat de randvoorwaarden zijn geregeld	Het is belangrijk dat vanuit de clusters in beeld worden gebracht welke capaciteit van duurzaamheid nodig is in projecten of andere beleidsontwikkeling -> om deze vragen te kunnen beantwoorden moet ook vanuit hier middelen worden georganiseerd of er moet geherprioriteerd worden binnen de bestaande middelen of geheel nieuwe verdeling ten aanzien van capaciteit voor de opgaven

7. Voor de Parkeerflap





De parkeerflap is een lijst met taken waar momenteel geen capaciteit of financiering voor is ingeregeld in het programma Duurzaamheid. We parkeren deze taken momenteel om prioriteit te geven aan de wettelijke of besloten taken zoals hierboven beschreven.

- Energieopslag
- Energiehubs (en masterclass hierover)
- Energieclusters
- Warmtebedrijf
- Groen gas
- Waterstof Backbone
- Klein windmolen beleid
- Circulaire economie

B&W jaarplanning Duurzaamheid Q4 2025 en Q1-Q2/2026

Onderwerpen coalitieprogramma	Besluit	Initiatief	Afgerond	Q4/2025	Q1-Q2/2026
Provinciale energievisie	Collegebesluit	Extern	Nee		
Uitvoeringsregels klimaatadaptatie	Collegebesluit	College	Nee		X
Uitkomsten risicodialogen (incl. raadsinformatienota)	Collegebesluit	College	Nee		X
Opstellen adaptatie strategie + uitvoeringsagenda	Raadsbesluit	College	Nee		
Vaststellen uitvoeringsagenda versterken biodiversiteit	Collegebesluit	Motie	Nee		
Handelingsperspectief voor inwoners (Zuidplas aardgasvrij)	Collegebesluit	Organisatie	Nee	X	
Gunning opdracht Soorten Management Plan	Collegebesluit	College	Nee	X	
Besluit beleidsregels subsidie Isolatieprogramma	Collegebesluit	College	Nee	X	
Actualisatie procesplan verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen	Collegebesluit	College	Nee		
Herziene aanpak aardgasvrij	Collegebesluit	Organisatie	Nee	X	
Besluit "commitment" regionaal warmtenet Oostland	Collegebesluit	Extern	Nee	X	
Vaststellen beleidsregel en toetsingskaders natuurinclusief bouwen	Collegebesluit	College	Nee	X	
Actualiseren Bodemenergiebeleid	Collegebesluit	Organisatie	Nee		
Vaststellen Regionale Laadvisie	Raadsbesluit	Extern	Nee	X	
Besluit Samenwerkingsovereenkomst/SOK regionaal warmtenet Oostland	Collegebesluit	Extern	Nee	X	
Besluit Samenwerkingsovereenkomst/SOK warmtenet Zuidplaspolder	Collegebesluit	Extern	Nee	X	
Samenwerkingsovereenkomst OER A12	Collegebesluit	Extern	Nee		X
Vaststellen Lokale Energie uitvoeringsstrategie / Aanvullend Zuidplas opwekprogramma	Collegebesluit	College	Nee	X	
Vaststellen bestuursopdracht Lokale Energie uitvoeringsstrategie	Collegebesluit	College	Nee	X	

Overkoepelende inspanningen programma Duurzaamheid



Inspanning	Actiehouder	Opleverdatum	Resultaat	College/Raad?	Opmerkingen
Overdraagbaar programma DZH	  / 	Nov 2025	Overdracht Programma Duurzaamheid incl - Logboeken Programma en inspanningen - Ontwikkelpunten programma en team - Stakeholdermanagement + Stakeholderlijst opgesteld - Adviesnotitie Scenario's doelen en financiën tav programma Duurzaamheid vanaf 2026 tbv richtinggevende keuzes		
Coördineren P&C stukken		7 augustus Lopend traject	Begroting 2026 en Najaarsnota 2025 opgeleverd		
Opleveren van de Voortgangsrapportage	Programma-secretaris	November 2025	Voortgangsrapportage opgeleverd aan stuurgroep Duurzaamheid		
Ontwikkeling monitoring	Programma-secretaris	Oktober 2025 Oktober 2025	Dashboard biodiversiteit opgeleverd Dashboard pijplijn duurzame projecten opgeleverd		

	Hele team	Continue			
StakeholdermanagementProgramma		15 juli	Stakeholdermanagement op inspanning opgezet met team		
		Juli 2025	Stuurgroep		
		Nov/dec 2025	Rapportage/Memo over stakeholdermanagement is onderdeel van de Rapportage 2025 Doelen Inspanning Programma Duurzaamheid – t.b.v. overdraagbaar programma vanaf 2026		Check bij stuk van
		Week van 22 september	Stakeholdermanagement geüpdatet met team		
		Week van 24 november	Stakeholdermanagement geüpdatet met team		
Bewaking doelstellingen programma en inspanningen – Politiek		Q3 2025	Geadviseerd herziening politieke prioriteiten (nav memo inhoudelijk risicodossier feb 2025)		
		Q4 2025	Uitgebracht strategisch advies politieke en bestuurlijke voorbereiding over lange termijn speerpunten (10-30 jaar)	College	

Energietransitie

Inspanning	Actiehouder	Opleverdatum	Resultaat	College/Raad?	Opmerkingen
------------	-------------	--------------	-----------	---------------	-------------




Monitoring RES		Onbekend	Regionale monitoring		Check bij
Realiseren Zon op Veld		Begin 2027	Beoogd vergunningverlening initiatief PZoV		Check bij
		?	Besluit genomen over heropening PZoV	College	
Realiseren Zon op Dak		December 2025	Participatienota uitgevoerd		
		December 2026	0,019 TWh behaald dmv zon op dak op de 20 grootste daken		
		2030	0,068 TWh behaald		
Zon langs infra (OER-projecten)		Q1 2026	OER A12: Verkenningsfase afgerond;		Stuurgroep OER t.b.v. vaststelling SOK en uitgangspuntennotie financieel participatiebeleid
		Q1 2026	(college)besluit genomen over samenwerkingsovereenkomst OER A12	College	In november Raadsinformatienota over vertraging OER
		xx	OER A20: intentieovereenkomst behaald	College	In nov. Raadsinformatienota over pauzering OER A20 ivm wegverbreding
Uitvoeren / opstellen pMIEK		December	Lokale inzet op pMIEK is bepaald		Rekening houdend met o.a.: - Welke taken horen hierbij?; - Hoeveel inzet vraagt dat?; - Geen Rijksmiddelen
Opstellen Lokale Energie uitvoeringsstrategie		Begin oktober	Bestuursopdracht Lokale Energie uitvoeringsstrategie	College	
		December	Vastgestelde Lokale Energie uitvoeringsstrategie	College	
Uitbreiden Laadinfrastructuur		September 2025	Genomen verzamelbesluit	College	
		Q1 2026	Vastgestelde Regionale Laadvisie		

		1 juni 2026	Nieuwe concessie gaat in		
Verduurzamen eigen mobiliteit		Onbekend	Vastgesteld beleid verduurzaming eigen mobiliteit		
Verduurzamen wagenpark		Voor zomerreces	Ondertekende Samenwerkingsovereenkomst met Rotterdam		




Warmtetransitie

Inspanning	Actiehouder	Opleverdatum	Resultaat	College/Raad?	Opmerkingen
Opstellen herziene aanpak aardgasvrij en handelingsperspectief		Week 33	Gesprekken met stakeholders afgerond	College	
		Week 36	Concept aanpak op hoofdlijnen gepresenteerd		
		Week 37	Feedback op concept aangeleverd		
		Week 38	+anderen heeft aangepaste versie procesaanpak aangeleverd		
		Week 39	Feedback op procesaanpak aangeleverd		
		Week 40	Procesaanpak aan stakeholders gepresenteerd		
		Week 44	Feedback van stakeholders verwerkt		
		Week 45	Definitieve procesaanpak opgeleverd		
		December 2025	Vastgestelde herziene aanpak aardgasvrij		
		December 2025	Opgeleverd handelingsperspectief		
		Q4 2025	Een nieuwe lange termijn participatie- en communicatiestrategie voor het samenwerkingsproces Zuidplas aardgasvrij , waarin gedragsverandering centraal staat, met concrete acties en middelen, inclusief een participatielogboek		

Verkennen warmtenet Zuidplaspolder (WSO)		September 2025	Commitment regionaal warmtenet Oostland		
		Q4 2025	Besluit genomen over SOK RWO & SOK Zuidplaspolder Oostland		
		Oktober 2025	Investeringsbesluit van Netverder Zuidplaspolder		
		Ntb	Koppeling GO is verkend		
Voor 10 VvE's wordt door een adviserende partij verduurzamingsadvies aangeboden om ondersteuning te bieden aan het verduurzamingsproces.		September 2025	Start pilot nieuwe communicatiestrategie naar VvE's toe		5 VvE's zijn van advies voorzien
		December 2025	10 VvE's zijn van duurzaamheidsadvies voorzien		
		December 2025	Pilot afgerond		Met als doel 5 VvE's van advies te hebben voorzien
Gemeentebrede communicatie		Doorlopend	Continueren Duurzaam Bouwloket		Nieuw contract ligt klaar. Opdracht kan aangemaakt worden wanneer boekjaar 2026 is geopend
		Q4 2025	Nieuw contract voor energieloket		
Actualiseren beleid bodemenergie		?	Ambtelijk advies over vervolgstappen actualisatie Bodemenergiebeleid		
Duurzaamheid meenemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties		?	Prestatieafspraken met gedragen ambities en afspraken t.a.v. Duurzaamheid (energietransitie en klimaatadaptatie)		
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, zogenaamde makkelijk te verduurzamen panden	Adviseur maatschappelijk vastgoed	Q4 2025	Nota vastgoed (incl. duurzaamheid) vastgesteld in de raad	Raad	
Opstellen DMJOP voor overige gemeentelijke panden	Adviseur maatschappelijk vastgoed	Q2/3 2025	Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)		

Grootverbruikers hoger op de prioriteitenlijst krijgen om te verduurzamen	Adviseur maatschappelijk vastgoed	-	Update prioriteitenlijst		
Aanpak energiearmoede		December 2025	In 88 woningen zijn maatregelen getroffen tegen energiearmoede (waterzijdig inregelen)		
Aanpak Isolatie		September 2025	Communicatieplan subsidie isolatieaanpak		
		Oktober 2025	Vastgestelde subsidieverantwoording	College	
		Oktober 2025	B&W besluit gemeentelijke subsidie isolatieaanpak genomen	College	
		Oktober 2025	Start aanpak verstrekken gemeentelijke subsidies	College	
Opstellen Soorten Management Plan		Q4 2025	Collegebesluit gunnen opdracht genomen	College	Wordt waarschijnlijk poging vrijwillige transparantie
		Oktober 2026	Tellingen afgerond		
		December 2026	SMP concept opgeleverd		
		Januari 2027	Akkoord ODH		
		Februari 2027	Eindrapportage SMP	College	
Verkennen elektrolyser als warmtebron		Q4 2025	B&W besluit over Regioadvies VAWOZ waar ZP over heeft geadviseerd en informatienota over verkenning	College	

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Inspanning	Actiehouder	Opleverdatum	Omschrijving	College/Raad?	Opmerkingen
Het vaststellen van het Convenant klimaatadaptief bouwen in gemeentelijk beleid		Q3-2025	Communicatieplan klimaatadaptief bouwen (zodat collega's kunnen werken met het beleid)		Koppelen aan adaptatiestrategie
		Q3 2026	Vastgesteld beleid klimaatadaptief bouwen (met het hele bestuurlijk traject ervoor)		
		Q3-2026	Toetsingskader klimaatbestendig bouwen		
		September 2026	Handreiking klimaatbestendig bouwen		
Klimaatbestendig bouwen en inrichten meenemen in de prestatieafspraken met woning corporaties		Q4 2025	?		Loopt via  van wonen. Deze inspanning is voor 2025 behaald. De woningcorporaties gaan meedoen in de risicodialogen. Eventuele resultaten opvragen bij Iris.
Uitvoeren van de gemeentelijke stresstesten, inclusief risicodialogoog en adaptatiestrategie		Week 30	Resultaten lokale klimaatstresstesten opgeleverd		
		September 2025	Resultaten klimaatstresstesten (lokaal) bestuurlijk afgestemd en informatienota aan raad aangeleverd		
		September/ oktober 2025	Opdracht risicodialogen uitgezet		
		September	Communicatie / Participatieplan risicodialogen		

		Q3 2025 t/m Q1 2026	Voeren van de risicodialogen / Risicodialogen zijn gevoerd		
		2026	Adaptatiestrategie opgeleverd/vastgesteld		
		2026	Uitvoeringsagenda opgeleverd/vastgesteld		
Convenant Klimaatadaptief bouwen implementeren in het DIOR		Q2-2026	Handreiking klimaatbestendig bouwen opgeleverd		Gaat gelijk lopen met adaptatiestrategie. Convenant wordt daarna pas in DIOR geïmplementeerd
Stimuleren klimaatbestendige schoolpleinen		Oktober 2025	Voorziening klimaatbestendige schoolpleinen opgenomen in geactualiseerde Fingel		Traject loopt via onderwijs.
In 2025 is gemeentelijk beleid opgesteld om biodiversiteit te versterken		Oktober 2025	Beleidsregels en toetsingskader voor natuurinclusief bouwen opgeleverd/vastgesteld		Doel is september. Hangt af van bestuurlijke route.
Natuurinclusief ontwikkelen maakt deel uit van nieuwe projecten en ontwikkelingen		Oktober 2025	Communicatieplan natuurinclusief bouwen opgeleverd		
		Oktober 2025	Beleidsregels en toetsingskader voor natuurinclusief bouwen vastgesteld		
Onderzoeken van de mogelijkheden van transitie naar een ecologisch verantwoord beheer en inrichten op basis van de uitkomsten van de biodiversiteit nulmeting		Q4 2026	Regionaal rapport kansen maaibeheer opgeleverd		Discussie over opdracht loopt nog regionaal

Parkeerflap

Onderwerp / product	Toelichting
Verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen	
Actualiseren bodemenergie	
Energieopslag	
Energiehubs	
Energieclusters	
Warmtebedrijf	
Groen gas	
Waterstof backbone	
Klein-windmolenbeleid	
Circulaire economie	

Onderwerp: Ter kennisname, afronding opdracht programmamanager Duurzaamheid

Beste leden van de stuurgroep,

In het kader van de afronding van mijn opdracht als interim programmamanager Duurzaamheid informeer ik jullie graag dat de resultaten op 21 oktober 2025 formeel zijn overgedragen aan de ambtelijk opdrachtgever/directeur.

Voor 2025 was mijn opdracht om te komen tot een overdraagbaar programma Duurzaamheid. Deze opdracht is afgerond en de bijbehorende resultaten zijn opgeleverd.

Opgeleverde resultaten

De volgende documenten zijn beschikbaar in de backoffice op Teams:

- Businesscase 2023
- Financiële businesscase (20-10-2025)
- Financieel voorstel 2026 (20-10-2025)
- Programmaplan Duurzaamheid 2024–2026
- Uitvoeringsplan fase 1 (2024)
- Logboeken programma en inspanningen
- Notitie risicodossiers
- Overzicht stakeholdermanagement
- Evaluatie op basis van de creatielemniscat
- Tijdlijn markante gebeurtenissen (2018–heden)
- Feedbackdossiers teamleden (oktober 2025)
- Diverse voortgangsrapportages
- B&W-planning Duurzaamheid
- Resultaatplanning Duurzaamheid

De resultaten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de strategisch adviseur en programmasecretaris. De samenwerking met de strategisch adviseur, die in opdracht van PMG aan deze overdracht heeft bijgedragen, is per afronding beëindigd.

De verdere borging en eventuele doorontwikkeling van het programma ligt nu bij de opdrachtgever en diens opvolger.

Met vriendelijke groet,

 J

Van: " [redacted] " **Document 25**
Verzonden: donderdag 17 oktober 2024 15:32
Aan: " [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted]@odmh.nl>; " [redacted]@zuidplas.nl>
Cc: " [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: Beantwoording persvraag

Hoi [redacted],

Hieronder de wat [redacted] en mij betreft, definitieve beantwoording naar Wybe. [redacted]
[redacted] zijn jullie akkoord? Ik hoor het graag zo spoedig mogelijk.

Hoi Wybe,

Hierbij het antwoord voor de pers:

De vraag van de pers was: waarom staat daar alleen Stedelink?

Hierbij ons aangepaste voorstel voor de beantwoording:

Er is nog een laatste bedrag van de landelijke subsidie energiearmoede te besteden. Daarom heeft gemeente Zuidplas contact gezocht met alle woningcorporaties in Zuidplas, om gezamenlijk op te trekken in het treffen van maatregelen bij huurders met als doel het besparen van energie. We hebben contact gezocht met alle 4 de woningbouwcorporaties om verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke aanpak en het kiezen van een doelgroep. Ten tijde van het schrijven van de najaarsnota had alleen Stedelink gereageerd. Inmiddels hebben 2 van de 4 woningbouwcorporaties hier op gereageerd. Het gaat daarbij trouwens niet om het nemen van isolatiemaatregelen, maar wel over andere kleine en middelgrote energiebesparende maatregelen.

Daarnaast is dit ons voorstel voor de najaarsnota:

Er is nog een laatste bedrag van de landelijke subsidie energiearmoede te besteden. Daarom heeft gemeente Zuidplas contact gezocht met alle woningcorporaties in Zuidplas, om gezamenlijk op te trekken in het treffen van maatregelen bij huurders met als doel het besparen van energie. We hebben contact gezocht met alle 4 de woningbouwcorporaties om verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke aanpak en het kiezen van een doelgroep. Inmiddels hebben 2 van de 4 woningbouwcorporaties hier op gereageerd. Het geld willen we besteden aan kleine en middelgrote energiebesparende maatregelen.

We gaan kijken hoe we dit kunnen aanpassen in de najaarsnota.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]



T 0180 – [redacted] 06 [redacted]
E [redacted]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: " " @mailing.regionaalenergieloket.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2024 15:05
Aan: " " @zuidplas.nl>
Onderwerp: Belangrijke beleidsupdates voor 2025

Document 26

U ontvangt niet vaak e-mail van " " @mailing.regionaalenergieloket.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Beste " " ,

We brengen je graag op de hoogte van een aantal beleidswijzigingen en updates die van invloed zijn op ons werk. In deze mail lees je het belangrijkste nieuws.

Wijzigingen ISDE

- Het ISDE-subsidiebedrag voor dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie en isolerend glas gaat omhoog.
- De minimale oppervlakte voor glasisolatiemaatregelen gaat omlaag van 8 m2 naar 3 m2. Hierdoor komen ook kleinere woningen in aanmerking voor subsidie. Ook kunnen bewoners vanaf 2025 twee keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.
- Het ISDE-subsidiebedrag voor warmtepompen gaat in veel gevallen omlaag.

Gemeenten waarmee we een NIP-project organiseren hebben van ons een mail ontvangen over de consequenties van de ISDE-wijzigingen voor de lopende NIP-projecten.

[Bekijk alle ISDE-wijzigingen](#)

SPUKs worden langs de politieke meetlat gelegd

- **Ambitie coalitie:**
Het huidige kabinet streeft ernaar zoveel mogelijk specifieke uitkeringen (SPUKs) af te schaffen en op te nemen in het gemeentefonds, zoals vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord. Dit gaat gepaard met een efficiencykorting van 10%; wat dit precies betekent voor ons werk is nog onduidelijk.
- **Politieke uitzonderingen:**
Ondanks deze ambitie mogen ministeries specifieke uitkeringen behouden op basis van praktische, juridische of politieke argumenten. Dit blijkt uit het nieuwe afwegingskader dat naar de Kamer is gestuurd.

[Lees meer over de toekomst van SPUKs](#)

Ministerie werkt aan EPBD-implementatie

- **One-stop-shop:**
Op 12 april 2024 is de [EPBD IV](#) gepubliceerd. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt aan de implementatie van deze nieuwe richtlijn, die vraagt om een 'one-stop-shop' energieloket dat voorziet in van alles wat nodig is om gebouwen te verduurzamen en energie te besparen.
- **Ministerie van VRO doet Onderzoek:**
Het ministerie laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar de impact van activiteiten van energieloketten, energiecoöperaties en aanbieders van diensten als energiefixers. De uitkomsten worden gebruikt bij de implementatie van de eisen van nieuwe Europese richtlijnen voor de gebouwde omgeving (EPBD IV).

Wij zijn vanuit REL nauw betrokken bij dit onderzoek en leveren zowel kwantitatieve als kwalitatieve data aan. Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie. De resultaten worden alleen op geaggregeerd niveau gedeeld en gerapporteerd, waardoor individuele antwoorden niet te herleiden zijn tot specifieke personen of organisaties.

Opfrisser: regeerprogramma

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet de begroting voor volgend jaar bekend. Samengevat zijn de plannen als volgt:

- Bestaand NIP- en warmtebeleid gaat door inclusief het beoogde budget daarvoor
- Financiële middelen (subsidies en leningen) blijven beschikbaar voor inwoners
- Verduurzamingsverplichtingen voor bewoners zijn voorlopig van de baan
- Kabinet inventariseert maatregelen voor betaalbaarheid warmtenetten
- De salderingsregeling stopt in 2027
- De energiebelasting gaat omlaag
- Het stroomnet wordt verzwakt i.v.m. netcongestie
- Funderingsproblematiek wordt aangepakt

[Regeerprogramma. Uitwerking van het hoofdlijnenakkoord](#) (H5 'Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie')

Warmteprogramma ondersteuning vanuit NPLW

Wil je met een groepje ambtenaren in jouw gemeente serieus aan de slag met het ondersteunen van particuliere woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning? Dan kun je je kosteloos aanmelden voor het actietraject ontzorging all-electric.

In dit actie-traject leer je wat bewoners nodig hebben aan de hand van het verduurzamingsproces, doe je inzicht op over de huidige ondersteuningsstructuur van jouw gemeente en zet je de eerste stappen in de ontwikkeling en organisatie van de ondersteuningsstructuur aan de hand van ten minste één project met een groep bewoners.

[Meer informatie en gratis aanmelden](#)

Vragen?

Mocht je vragen hebben over deze e-mail, neem dan gerust contact met me op via  j@regionaalenergieloket.nl

Alvast een fijne feestmaand gewenst!


Energieke groet,

M: 06  

W: gemeente.regionaalenergieloket.nl

E:  j@regionaalenergieloket.nl





regionaal
energieloket



Van: " " **Document 27**
Verzonden: woensdag 19 maart 2025 10:51
Aan: " @zuidplas.nl>; " @zuidplas.nl>
Onderwerp: Bijpraatsessie College Programma Duurzaamheid gemeente Zuidplas (002) SVW.pptx
Bijlage(n): Bijpraatsessie College Programma Duurzaamheid gemeente Zuidplas (002) SVW.pptx

Hoi ,

Ik heb nog wijzigingen doorgevoerd.
 komt met sheet belangrijke besluitmomenten.

Wil jij dan jouw laatste versie naar sturen, zodat hij deze morgen kan versturen naar de stuurgroep?

is er niet, schuift aan.
Wil jij zorgen dat hij het ook krijgt?

Met vriendelijke groet,



T 0180- M 06-
E @zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Bijpraatsessie College programma Duurzaamheid

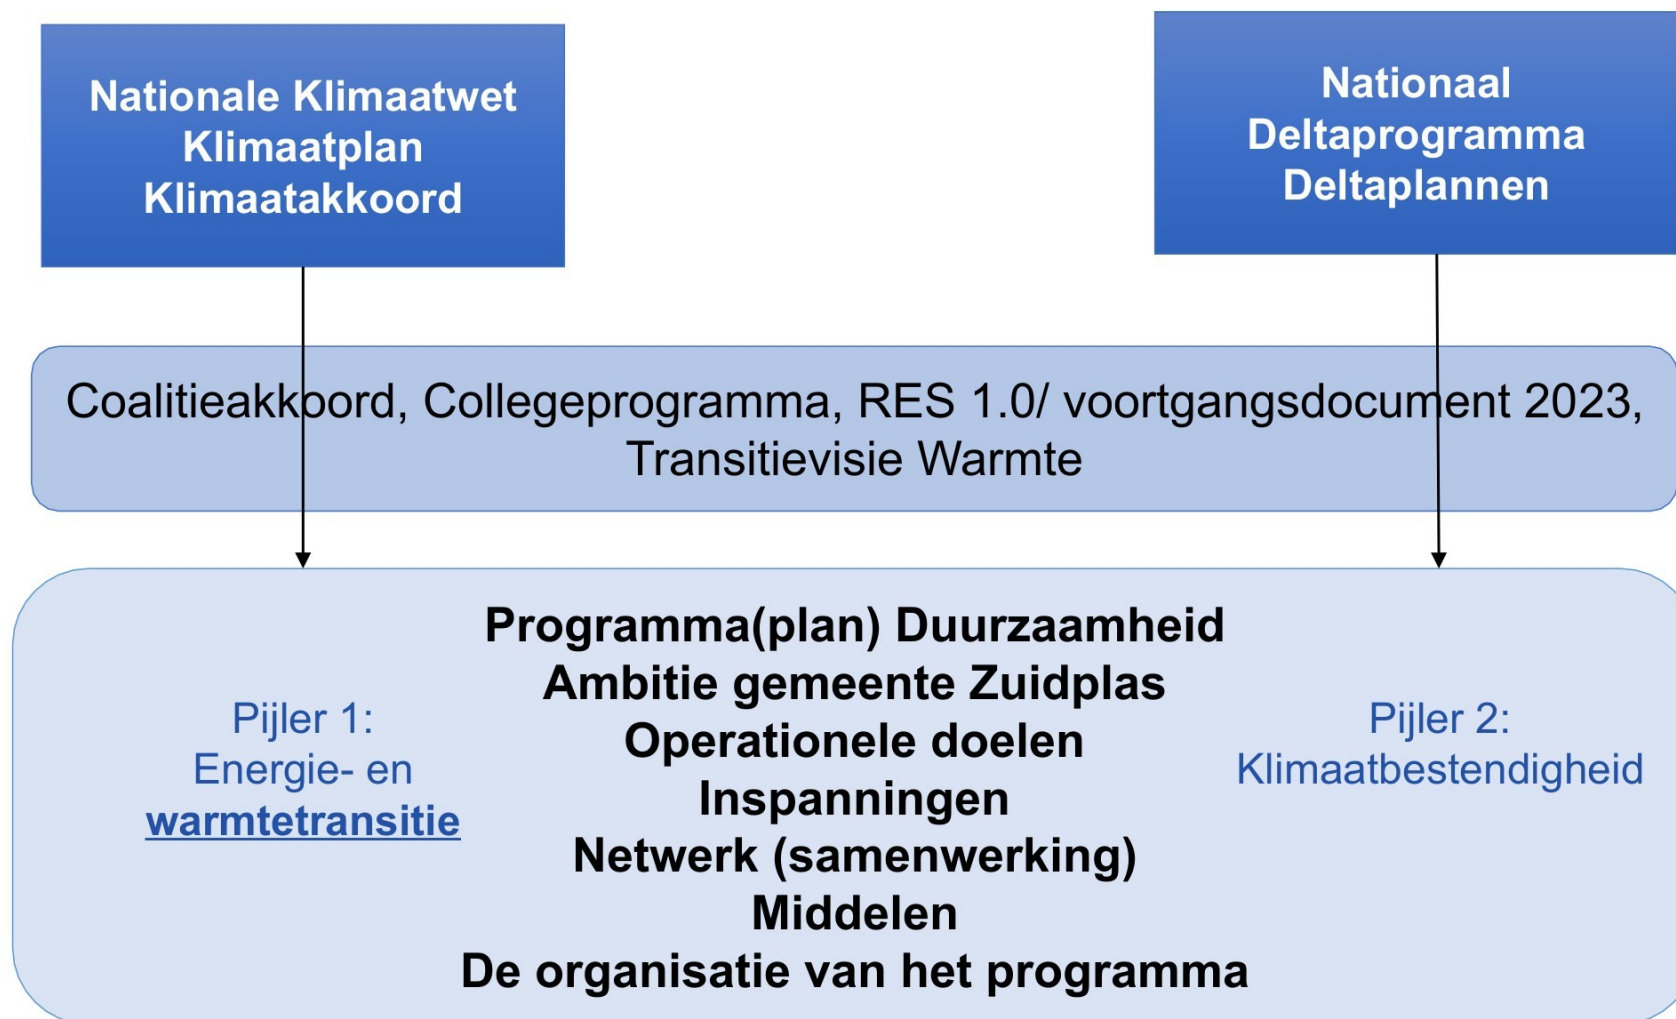
Energie- en warmtetransitie
Klimaatbestendigheid
en Biodiversiteit



Doel

- Bijpraten
 - Programma doelen en inspanningen algemeen
 - Risico dossiers
 - Nieuwe voorwaarden
 - Effecten eventuele bezuinigingen
- Richtingsvraag aan College: Wat is het bestaansrecht van de opgave Duurzaamheid?
 - Welke maatschappelijk baten zijn voor het college het belangrijkste? Welke zijn minder belangrijk?
 - Op welke wijze wil het college zich positioneren in de regionale samenwerkingen?


Vertrekpunt programma Duurzaamheid




Inspanningen programma Duurzaamheid: warmtetransitie



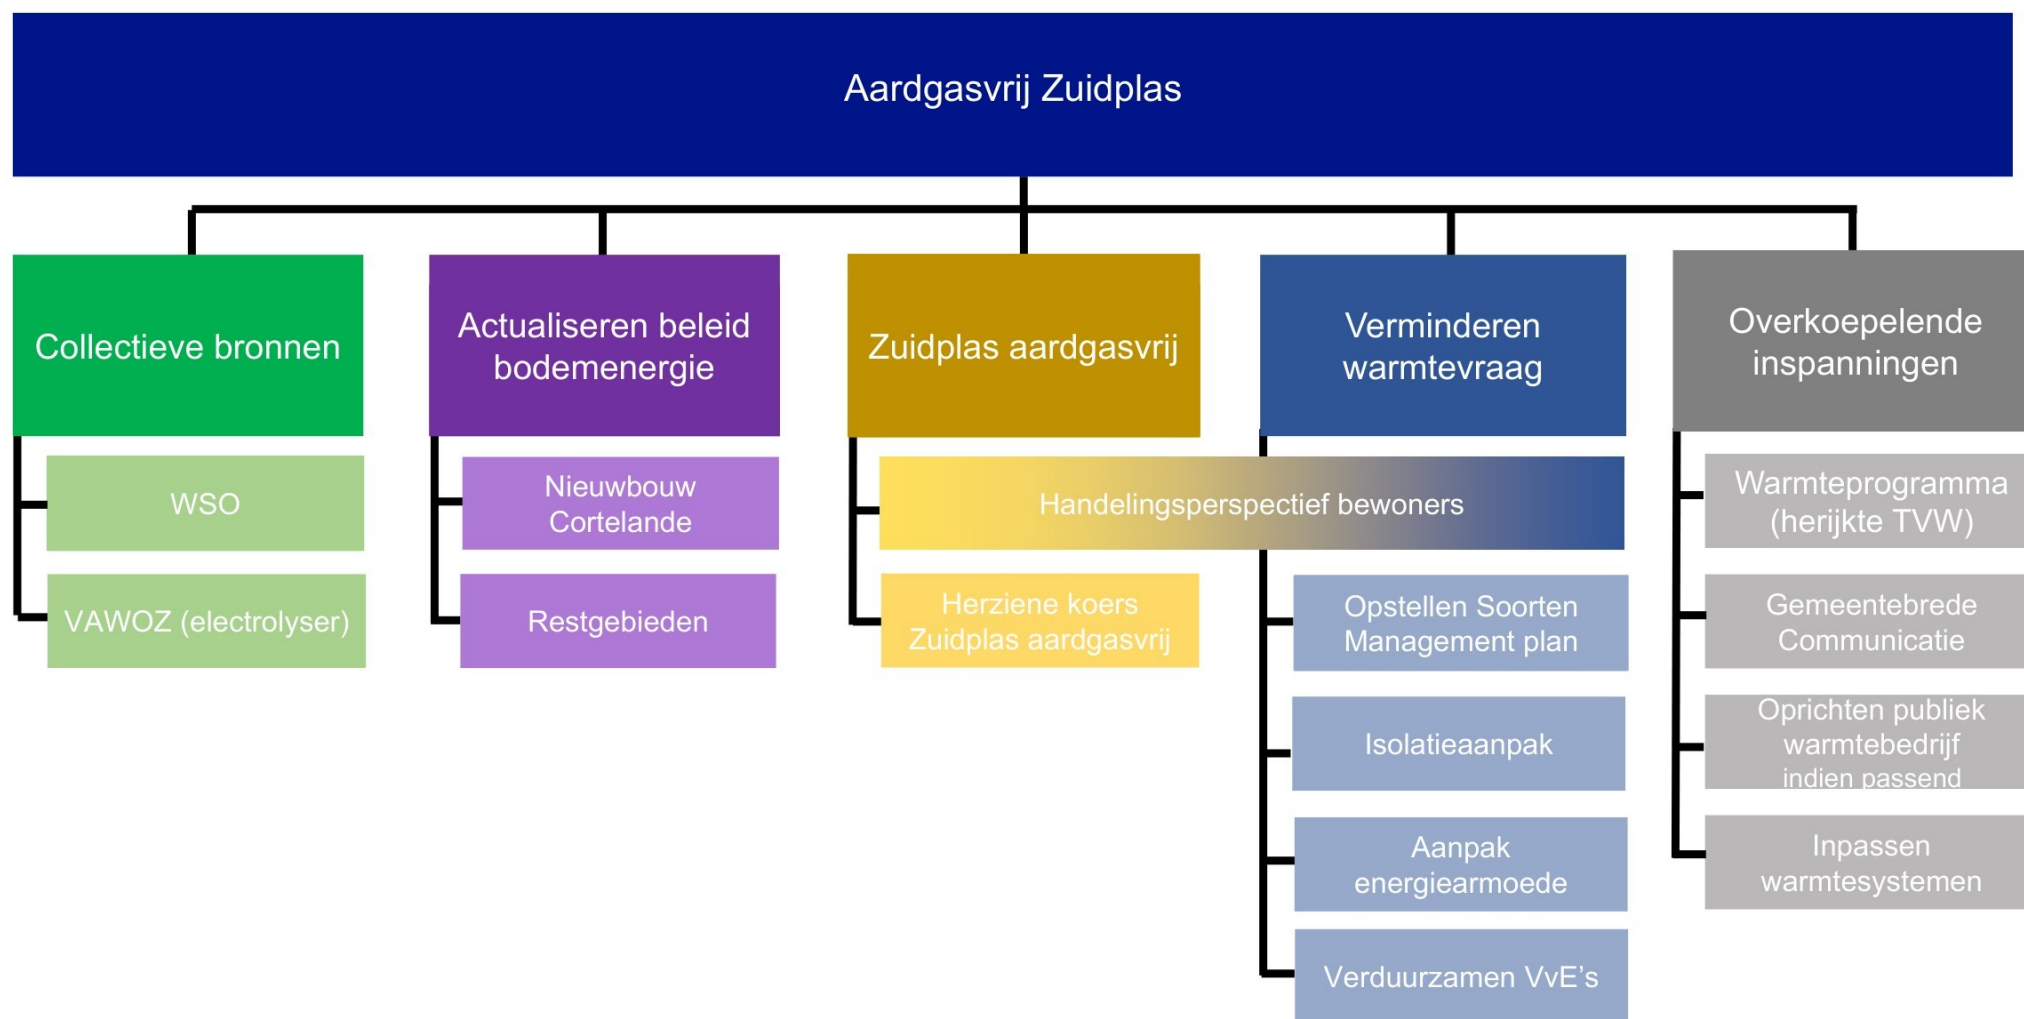gemeente
Zuidplas



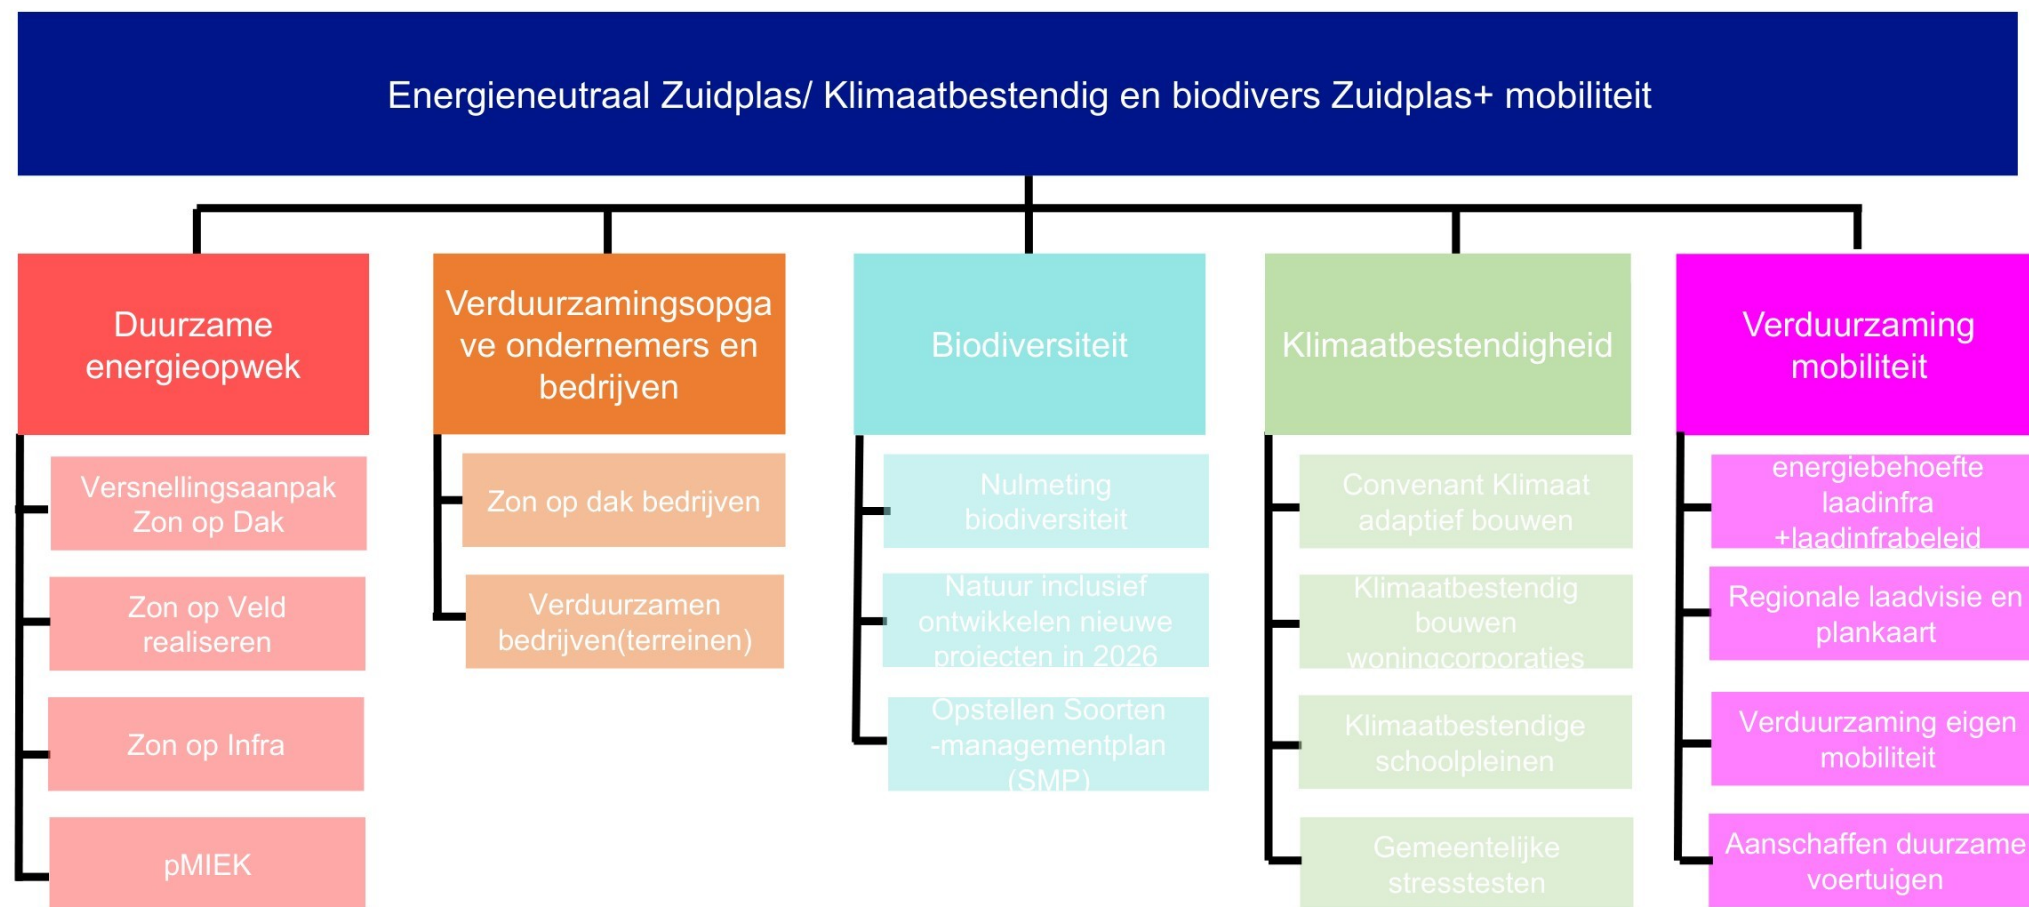Inspanningen Programma Duurzaamheid energietransitie, biodiversiteit & klimaatbestendigheid



Maatschappelijke baten op lange termijn

- **Lagere energiekosten** op lange termijn: Door betere isolatie en duurzame warmteoplossingen worden woningen energiezuiniger en dalen de kosten voor huishoudens.
- **Gezondere leefomgeving:** Minder uitstoot van fijnstof en CO₂ leidt tot schonere lucht en minder gezondheidsproblemen.
- **Verhoogde woningwaarde:** Woningen met een goed energielabel en duurzame warmteoplossing in een klimaatbestendige omgeving zijn aantrekkelijker op de woningmarkt.
- **Minder afhankelijk van fossiele energie en geopolitieke risico's:** Minder afhankelijkheid van aardgas betekent minder kwetsbaarheid voor energiecrises en aantrekkelijker klimaat voor ondernemers en maatschappelijke instellingen
- **Lagere CO₂-uitstoot en minder klimaatverandering:** Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind verminderen de uitstoot van broeikasgassen.
- **Voedselzekerheid:** Meer biodiversiteit betekent gezonde bodems en natuurlijke bestuiving, wat cruciaal is voor duurzame landbouw.
- **Meer leefbare vitale bestaande dorpen:** Groen en water in de dorpen zorgen voor verkoeling, betere luchtkwaliteit en meer ruimte voor ontspanning.
- **Veiligere leefomgeving:** Dorpen worden weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering, wat de levenskwaliteit verhoogt.

Belangrijke besluiten aankomend jaar



gemeente
Zuidplas

- 

Context, knelpunten en risico's programma

Binnen programma

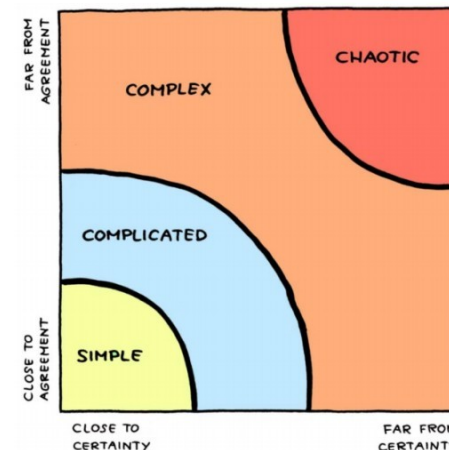
Context programma

- Veel doelen zijn lange termijn doelen
- Veel inspanningen zijn inhoudelijk complex
- Veel inspanningen vanuit regionale samenwerking
- Complexiteit versterkt bij koppeling dossiers, bv netcongestie

Kwaliteit inspanningen trekkers (nog) niet aansluitend op opgaaf

- Versterkt door krappe arbeidsmarkt

Typologie problemen



Successen

- Na 2 jaar programma is er lijn in de inspanningen
- Inzicht in de potentie van verschillende inspanningen wordt duidelijk
- Energie:
 - Zon op Veld
 - Zon op Dak
- Warmte
 - WSO
 - Isolatie etc
- Projecten als SMP, Aanpak Energiearmoede en Isolatieaanpak draaien
- De kwaliteit van stresstesten wordt bevorderd en door effectieve inzet regionaal en lokaal. En ruimte voor lokale politieke doelen en belangen.
- Heldere opdrachten op klimaatbestendigheid, zon op dak en monitoring aan ODMH -> samenwerking en inzet daardoor effectief.
- Nulmeting biodiversiteit is succesvol (mat participatie) afgerond en ene goede basis voor beleid
- Beweging van reactief naar proactief

Lokale potentie duurzame opweg



gemeente
Zuidplas



Technisch potentiële energieopwek	KWh	TWh	% van 0,097	
Gerealiseerd Zon op Dak *	11513560	0,012	11,9%	
Versnellingsopgave Zon op Dak* (grote be	68250290	0,068	70,4%	
(onderdeel is 20 grootste daken *)	19120490	0,019		19,7%
Potentie zonnepanele op geluidschermen I	111000	0,0001	0,1%	
ProRail	5000000	0,005	5,2%	
OERA12				
OERA20				
Potentie Zon op Veld (zoekgebied Moerkap	20976000	0,021	21,6%	
Potentie Zon op veld Energielandschap Mic	14592000	0,015	15,0%	
HHSK				PM
Proefveld Kronos				PM
			124,2%	

Complexere cruciale inspanningen opgepakt vanuit regionale samenwerking



- Regionale duurzaamheidsdoelstellingen (bv RES) lopen achter, daarmee ook de lokale doelen Zuidplas.
- Beperkte invloed op cruciale knelpunten in de regionale samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
- Programmamanager en strategisch programma-adviseur ervaren structurele belemmeringen en gebrek aan invloed op aanpassingen.
- **Veel inzet gaat naar regionale samenwerking, dat gaat ten koste van de inzet op lokale projecten**

☾ Zon op dak verschoven van regionaal naar lokaal, zodat het beter aansluit bij politieke afspraken: zon op dak; zon langs infra; zon op veld.

Veranderende/ Nieuwe voorwaarden

- Wet en regelgeving
 - WGiW
 - WcW
- Binnen inspanningen (komt terug in risico dossiers wat zeg je hier???-)
 - WSO
 - RES
- Bezuinigingsopgaaf: inzet duurzaamheid staat continue ter discussie
- Overknoopende effecten zijn onvoldoende zichtbaar vanuit programma en onvoldoende beheersbaar???

3 Risico dossiers

3 dossiers met grote impact:

- maatschappelijke baten
- en lokale doelen
- & onderling samenhangend

RES Midden
Holland

WSO WARMTE
SAMENWERKING
OOSTLAND



Regionale Energiestrategie (RES)

- Doelen blijven achter door gebrekkige uitvoering en monitoring.
- Budgetoverschrijdingen bedreigen andere duurzaamheidstrajecten.
- Zuidplas onvoldoende invloed in regionale samenwerking en besluitvorming.
- **Druk vanuit de Provincie om windenergie te verkennen, ook vanuit WSO**

3 Risico dossiers

Warmte Samenwerking Oostland (WSO)

- SWIG-subsidie (deadline 2025) loopt gevaar bij trage besluitvorming.
- NetVerder/Stedin oefent druk uit op gemeentelijk aandeelhouderschap
- Onvoldoende duidelijkheid wetgeving & onvoldoende juridische kennis belemmert ontwikkeling warmtenet.

Netcongestie

- Binnen programma: Belemmering duurzame energieprojecten (zoals zon-op-dak en warmtenetten).
- Programma overstijgend:
 - Negatieve impact op woningbouw en bedrijventerreinen door beperkte elektriciteitscapaciteit.
 - Zuidplas onvoldoende gepositioneerd als speler in netcongestieverzachting.



Inhoudelijk vraagstuk WSO

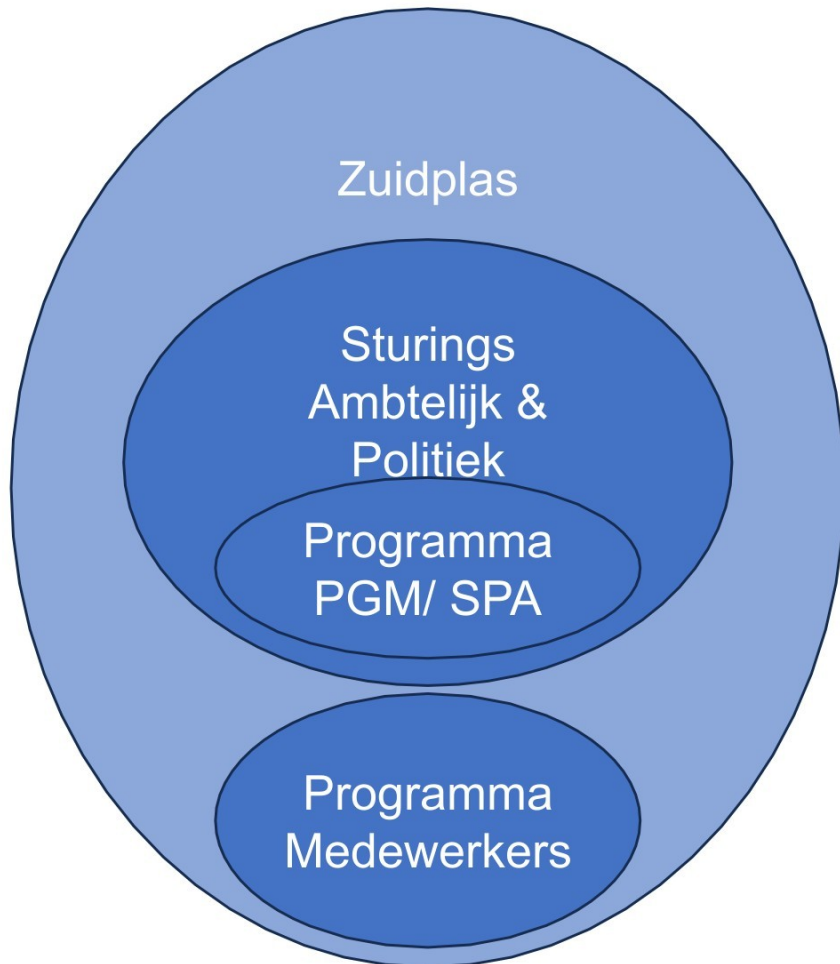
Vragen die op dit moment spelen en naar de politiek moeten?

- Hoe omgaan met voorwaarde NetVerder/Stedin op gemeentelijk commitment (aandeelhouderschap/ middelen/ deelnemen in toekomstig warmtenet)?
- Hoe omgaan met netcongestie? -> ligt bij directeur Opgaven en beleid.

Context, knelpunten en risico's programma

Buiten programma


Binnenwereld



- Financiën
- Gemeenteraad
- Ondersteuning kwaliteitsopbouw medewerkers
- Nieuw programma & team, vraagt om kwalitatieve verbeterslag
- Hoge mate van doorloop
- Zelfs moeilijk aan goede inhuur te komen



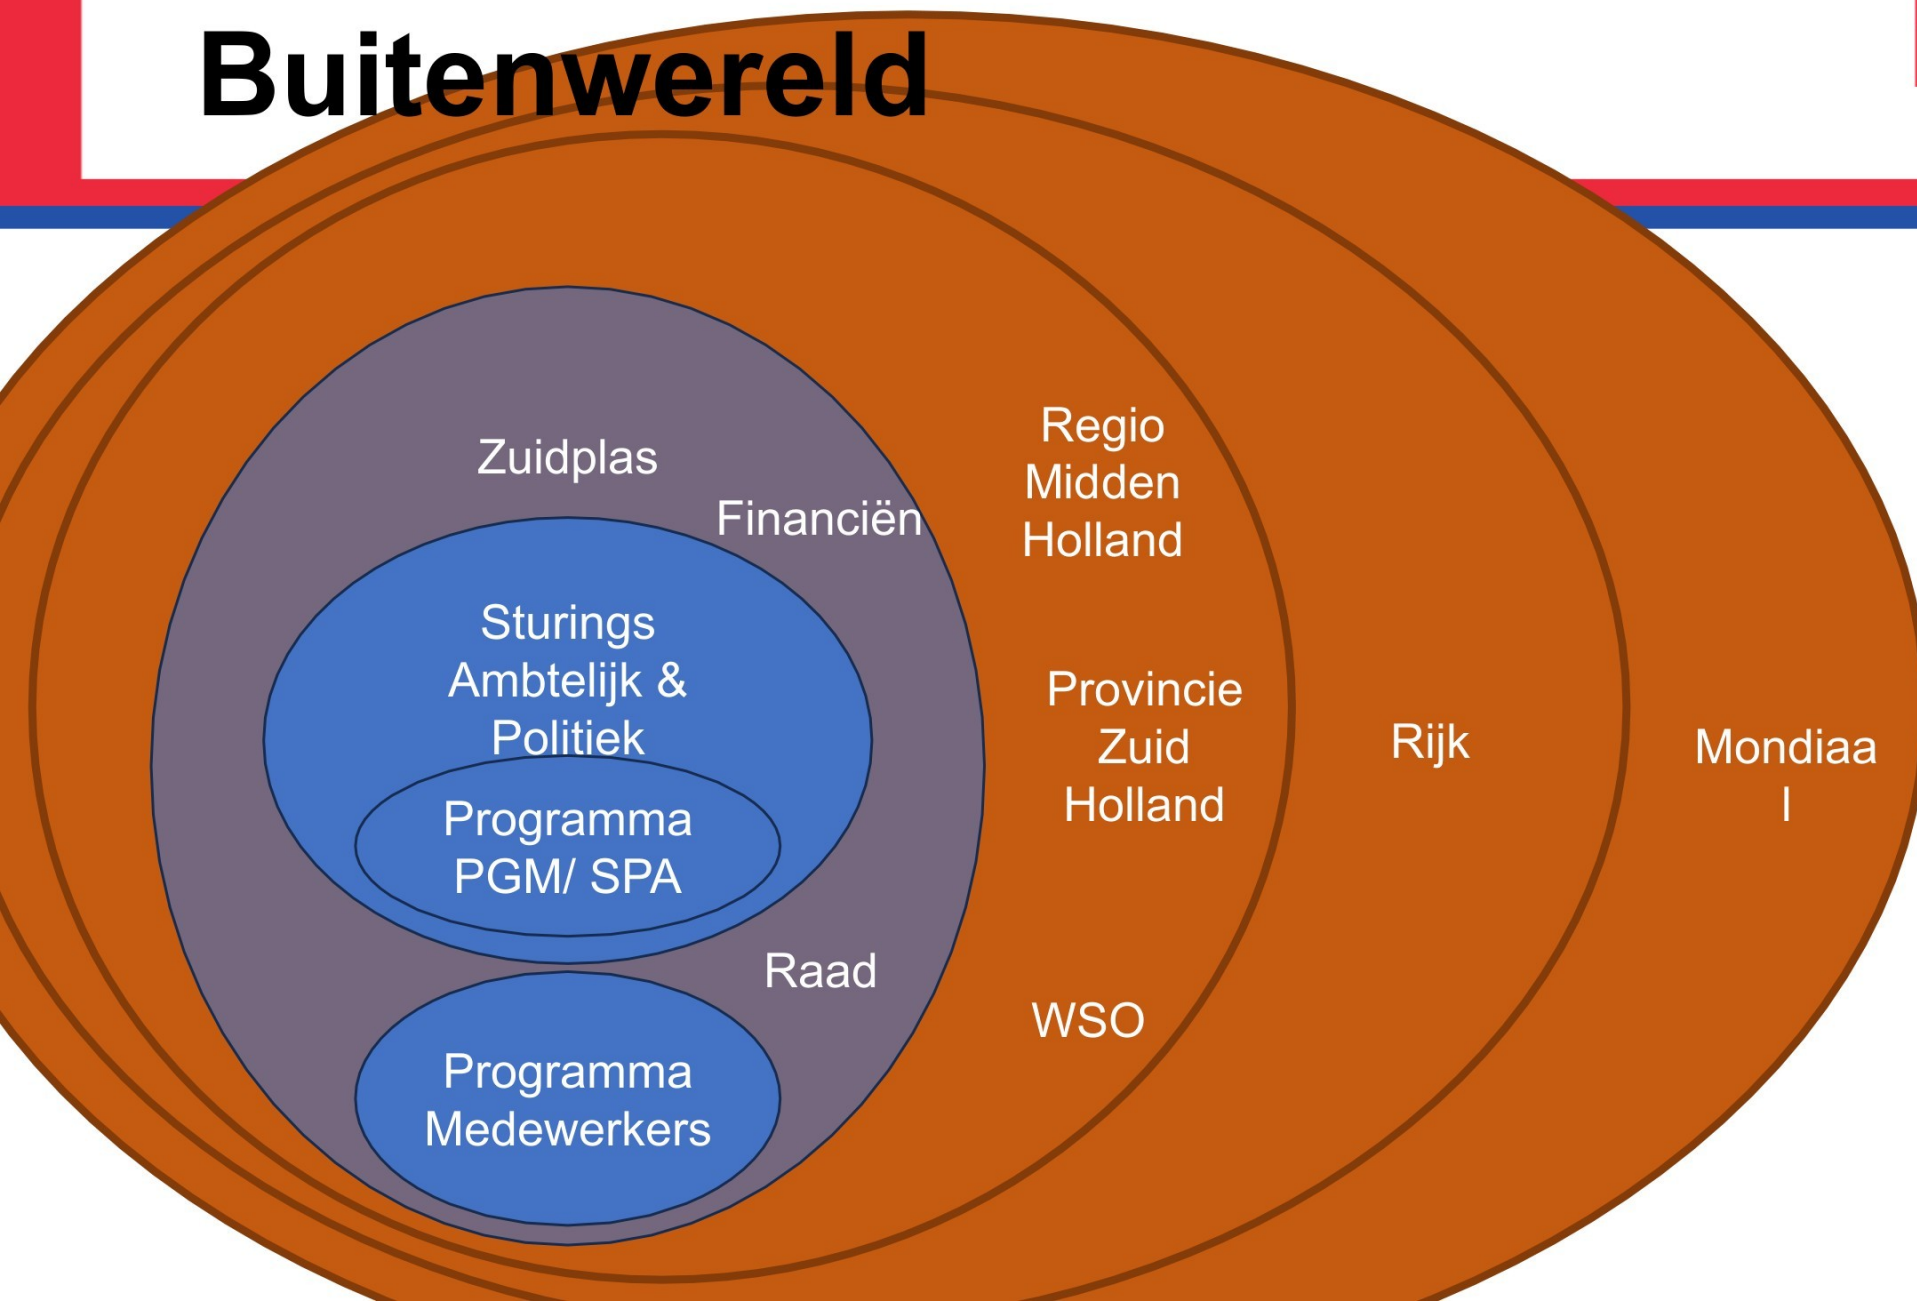Buitenwereld



Ontwikkelingen buiten programma



gemeente
Zuidplas

- Rijk
 - Nieuwe taken
 - Financiering loopt achter
 - Randvoorwaarden schuiven
 - Wetgeving natuur aangescherpt vanuit Europese wetgeving
 - Media
- Provincie
 - Sturen op eigen doelen
 - Voorwaarden voor subsidie WSO GO, Wind in RES (Brief gedeputeerde)
 - Omgevingsbeleid vernieuwd hierin is wind onderdeel
 - Herziening omgevingsverordening gaan de eisen t.a.v. biodiversiteit versterken
 - Energiesysteem

Knelpunten regionale samenwerking

Suboptimale inzet van middelen en capaciteit



- **Inefficiënte samenwerking** → Lokaal en regionaal sluiten doelen onvoldoende op elkaar aan, wat leidt tot trage besluitvorming en uitvoering. Onvoldoende oog lokale politieke oplossingsrichtingen en risico's. Dit leidt tot vertraging en frustratie in proces.
- **Onvoldoende bewaking rollen en belangen betrokken partijen.** Wens tot samenwerking zorgt voor onvoldoende oog voor verschillende lokale (politieke context en mogelijkheden).
- **Bestuurlijke en financiële onzekerheid** → Governance, mandaten en middelen zijn onvoldoende geborgd, zowel lokaal als regionaal.
- **Moeizame bijsturing** → Vertraagde besluitvorming, Zuidplas heeft onvoldoende grip op processen.
- Verminderde slagkracht van Zuidplas binnen regionale verbanden.

Risico's regionale samenwerkingen

- Budgetoverschrijdingen wanneer regionale samenwerkingen meer inspanningen vergen dan ze opleveren.
- Door gebrek efficiënte samenwerking en de beperkte kwaliteit in regio, risico dat de ambities en doelstellingen op de lange termijn in gevaar komen.
- Gebrekkig zicht op lokale politieke processen en belangen leidt tot reparatiewerk. Dit kost extra inzet en beïnvloed lokale en regionale positionering.
- Gezien de positionering van Zuidplas en de bestaande fricties binnen bepaalde dossiers, ervaren we een gebrek aan invloed op de bijsturing van samenwerkingen. Tegelijkertijd zijn we afhankelijk van regionale processen om onze doelen te realiseren.

Vraagstukken

- Vraag aan College: Wat is het bestaansrecht van de opgave Duurzaamheid?
 - Welke maatschappelijk baten zijn voor het college het belangrijkste? Welke zijn minder belangrijk?
 - Op welke wijze wil het college zich positioneren in de regionale samenwerkingen?

Maatschappelijke baten op lange termijn

- **Lagere energiekosten** op lange termijn: Door betere isolatie en duurzame warmteoplossingen worden woningen energiezuiniger en dalen de kosten voor huishoudens.
- **Gezondere leefomgeving**: Minder uitstoot van fijnstof en CO₂ leidt tot schonere lucht en minder gezondheidsproblemen.
- **Verhoogde woningwaarde**: Woningen met een goed energielabel en duurzame warmteoplossing in een klimaatbestendige omgeving zijn aantrekkelijker op de woningmarkt.
- **Minder afhankelijk van fossiele energie en geopolitieke risico's**: Minder afhankelijkheid van aardgas betekent minder kwetsbaarheid voor energiecrises en aantrekkelijker klimaat voor ondernemers en maatschappelijke instellingen
- **Lagere CO₂-uitstoot en minder klimaatverandering**: Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind verminderen de uitstoot van broeikasgassen.
- **Voedselzekerheid**: Meer biodiversiteit betekent gezonde bodems en natuurlijke bestuiving, wat cruciaal is voor duurzame landbouw.
- **Meer leefbare vitale bestaande dorpen**: Groen en water in de dorpen zorgen voor verkoeling, betere luchtkwaliteit en meer ruimte voor ontspanning.
- **Veiligere leefomgeving**: Dorpen worden weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering, wat de levenskwaliteit verhoogt.

Optie 1: Samenwerking verbeteren

- Zuidplas sterker positioneren in regionale samenwerking om politieke en financiële belangen beter te bewaken.
- Heldere bestuurlijke afspraken over gemeentelijke inzet in WSO en RES, inclusief mandaten en besluitvormingsprocessen.
- Welke financiële en politieke kaders stellen we voor de gemeentelijke bijdrage aan regionale samenwerkingen?
- Welke strategie hanteren we om Zuidplas invloedrijker te maken in regionale besluitvorming?
- Inzet om verbetering te bereiken afgelopen jaar niet succesvol
- Tot nu weegt de regionale samenwerking niet op tegen de baten.

Optie 2: Stoppen of heroverwegen samenwerking

- Voorkomen van financiële en juridische risico's vanuit de samenwerking
- Meer zelfstandige sturing op duurzaamheid binnen Zuidplas.
- Vermijden van afhankelijkheden, maar mogelijk vertraging in energietransitie.
- Huidige samenwerking en Financiering worden verminderd ingezet
- Welke politieke consequenties?

Risico bezuinigingen

Risico bezuinigingen

- Opbouw programma stagneert
- Doelen stagneren
- Van pro-actief weer terug naar reactief
- Medewerkers kunnen niet worden ondersteund, nog steeds te weinig kwaliteit
- Medewerkers gaan weg, te weinig betrouwbaarheid vanuit programma en ervaren geen bestaansrecht
- Vragen medewerkers over bestaansrecht van het programma en team: wil Zuidplas wel werken aan de opgave Duurzaamheid?

Maatschappelijke effecten lange termijn bij te weinig inzet en middelen

- **Hogere energiekosten:** Gebrek aan duurzame energie- en warmteoplossingen kan leiden tot hogere kosten voor inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties.
- **Aantrekkelijkheid voor bedrijven vermindert:**
 - Een gemeente die achterblijft in duurzaamheid, kan minder aantrekkelijk worden voor investeerders en ondernemers.
 - Te weinig duurzame warmte en energie voor ondernemers (GTB, elektrificeren vervoer).
- **Kwetsbare groepen worden harder geraakt en betalen de prijs** (hogere energiekosten) door beperkte toegang tot nieuwe, duurzame oplossingen zoals energiezuinige woningen.
- **Gebrek aan burgerbetrokkenheid:** en dalend vertrouwen in de gemeente, vooral bij jongere generaties.

Maatschappelijke effecten lange termijn bij te weinig inzet en middelen

- **Biodiversiteitsverlies:** Gebrek aan natuurbescherming en groene ruimten leidt tot een afname van dier- en plantensoorten.
- **Hogere kans op overstromingen en hittegolven:** Slecht waterbeheer en een gebrek aan vergroening maken gemeenten kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden.
- **Schade aan infrastructuur:** Wegen, gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen sneller slijten door extreme hitte, wateroverlast of stormen.
- **Kosten voor klimaatadaptatie stijgen:** Gebrek aan voorbereiding op klimaatverandering (zoals waterbeheer bij overstromingen) kan leiden tot hoge herstelkosten na

Vraagstukken

Centrale vraag aan het College:

- Wat is het bestaansrecht van de opgave Duurzaamheid?

Subvragen

- Welke maatschappelijk baten zijn voor het college het belangrijkste? Welke zijn minder belangrijk?
- Op welke wijze wil het college zich positioneren in de regionale samenwerkingen?

Van: " [redacted] J "
Verzonden: woensdag 22 oktober 2025 16:21
Aan: " [redacted] J @zuidplas.nl >
Onderwerp: brieven naar bewoners verkeerd geadresseerd
Importance: High

Document 28

Hoi [redacted] J,

Ik kom er achter dat de drukker de brieven die naar bewoners moesten voor 2 doelgroepen heeft omgedraaid.
Ik weet niet waar de fout ligt. [redacted] J zegt dat ze eea heel goed heeft besproken met de drukker dus ik ga ervan uit dat de fout bij de drukker ligt.

Dit betekent dat ongeveer 6000!! adressen in Zuidplas een brief hebben ontvangen waarop staat dat zij recht hebben op [redacted] G aan subsidie terwijl zij maar recht hebben op [redacted] G.

Dit gaat verwacht ik nogal wat problemen opleveren.

[redacted] J is nu aan het uitzoeken wat er aan de hand is en zal zorgen voor een rectificatiebrief naar de bewoners.

Mijn vraag is wat we hiermee nu politiek gaan doen. Zal ik Wybe op de hoogte brengen van wat er is gebeurd?
En hoe nu verder?

Pfff er heerst een vloek op dit project volgens mij.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
[redacted] J



M 06- [redacted] J
E [redacted] J @zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Document 29

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: maandag 30 juni 2025 08:06
Aan: "[REDACTED]@zuidplas.nl"; "[REDACTED]@zuidplas.nl">
Cc: "[REDACTED]@zuidplas.nl">
Onderwerp: communicatie afronding aanpak energiearmoed

Hoi [REDACTED],

Het project aanpak energiearmoede is volgens mij zo goed als mogelijk afgerond. Er zijn mooie successen behaald. Werd ook nog even benoemd in de raad.

Lijkt me goed dat we hiervoor ook de communicatie doen. Successen mogen we ook wat meer naar buiten communiceren. En vervolgens een link te leggen met de aanpak isolatie dat deze van het najaar komt.

Zouden jullie samen de communicatie kunnen oppakken?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]



T 0180-[REDACTED] M 06-[REDACTED]
E [REDACTED]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

[illegible]

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Onderwerp	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 6	Zaterdag	1																	
	Zondag	2																	
	Maandag	3																	
	Dinsdag	4	Voorkeur voor aquathermie in Cortelande	Nee	Ja	Ja	?	Nee	Nee	Ja	Wybe		 zijn aangehaakt)	Cortelande / aquatherm	Infomereren	Inwoners / on	Nvt	https://www.zuidplas.nl/voorkeur-voor-cortelande-gaat-uit-naar-aquathermie-warmte-en-koude-systeem-wordt-onderzocht	
	Woensdag	5																	
Week 7	Donderdag	6																	
	Vrijdag	7																	
	Zaterdag	8																	
	Zondag	9																	
	Maandag	10																	
Week 8	Dinsdag	11																	
	Woensdag	12																	
	Donderdag	13																	
	Vrijdag	14																	
	Zaterdag	15																	
Week 9	Zondag	16																	
	Maandag	17	Dag van de reparatie																
	Dinsdag	18																	
	Woensdag	19	Herziene aanpak Zuidplas aardgasvrij - update	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Wybe			Zuidplas aardgasvrij	Informeren / update	Inwoners / on	Nvt	https://www.duurzaamheid.nl	17-01-2025
	Donderdag	20																	
Week 9	Vrijdag	21																	
	Zaterdag	22																	
	Zondag	23																	
	Maandag	24																	
	Dinsdag	25																	
	Woensdag	26																	
	Donderdag	27																	
	Vrijdag	28	Kaart Duurzaamheidsprojecten Zuidplas Monitoring Communicatieplan Infonota Hynetwork	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Wybe			Duurzaamheid	Infomereren / Betrekken collega's	Collega's	Nvt	Nvt	Datum nog bepalen

Communicatie en Participatiekalender 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 10	Zaterdag	1	Hele maand - Maand van de Groene Tuin																
	Zondag	2																	
	Maandag	3	Nationale week zonder vlees en zuivel																
	Dinsdag	4																	
	Woensdag	5																	
	Donderdag	6																	
	Vrijdag	7																	
Week 11	Zaterdag	8																	
	Zondag	9																	
	Maandag	10																	
	Dinsdag	11	Programma Zon op Veld - resultaat eerste segment	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee? Nog bep	Wybe			Energietransitie (PZoV)	Informereren / updat	Inwoners / ondern	Nvt	Volgt	Datum nog bepalen
	Woensdag	12																	
	Donderdag	13																	
	Vrijdag	14																	
Week 12	Zaterdag	15																	
	Zondag	16																	
	Maandag	17	Week van de circulaire economie																
	Dinsdag	18	Week van de circulaire economie																
	Woensdag	19	Week van de circulaire economie																
	Donderdag	20	Week van de circulaire economie																
	Vrijdag	21	Week van de circulaire economie																
Week 13	Zaterdag	22	Week van de circulaire economie + Landelijke opschoondag + Earth Hour																
	Zondag	23																	
	Maandag	24																	
	Dinsdag	25																	
	Woensdag	26																	
	Donderdag	27	Nieuwsbrief Duurzaamheid + Monitoringscommunicatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Wybe	Team DZH		Programmabreed	Informereren / updat	Inwoners / ondern	Nvt	Nvt	Datum nog bepalen
	Vrijdag	28																	
Week 14	Zaterdag	29																	
	Zondag	30																	
	Maandag	31																	
			Logboeken Intern NvU 100 MW EOS grootschalige batterij Info nota Elektrolyse Biodiversiteit presentatie van resultaten nulmeting voor organisatie Biodiversiteit delen resulataten bioblitz op social media																

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatie datum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbri ef	Gemeenterubrie k	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanlevere n content
Week 15	Dinsdag	1																	
	Woensdag	2																	
	Donderdag	3																	
	Vrijdag	4	Waterstof Netwerk West-Nederland (via geb	NTB															
	Zaterdag	5																	
	Zondag	6																	
	Maandag	7																	
Week 16	Dinsdag	8	Nationale buitenlesdag																
	Woensdag	9																	
	Donderdag	10																	
	Vrijdag	11																	
	Zaterdag	12																	
	Zondag	13																	
	Maandag	14																	
Week 17	Dinsdag	15																	
	Woensdag	16																	
	Donderdag	17																	
	Vrijdag	18																	
	Zaterdag	19																	
	Zondag	20																	
	Maandag	21																	
Week 18	Dinsdag	22	Earth Day + Nationale Zaaiday																
	Woensdag	23																	
	Donderdag	24																	
	Vrijdag	25																	
	Zaterdag	26																	
	Zondag	27																	
	Maandag	28																	
	Dinsdag	29																	
	Woensdag	30																	
			Stakeholdersvisie - Intern Natuur Inclusief - interne sesies workshop over borging beleidregels natuurinclusief bouwen																

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 19	Donderdag	1	Maai mei niet?!																
	Vrijdag	2																	
	Zaterdag	3																	
	Zondag	4																	
	Maandag	5																	
	Dinsdag	6																	
	Woensdag	7																	
Week 20	Donderdag	8																	
	Vrijdag	9																	
	Zaterdag	10																	
	Zondag	11																	
	Maandag	12																	
	Dinsdag	13																	
	Woensdag	14																	
Week 21	Donderdag	15																	
	Vrijdag	16																	
	Zaterdag	17																	
	Zondag	18																	
	Maandag	19																	
	Dinsdag	20																	
	Woensdag	21																	
Week 22	Donderdag	22	Internationale dag voor Biodiversiteit																
	Vrijdag	23																	
	Zaterdag	24																	
	Zondag	25																	
	Maandag	26																	
	Dinsdag	27																	
	Woensdag	28																	
Week 22	Donderdag	29																	
	Vrijdag	30																	
	Zaterdag	31																	

Hernieuwde aanpak AGV
WSO/warmtenet Glastuinbouw NP-ZPP initiatief Communicatieparticipatie door Netverder Q2/Q3 2025
Klimaatadaptatie Interne stressresultaten Q2
Klimaatadaptatie Participatie over het beleid zal Q2 zijn dan

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig ? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 23	Zondag	1																	
	Maandag	2	Heat action day (wereld)																
	Dinsdag	3	Wereld milieudag																
	Woensdag	4																	
	Donderdag	5																	
	Vrijdag	6																	
	Zaterdag	7																	
Week 24	Zondag	8																	
	Maandag	9																	
	Dinsdag	10																	
	Woensdag	11																	
	Donderdag	12																	
	Vrijdag	13																	
	Zaterdag	14																	
Week 25	Zondag	15																	
	Maandag	16																	
	Dinsdag	17																	
	Woensdag	18																	
	Donderdag	19																	
	Vrijdag	20																	
	Zaterdag	21																	
Week 26	Zondag	22																	
	Maandag	23																	
	Dinsdag	24																	
	Woensdag	25																	
	Donderdag	26	Versturen nieuwsbrief Q2 ?																
	Vrijdag	27																	
	Zaterdag	28																	
	Zondag	29																	
	Maandag	30																	

Q2 Handelingsperspectief Zuidplas aardgasvrij - Extern
Versie 1 - Rapportage inspanningen en doelen strategie programma duurzaamheid
Klimaatadaptatie: Klimaatbestendig schoolplein communicatie (hoe, nog geen idee wanneer?)
Wind-Project-lijst PZ-H eind juni
Nieuwe samenwerking overeenkomst 'WSO breed'
Gezamenlijke communicatie vanuit WSO partijen (juni/sept 2025)
Foto WSO - WH (?) en directies tekenen symbolisch

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Sociale	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 27	Dinsdag	1																	
	Woensdag	2																	
	Donderdag	3																	
	Vrijdag	4																	
	Zaterdag	5																	
Week 28	Zondag	6																	
	Maandag	7																	
	Dinsdag	8																	
	Woensdag	9																	
	Donderdag	10																	
Week 29	Vrijdag	11																	
	Zaterdag	12																	
	Zondag	13																	
	Maandag	14																	
	Dinsdag	15																	
Week 30	Woensdag	16																	
	Donderdag	17																	
	Vrijdag	18																	
	Zaterdag	19																	
	Zondag	20																	
Week 31	Maandag	21																	
	Dinsdag	22																	
	Woensdag	23																	
	Donderdag	24																	
	Vrijdag	25																	
Week 32	Zaterdag	26																	
	Zondag	27																	
	Maandag	28																	
	Dinsdag	29																	
	Woensdag	30																	
Week 33	Donderdag	31																	
RES Voortgangsdokument - juni juli																			
Natuurinclusief Q3 - doelsoorten communicatie extern																			

[illegible]

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatie datum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten ?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 36	Maandag	1																	
	Dinsdag	2	Duurzame Dinsdag																
	Woensdag	3																	
	Donderdag	4																	
	Vrijdag	5																	
	Zaterdag	6																	
	Zondag	7																	
Week 37	Maandag	8	Verspillingsvrije week																
	Dinsdag	9																	
	Woensdag	10																	
	Donderdag	11																	
	Vrijdag	12																	
	Zaterdag	13																	
	Zondag	14																	
Week 38	Maandag	15																	
	Dinsdag	16																	
	Woensdag	17																	
	Donderdag	18																	
	Vrijdag	19																	
	Zaterdag	20	World Cleanup day																
	Zondag	21																	
Week 39	Maandag	22																	
	Dinsdag	23																	
	Woensdag	24																	
	Donderdag	25																	
	Vrijdag	26	Bodemdierendagen																
	Zaterdag	27	Bodemdierendagen																
	Zondag	28	Bodemdierendagen																
	Maandag	29	Versturen nieuwsbrief Duurzaamheid																
	Dinsdag	30	Bodemdierendagen																
Monitoring oplevering dashboard klimaatadaptatie en biodiversiteit eind Q3																			
Nationale Tuin en Klimaatroute (Datum nog niet bekend)																			
Nationale Egeltelling (Datum nmb)																			

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 40	Woensdag	1	Bodemdierendagen + Vergeten plantseizoen / Plant je mee?																
	Donderdag	2	Bodemdierendagen																
	Vrijdag	3	Bodemdierendagen																
	Zaterdag	4	Bodemdierendagen - Eet geen dierendag																
	Zondag	5	Bodemdierendagen																
Week 41	Maandag	6	Bodemdierendagen																
	Dinsdag	7	Bodemdierendagen + Nationale Energieweek																
	Woensdag	8	Bodemdierendagen + Nationale Energieweek																
	Donderdag	9	Nationale energieweek																
	Vrijdag	10	Dag van de Duurzaamheid																
Week 42	Zaterdag	11	Nationale Wecycle week																
	Zondag	12																	
	Maandag	13																	
	Dinsdag	14																	
	Woensdag	15																	
Week 43	Donderdag	16																	
	Vrijdag	17																	
	Zaterdag	18																	
	Zondag	19																	
	Maandag	20																	
Week 44	Dinsdag	21																	
	Woensdag	22																	
	Donderdag	23																	
	Vrijdag	24																	
	Zaterdag	25																	
Week 45	Zondag	26																	
	Maandag	27																	
	Dinsdag	28																	
	Woensdag	29																	
	Donderdag	30																	
	Vrijdag	31																	
Biodiversiteit Q3/Q4 oplevering kansenkaart en uitvoeringsagenda biodiversiteit VAWOZ Regioadvies PZH eind 2025/Q4 Nationaal Bloembollenweekend (Datum nmb)																			

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbrief	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanleveren content
Week 45	Zaterdag	1	Duurzame Huizenroute 2025																
	Zondag	2																	
	Maandag	3																	
	Dinsdag	4																	
	Woensdag	5																	
	Donderdag	6																	
	Vrijdag	7																	
Week 46	Zaterdag	8	Duurzame Huizenroute 2025																
	Zondag	9																	
	Maandag	10																	
	Dinsdag	11																	
	Woensdag	12																	
	Donderdag	13																	
	Vrijdag	14																	
Week 47	Zaterdag	15																	
	Zondag	16																	
	Maandag	17																	
	Dinsdag	18	Nieuwsbrief Duurzaamheid + Monitoringscommunicatie																
	Woensdag	19																	
	Donderdag	20																	
	Vrijdag	21																	
Week 48	Zaterdag	22																	
	Zondag	23																	
	Maandag	24																	
	Dinsdag	25																	
	Woensdag	26																	
	Donderdag	27																	
	Vrijdag	28																	
	Zaterdag	29																	
	Zondag	30																	

WSO/warmtenet GTB NP-ZPP initiatief besluit investering Communicatie door Netverder november 2025 Foto leidingen in GTB/glastuinbouw
Nationale Klimaatweek (Datum Nnb)

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIEKALENDER 2025																			
Weeknr	Dag	Publicatiedatum	Inhaakkalender	Socials	Intern	Extern	Nieuwsbri ef	Gemeenterubriek	Bijeenkomst	Persbericht	Portefeuille / wethouder	Contactpersoon inhoud	Betrokken communicatieadviseur	Onderwerp / activiteit	Doel van het bericht	Doelgroep (voor wie is dit interessant)	KCC inlichten?	Nieuwsbericht aanwezig? Link toevoegen?	Deadline aanlevere n content
Week 49	Maandag	1																	
	Dinsdag	2																	
	Woensdag	3																	
	Donderdag	4																	
	Vrijdag	5																	
	Zaterdag	6																	
	Zondag	7																	
Week 50	Maandag	8																	
	Dinsdag	9																	
	Woensdag	10																	
	Donderdag	11																	
	Vrijdag	12																	
	Zaterdag	13																	
	Zondag	14																	
Week 51	Maandag	15																	
	Dinsdag	16																	
	Woensdag	17																	
	Donderdag	18																	
	Vrijdag	19																	
	Zaterdag	20																	
	Zondag	21																	
Week 52	Maandag	22																	
	Dinsdag	23																	
	Woensdag	24																	
	Donderdag	25																	
	Vrijdag	26																	
	Zaterdag	27																	
	Zondag	28																	
	Maandag	29																	
	Dinsdag	30																	
	Woensdag	31																	

Klimaatadaptatie Q3/Q4 risicodialogen (moeten we nu nog uitwerken)
Def rapportage inspanningendoelen strategie programma duurzaamheid 2025 - 2026

Fotografie:

foto's van isolatie, CV ketels, kookplaten

Foto's keuze van de geselecteerde doelsoorten Klimaatadaptief bouwen
