ABBINK Boekelo wegenbouw
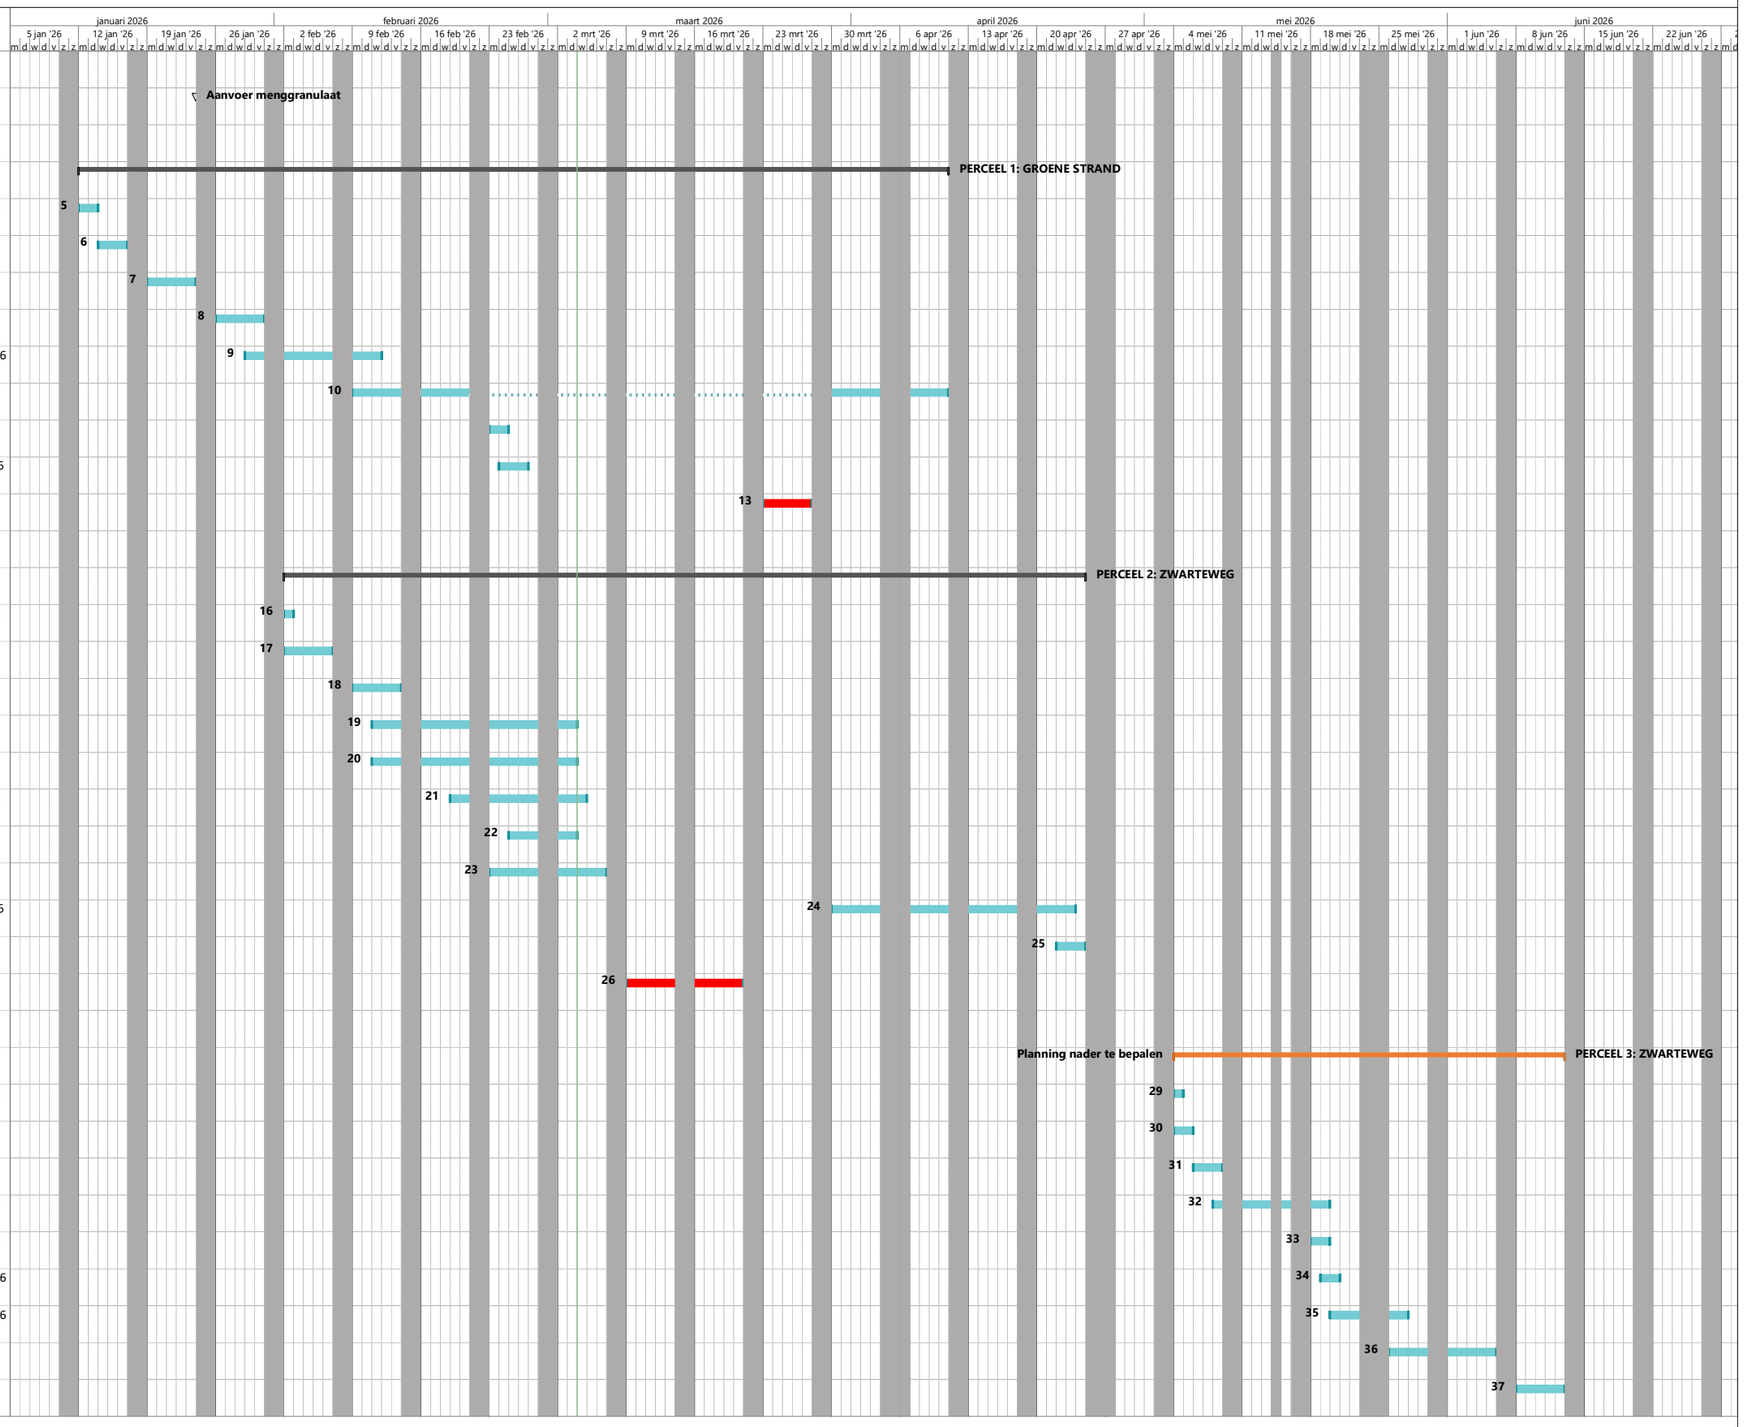
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1				
2	Aanvoer menggranulaat	1 dag	vri 23-1-26	vri 23-1-26
3				
4	**PERCEEL 1: GROENE STRAND**	**64 dagen**	**maa 12-1-26**	**vri 10-4-26**
5	Inrichten werkterrein en plaatsen afzettingen	2 dagen	maa 12-1-26	din 13-1-26
6	Opruimwerkzaamheden	3 dagen	woe 14-1-26	vri 16-1-26
7	Grondwerkzaamheden	5 dagen	maa 19-1-26	vri 23-1-26
8	Aanbrengen HWA en DWA riool	5 dagen	maa 26-1-26	vri 30-1-26
9	Aanbrengen wegfundaties en voorbereiden straatwerk	10 dagen	don 29-1-26	woe 11-2-26
10	Straatwerkzaamheden	19 dagen	maa 9-2-26	vri 10-4-26
11	Aanbrengen doek + matten fietsparkeerplekken + afwerken	2 dagen	maa 23-2-26	din 24-2-26
12	Groenvoorzieningen en afwerken werkterrein (fietspad)	3 dagen	din 24-2-26	don 26-2-26
13	Werkzaamheden Liander	5 dagen	maa 23-3-26	vri 27-3-26
14				
15	**PERCEEL 2: ZWARTEWEG**	**59 dagen**	**maa 2-2-26**	**vri 24-4-26**
16	Inrichten werkterrein en plaatsen afzettingen	1 dag	maa 2-2-26	maa 2-2-26
17	Opruimwerkzaamheden	5 dagen	maa 2-2-26	vri 6-2-26
18	Grondwerkzaamheden	5 dagen	maa 9-2-26	vri 13-2-26
19	Verwijderen bestaand riool + huisaansluitingen	15 dagen	woe 11-2-26	din 3-3-26
20	Aanbrengen DWA en IT riool	15 dagen	woe 11-2-26	din 3-3-26
21	Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen	10 dagen	don 19-2-26	woe 4-3-26
22	Aanbrengen kolken	5 dagen	woe 25-2-26	din 3-3-26
23	Aanbrengen wegfundaties en voorbereiden straatwerk	10 dagen	maa 23-2-26	vri 6-3-26
24	Straatwerkzaamheden	18 dagen	maa 30-3-26	don 23-4-26
25	Groenvoorzieningen en afwerken werkterrein	3 dagen	woe 22-4-26	vri 24-4-26
26	Werkzaamheden Liander	10 dagen	maa 9-3-26	vri 20-3-26
27				
28	**PERCEEL 3: ZWARTEWEG**	**28 dagen**	**maa 4-5-26**	**vri 12-6-26**
29	Inrichten werkterrein en plaatsen afzettingen	1 dag	maa 4-5-26	maa 4-5-26
30	Opruimwerkzaamheden	2 dagen	maa 4-5-26	din 5-5-26
31	Grondwerkzaamheden	3 dagen	woe 6-5-26	vri 8-5-26
32	Aanbrengen GWA riool	7 dagen	vri 8-5-26	din 19-5-26
33	Aanbrengen kolkaansluitingen	2 dagen	maa 18-5-26	din 19-5-26
34	Aanbrengen kolken	2 dagen	din 19-5-26	woe 20-5-26
35	Aanbrengen wegfundaties en voorbereiden straatwerk	5 dagen	woe 20-5-26	woe 27-5-26
36	Straatwerkzaamheden	9 dagen	din 26-5-26	vri 5-6-26
37	Groenvoorzieningen en afwerken werkterrein	5 dagen	maa 8-6-26	vri 12-6-26
