K / 11-07-2024

kalenderschaal in werkweken exclusief feestdagen / onwerkbaar weer

Nieuwbouw Museum Lalique

nr	omschrijving
B	**Kelder achtergevel commanderij**
1	aanbrengen glasdak
2	aanbrengen brandmeldinstallatie / wandlamp **(door derden)**
C	**uitvoering kluis / uitgifte punt**
1	aanbrengen kawneer profiel en beglazing tussenbouw
2	aanbrengen vloerverwarming / electra
3	betonnen dekvloeren aanbrengen
4	afbouw installaties **(door derden)**
5	overige afbouw / interieurbouw **(door derden)**
6	aanbrengen ashford coating
7	aanbrengen gevelbekleding barcode
8	aanbrengen gipsplaten plafond uitgifte punt
9	aanbrengen cementdekvloer uitgiftepunt
10	aanbrengen lichtkoepel
11	afwerking platdak uitgifte punt
12	aftimmeren meterkast uitgiftepunt
13	stukadoorswerk uitgifte punt
14	aanleg tuininrichting **(de Tuynderie - derden)**
15	aanleg besproeingsinstallatie tuin **(de Tuynderie - derden)**
16	aftimmering vloerverwarming verdeler en plafondkoof tech. ruimte
17	ombouwen bezoekerstoegang voor bouw entreegebouw via Heerenstraat
D	**uitvoering entreegebouw / corridor**
1	ontmantelen keten
2	gebruik tuin door lalique
3	inrichten bouwplaats entreegebouw
4	maatvoering grondwerk / aanbrengen bouwplanken
5	uitvoeren grondwerk
6	aanbrengen buitenriolering / ondergrondse wateropslag tanks **(Te Kloeze - derden)**
7	aanbrengen vloer met vorstrand
8	aanbrengen staalconstructie en dakbeplating
9	aanbrengen HSB wanden / dakranden
10	timmerwerk rond daklicht / plafondkoven
11	aanbrengen dakbedekking
12	aanbrengen rond daklicht
13	aanbrengen buitenstukadoorswerk op HSB wand
14	aanbrengen kawneer profiel en beglazing
15	aanbrengen glas aansluiting belendingen
16	aanbrengen betonnen dekvloer
17	afdekken betonnen dekvloer
18	aanbrengen gipsplaten plafond
19	aanbrengen binnenwanden
20	wandtegelwerk toiletgroep
21	binnenstukadoorswerk
22	aanbrengen binnendeuren en schuifdeuren
23	aanbrengen ashford coating
24	aanbrengen installaties **(door derden)**
25	overige afbouw **(door derden)**

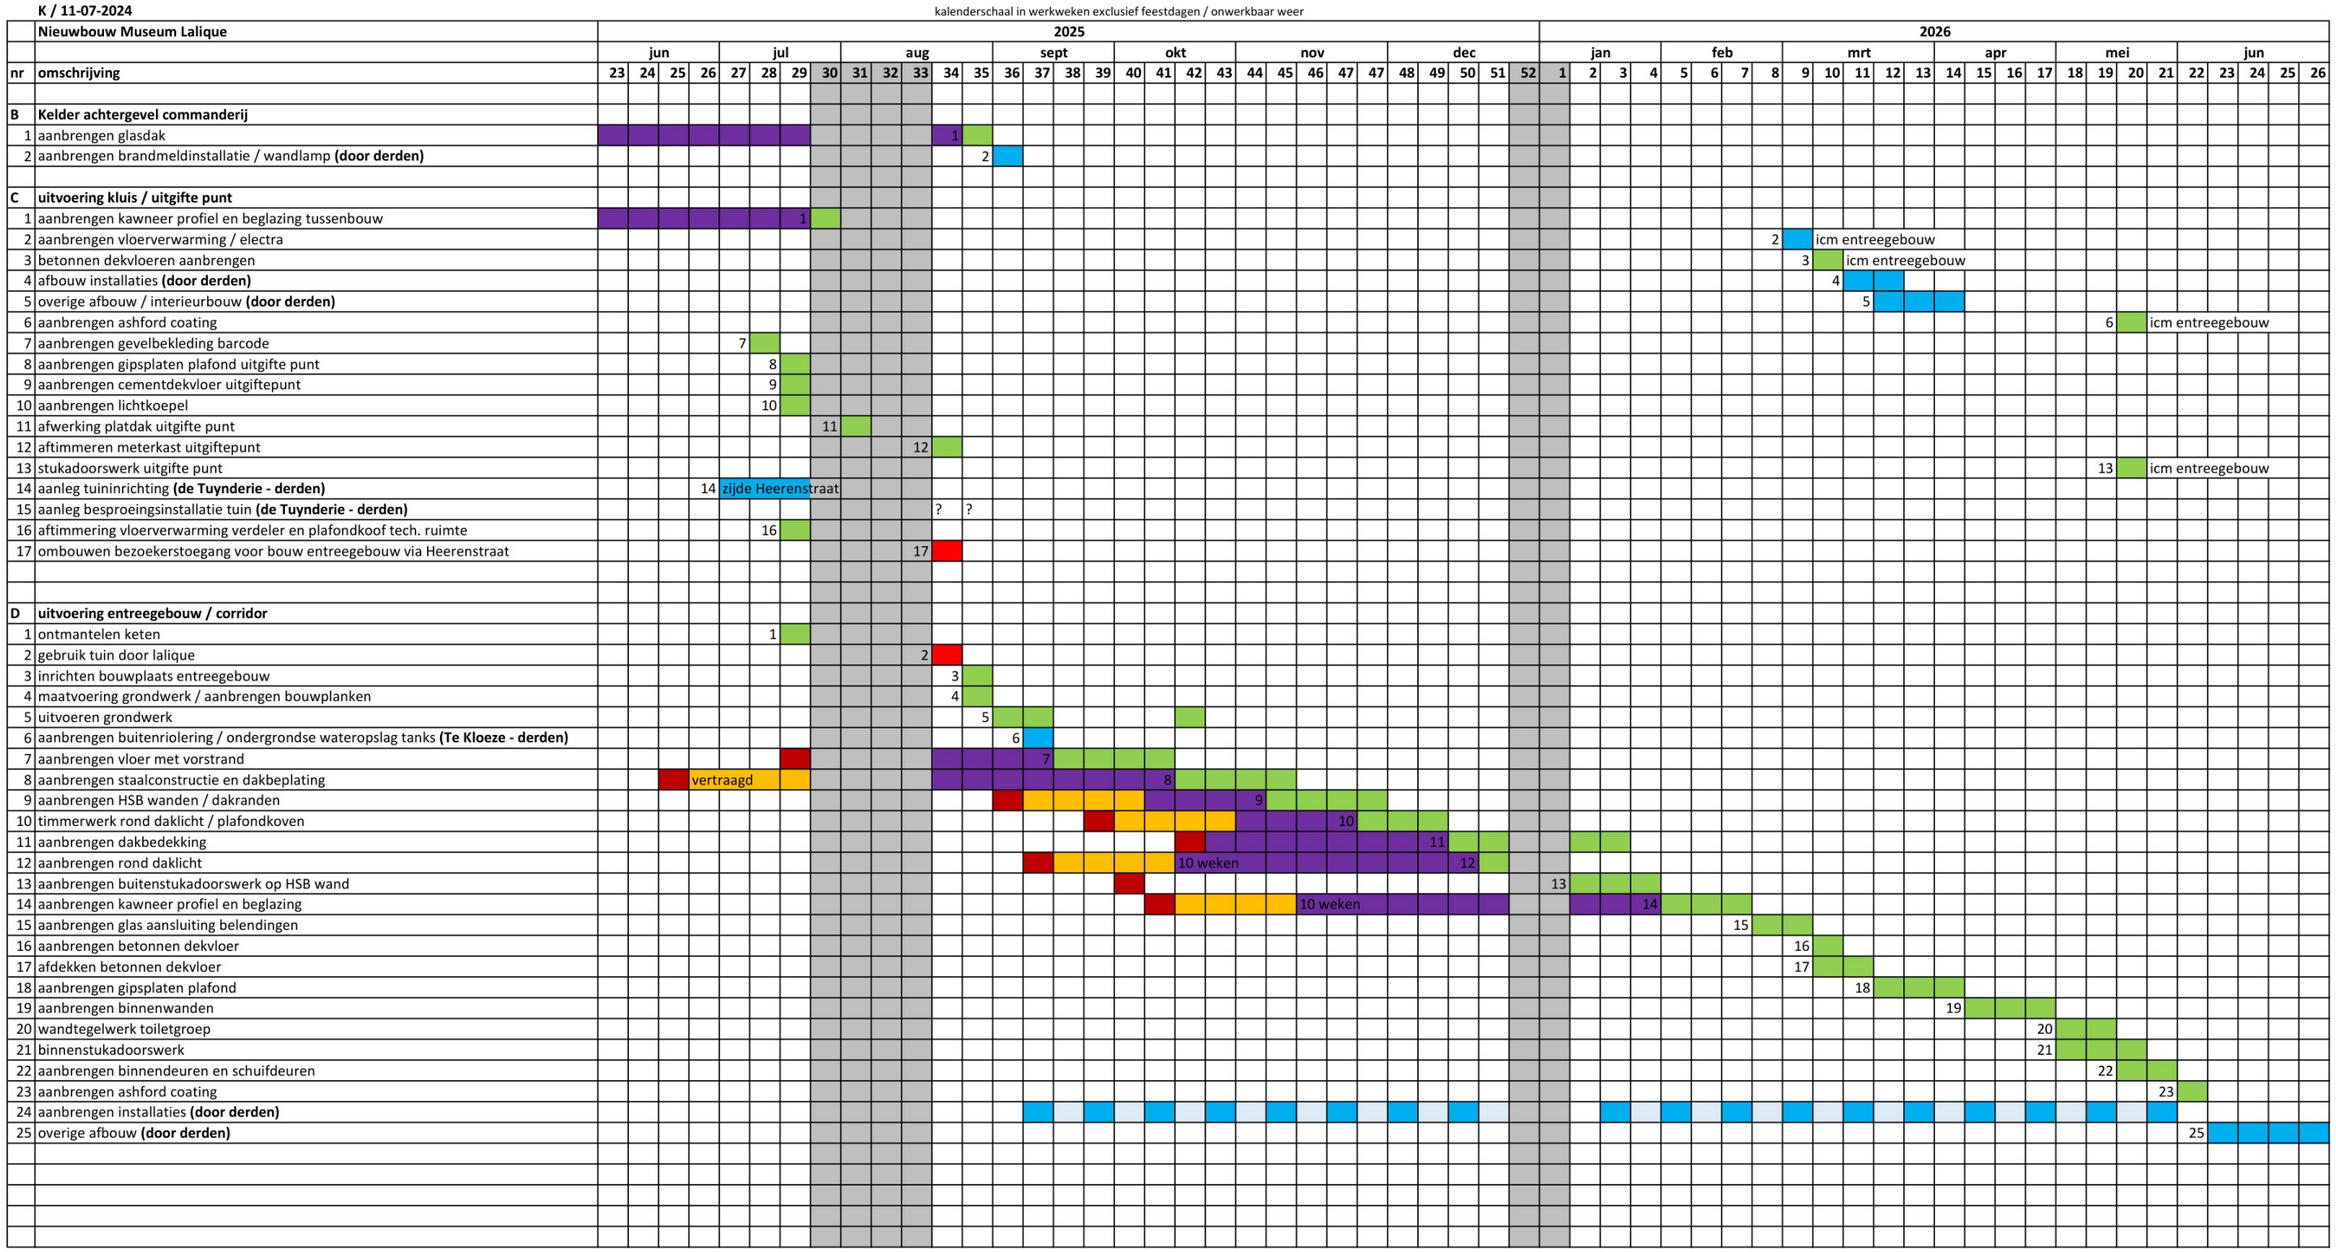

	uitvoering
	mijlpaal
	derden
	mobilisatie / levertijd / product.
	tekenwerk leverancier
	gegevens aanleveren / inkoop
	vakantie / vrije dagen
