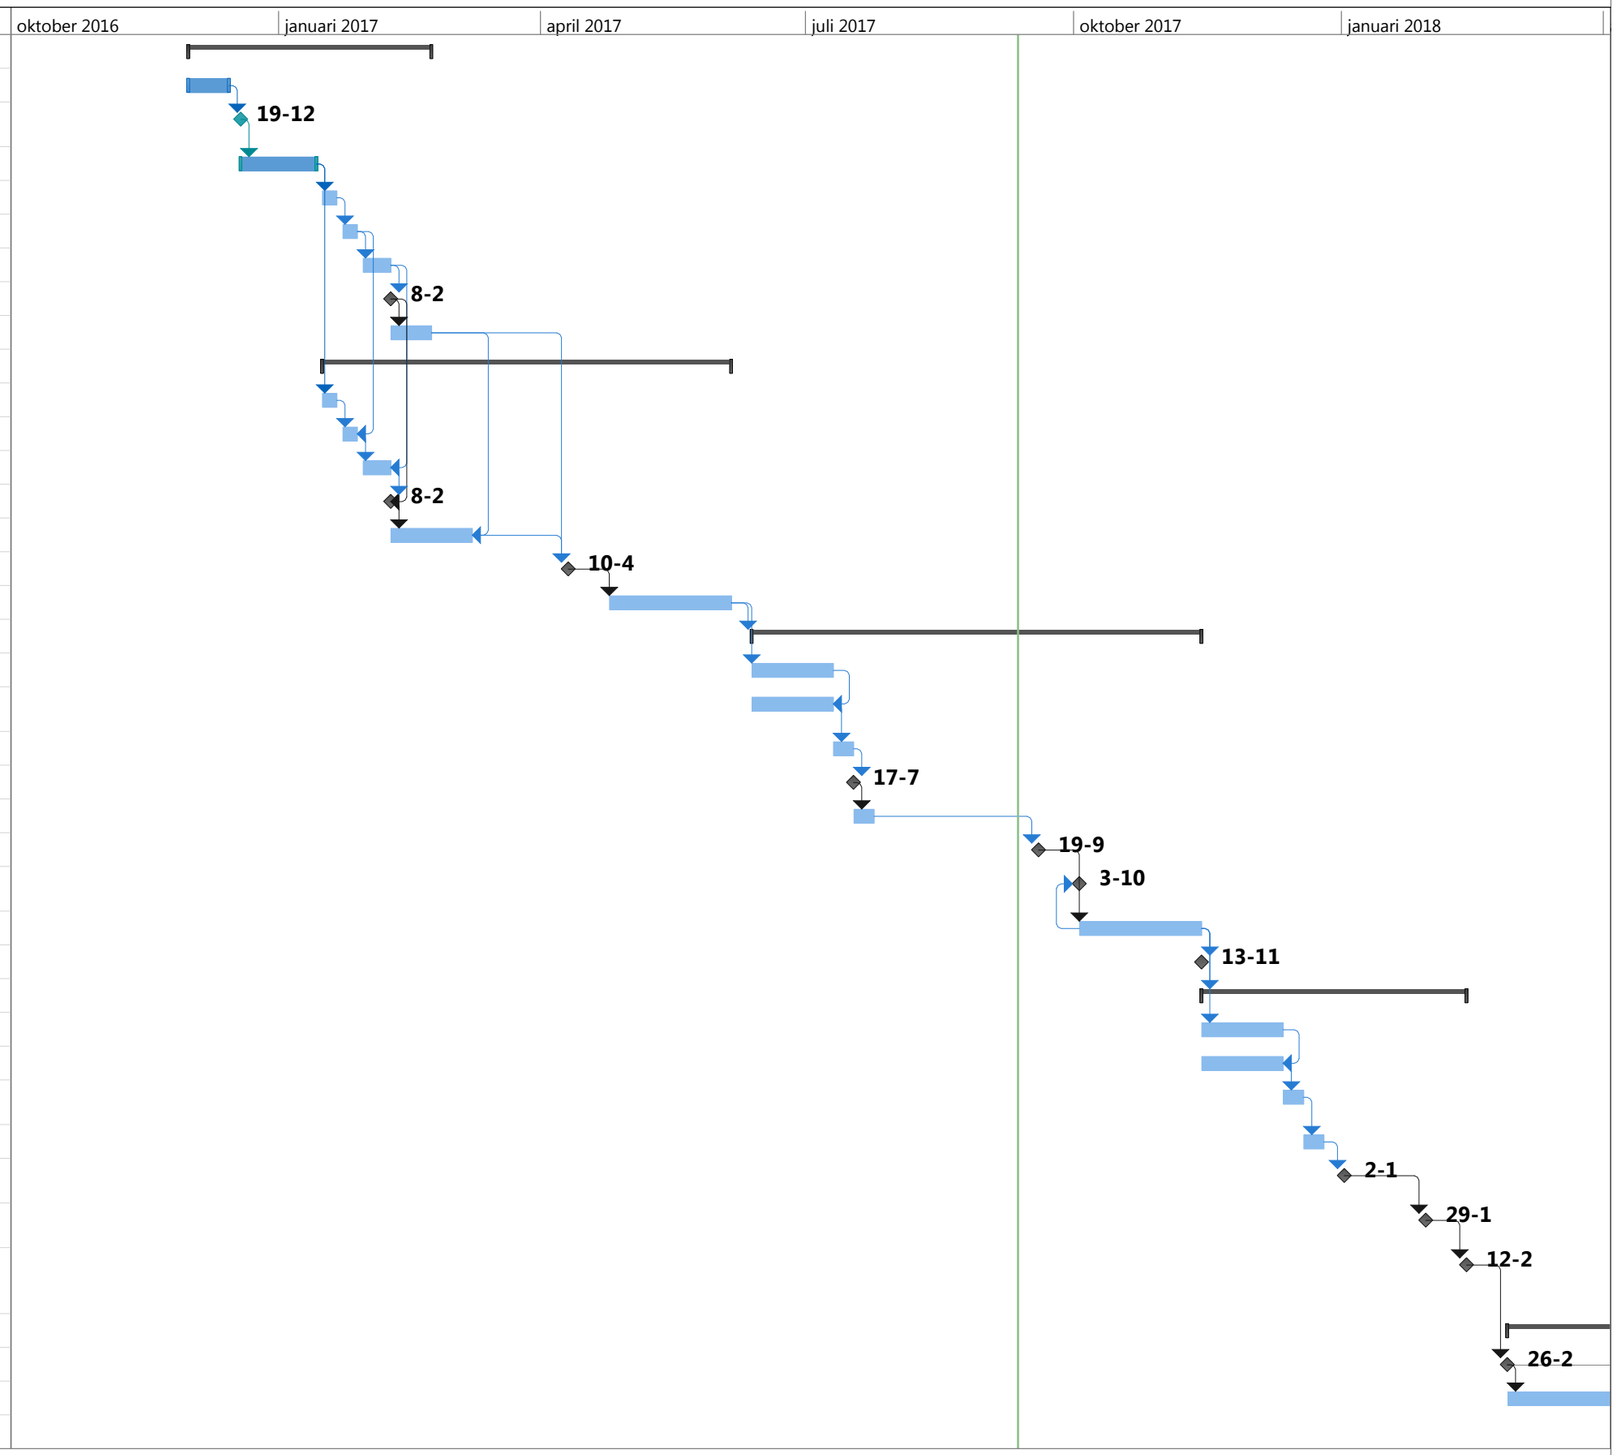Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Fase 2: Gebiedsonderzoeken en MER**	**59,5 dagen**	**don 1-12-16**	**woe 22-2-17**
2	Afronden verkeersonderzoek	10 dagen	don 1-12-16	woe 14-12-16
3	Brainstormsessie ladder duurzame verstedelijking	0 dagen	maa 19-12-16	maa 19-12-16
4	Bepalen definitieve programma	4 wkn	maa 19-12-16	vri 13-1-17
5	Afronden overige gebiedsonderzoeken	1 wk	maa 16-1-17	vri 20-1-17
6	Eindconcept MER	1 wk	maa 23-1-17	vri 27-1-17
7	Leestijd eindconcept MER	1,5 wkn	maa 30-1-17	woe 8-2-17
8	Overleg eindconcept MER en onderzoeken	0 dagen	woe 8-2-17	woe 8-2-17
9	Definitief MER en onderzoeken	2 wkn	woe 8-2-17	woe 22-2-17
10	**Fase 3: Voorontwerpbestemmingsplan**	**100,5 dagen**	**maa 16-1-17**	**maa 5-6-17**
11	Ladder duurzame verstedelijking	1 wk	maa 16-1-17	vri 20-1-17
12	Eindconcept VOBP	1 wk	maa 23-1-17	vri 27-1-17
13	Leestijd Eindconcept VOBP	1,5 wkn	maa 30-1-17	woe 8-2-17
14	Overleg Eindconcept VOBP	0 dagen	woe 8-2-17	woe 8-2-17
15	Definitief VOBP	4 wkn	woe 8-2-17	woe 8-3-17
16	College van B&W vrijgeven VOBP + MER	0 dagen	maa 10-4-17	maa 10-4-17
17	Vooroverleg + ter inzage legging VOBP	6 wkn	maa 24-4-17	maa 5-6-17
18	**Fase 4: Ontwerpbestemmingsplan**	**110,5 dagen**	**maa 12-6-17**	**maa 13-11-17**
19	Verwerken inspraak- & vooroverlegreacties	4 wkn	maa 12-6-17	maa 10-7-17
20	Van VOBP naar OBP, van concept MER naar MER	4 wkn	maa 12-6-17	maa 10-7-17
21	Leestijd concept OBP	1 wk	maa 10-7-17	maa 17-7-17
22	Overleg OBP + MER	0 dagen	maa 17-7-17	maa 17-7-17
23	Definitief OBP + MER	1 wk	maa 17-7-17	maa 24-7-17
24	College van B&W vrijgeven OBP + MER	0 dagen	din 19-9-17	din 19-9-17
25	Toezenden stukken CIE MER voor toetsingsadvies	0 dagen	din 3-10-17	din 3-10-17
26	Ter inzage OBP + MER	6 wkn	din 3-10-17	maa 13-11-17
27	Advies CIE MER	0 dagen	maa 13-11-17	maa 13-11-17
28	**Fase 5: Vaststellen bestemmingsplan**	**65 dagen**	**din 14-11-17**	**maa 12-2-18**
29	Verwerken zienswijzen	4 wkn	din 14-11-17	maa 11-12-17
30	Concept definitief bestemmingsplan	4 wkn	din 14-11-17	maa 11-12-17
31	Leestijd concept definitief bestemmingsplan	1 wk	din 12-12-17	maa 18-12-17
32	Definitief bestemmingsplan	1 wk	din 19-12-17	maa 25-12-17
33	Aanleveren definitieve stukken voor behandeling in B&W	0 dagen	din 2-1-18	din 2-1-18
34	Aanleveren definitieve stukken voor behandeling in Raad	0 dagen	maa 29-1-18	maa 29-1-18
35	Vaststellen definitief bestemmmingsplan gemeenteraad (ovb definitieve raadsagenda)	0 dagen	maa 12-2-18	maa 12-2-18
36	**Fase 6: Beroepsperiode BP**	**31 dagen**	**maa 26-2-18**	**din 10-4-18**
37	Publicatie raadsbesluit	0 dagen	maa 26-2-18	maa 26-2-18
38	Beroepsperiode	6 wkn	din 27-2-18	maa 9-4-18
39	BP in werking indien geen beroep	1 dag	din 10-4-18	din 10-4-18
